

REFERAT Mariagerfjord Vand A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 15-12-2025

Mødedato Mandag d. 15. december 2025 kl. 18:15

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

V 75 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer.....	3
V 76 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	4
Lukket.....	6
V 78 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund.....	6
V 79 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro.....	11
V 80 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager.....	17
V 81 - Sommerhuskloakering.....	19
V 82 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads.....	21
V 83 - Boringskontroller 2025.....	22
V 84 - Budgetopfølgning pr. 31.10 2025.....	24
V 85 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025.....	25
V 86 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025.....	28
Lukket.....	31
V 88 - Evaluering af den forgangne bestyrelsesperiode.....	31
V 89 - Eventuelt.....	32
V 90 - Næste møde.....	33
V 91 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	34
Lukket.....	36

Velkommen til sidste bestyrelsesmøde i 2025, som samtidig er sidste møde for de Byrådsudpegede medlemmer, hvor der starter en ny fireårig periode fra 1. januar 2026.

På den baggrund er der indsat et ekstra punkt sidst i dagsordenen, hvor det er muligt at evaluere periodens bestyrelsesarbejde.

De nye Byrådsudpegede medlemmer bliver først officielt valgt den 28. januar 2026. Hvis der sker noget i selskabet inden den 28. januar, der kræver bestyrelsens indkaldelse, vil nærværende bestyrelse blive indkaldt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Orienteringen taget til efterretning

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 12. november 2025.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda. Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i – godkendelsen af referatet sker på det sidste punkt på agendaen. På næstkommende møde vil det blive indført, at referatet fra nærværende møde er godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025 blev udsendt til godkendelse og underskrivning, herunder lukkede punkter i First Agenda. Inden den 25. november 2025 havde alle på nær et medlem underskrevet. Medlemmet der ikke underskrev, mener at de anførte bemærkninger under budgetopfølgning er for vage, i forhold til det bestyrelsen udtrykte på mødet.

Teksten i beslutningen var:

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen gennemgås**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Bilag:

[V67 bilag 1 - Resultat VAND 30-09-2025_NY_12-11-2025.pdf](#)

[V67 bilag 2 - Resultat SPV 30-09-2025_NY_12-11-2025.pdf](#)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 27. oktober 2025:

Bilag 1 og 2 blev udleveret ved start af punktet.

Punktet blev først taget efter pkt. 68.

Punktet tages op ved næste møde med regulerede mængder.

Det drøftes om der skal ændres i beslutningsformuleringen, hvorefter referatet godkendes endeligt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Bemærkningerne blev drøftet, og der opfordres fra bestyrelsen til at søge ekstra hjælp hvis tilsvarende situationer skulle opstå.

Herefter anses punktet som godkendt.

Hadsund


Fjordgade og Koldbæksgade - separatkloakering

Anlægsarbejdet er afsluttet. Der mangler økonomiafslutning og afleveringsforretning med entreprenøren.

Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkloakering

Projekt Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade er nu færdigprojekteret og er sendt i udbud. Licitationen holdes sidst i december 2025.

Arbejdet påtænkes udført i 2 etaper – skitseret med blå hhv. rød markering på skitsen nedenfor. Første etape er den blå etape, som omfatter de ejendomme, som også har været udfordret af kælderopstuvninger. Etape 1 forventes udført i 2026, etape 2 i 2027. Det er etape 1, der er sendt i udbud her i 2025. Etape 1 starter med ombygning af overløbsfunktionen fra hele oplandet, således eksisterende bassin på Stadionvej ombygges til overløbsbassin, med færre overløbshændelser til følge.

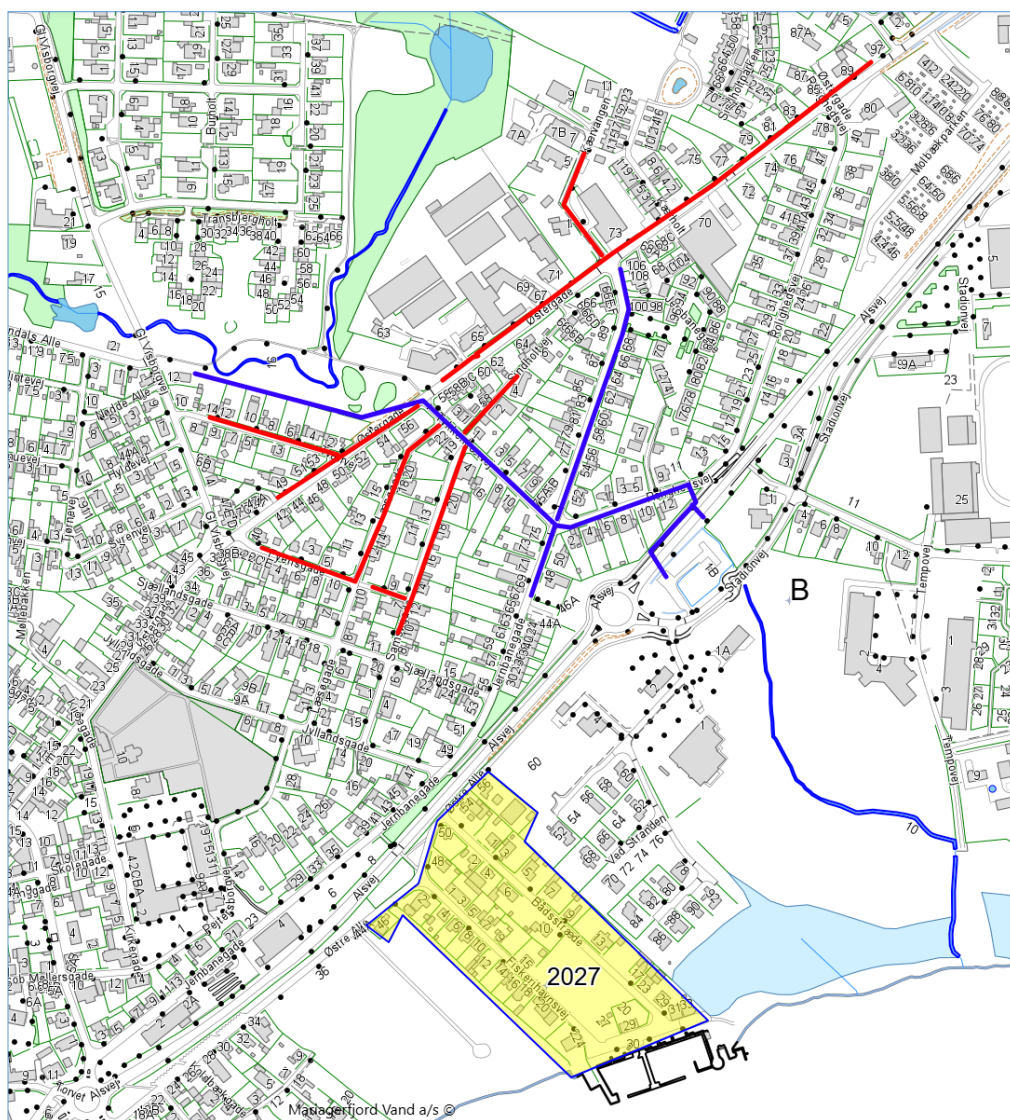


Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2027 forventes Fiskerihavnsvej og Bådsstræde separatkloakeret, begge fjordnære områder med nye regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. Området umiddelbart øst for, forventes klimasikret i samme forbindelse. I 2026 udarbejdes skitseprojekt, hvor der er fokus på minimering af gravedybden. Området er vist med gult ovenfor.

Pejtersborgvej


På tidligere møder er Bestyrelsen orienteret om et mindre projekt med etablering af nye hovedledninger over privat areal – etableret ved styret underboring. Lige nu er der

dialog med lodsejerne om aftaler om den nye ledningsplacering. Når det er på plads, kan boringerne udføres. Formentlig primo 2026.

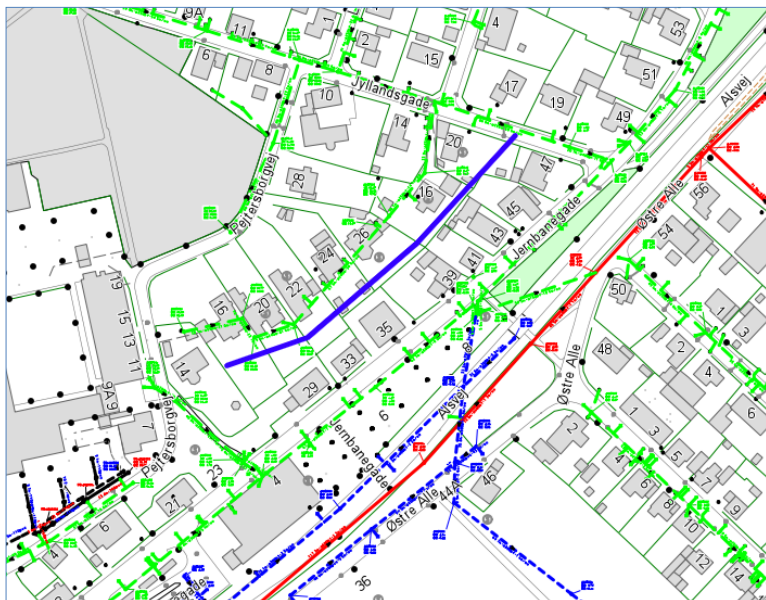

Regnvandspumpestation Havnegade

Vest for broen ved Havnegade i Hadsund etableres der en ny regnvandspumpestation – en pumpestation, som, mens området stadig er fælleskloakeret, skal hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen, som dimensioneres til at være den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring, forventes etableret 2026. Pumpestationen vil være af samme type, som er etableret ved havnen i Mariager.

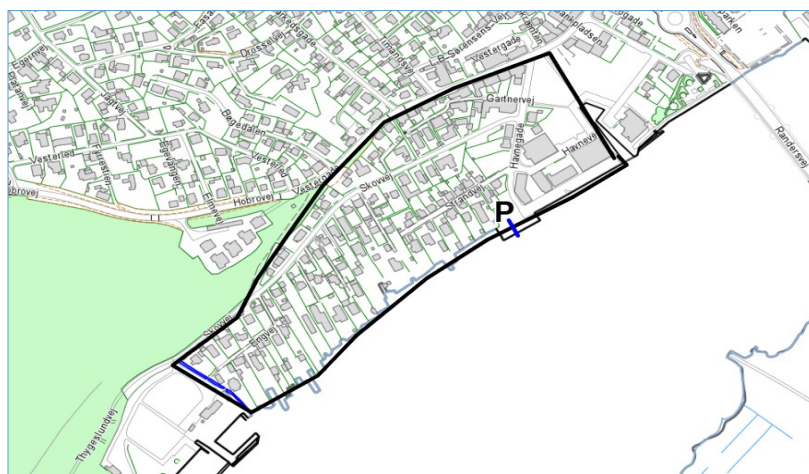


Trykledning Hadsund Syd

Den 25. november blev det konstateret at der ikke kom spildevand til nordsiden af fjorden ved Brolandingen, fra Hadsund Syd. Den 26. november blev der konstateret et brud på ledningen i fjorden, nogle få meter ude i vandet fra sydsiden. Bruddet blev repareret den 28. november, hvor det umiddelbart efter kunne konstateres at der var mindst et mere brud umiddelbart syd for sejlrenden. Herefter er der gået en større udredning i gang. Alle myndigheder har været involveret og orienteret siden bruddet blev registreret.

Aktuelt er der desværre konstateret mere end ét brud på den trykledning, der forbinder Hadsund Syd og Hadsund. Muligheden for at trække en ny ledning inden i den eksisterende har være undersøgt, men meget tyder på at der ligger en del sand og grus i den gamle ledning. Derfor arbejdes der på at få etableret en helt ny boring under fjorden så hurtigt som praktisk muligt.

Aktuelt er der opstillet en stor gyllecontainer til håndtering af spildevandet fra Hadsund Syd. Der foretages tømning et par gange i døgnet med gylletransporter, så der er styr på den almindelige driftssituation.

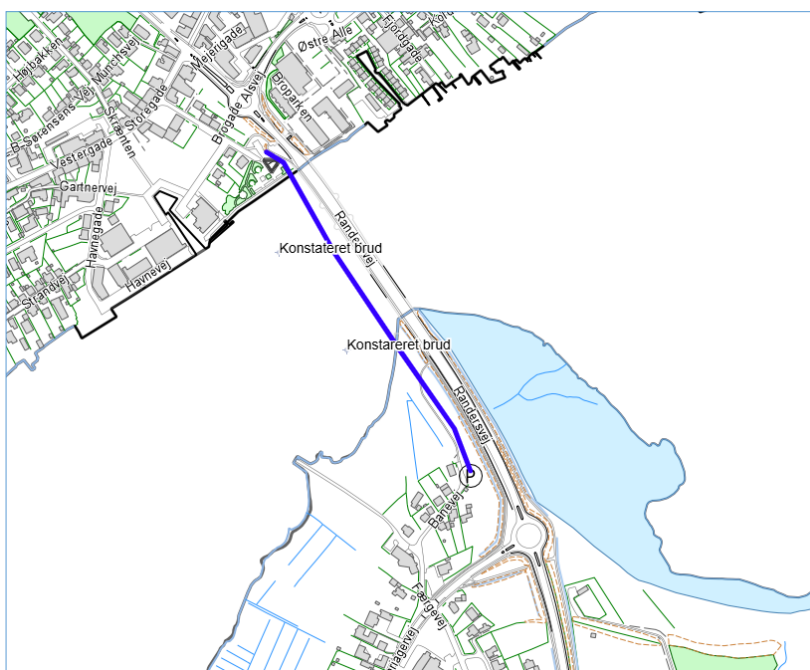

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**


Indstillingen godkendt

Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Hobro syd

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er afsluttet.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er også afsluttet.

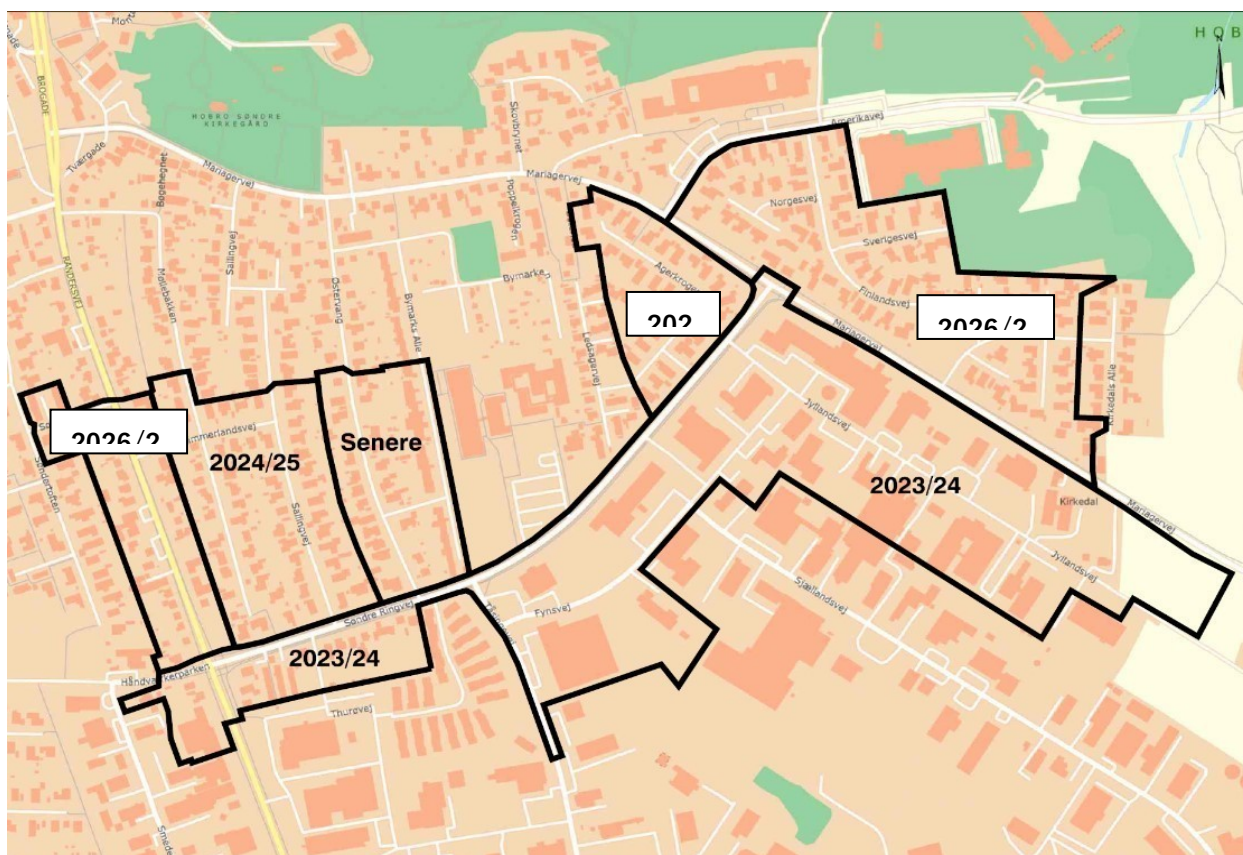

Fællesprojektet på Randersvej er nu faldet på plads, og arbejdet starter medio januar 2026. Det er Mortensen og Nymark, Aalborg, der er entreprenør. Der holdes informationsmøder i december for berørte borgere og erhvervsdrivende. Trafikken opretholdes i 2 spor, mens arbejdet gennemføres.


I Norgesvej, Finlandsvej og Kirkedals Allé m.fl. gennemføres separatkloakeringen over 2 år og starter forventet januar/februar 2026. Projektet vil starte med etablering af ny

regnvandsledning fra bassinet på Jyllandsvej til Kirkedals Allé. Projektet sendes i udbud i december. Vurdering af projektomfanget i især Amerikavej har rykket udsendelsen af udbudsmaterialet en smule, ligesom det har været nødvendigt at anvende nogle dyrere løsninger, for at få MFVs ledningsanlæg ud af private grundarealer.

Bassiner

Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Forventningen er, at der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd – bassiner, hvis placering og størrelse er afstemt med vandløbs-, spildevands, og naturmyndigheder hos MFK.

- Ombygning af eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra et tørt til vådt bassin
- Etablering af vådt bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej
- Etablering af vådt bassin i slugten øst for Kirkedals Allé, samt
- Etablering af tørt og vådt bassin ved Amerikavej, øst for Kirkedals bækken.

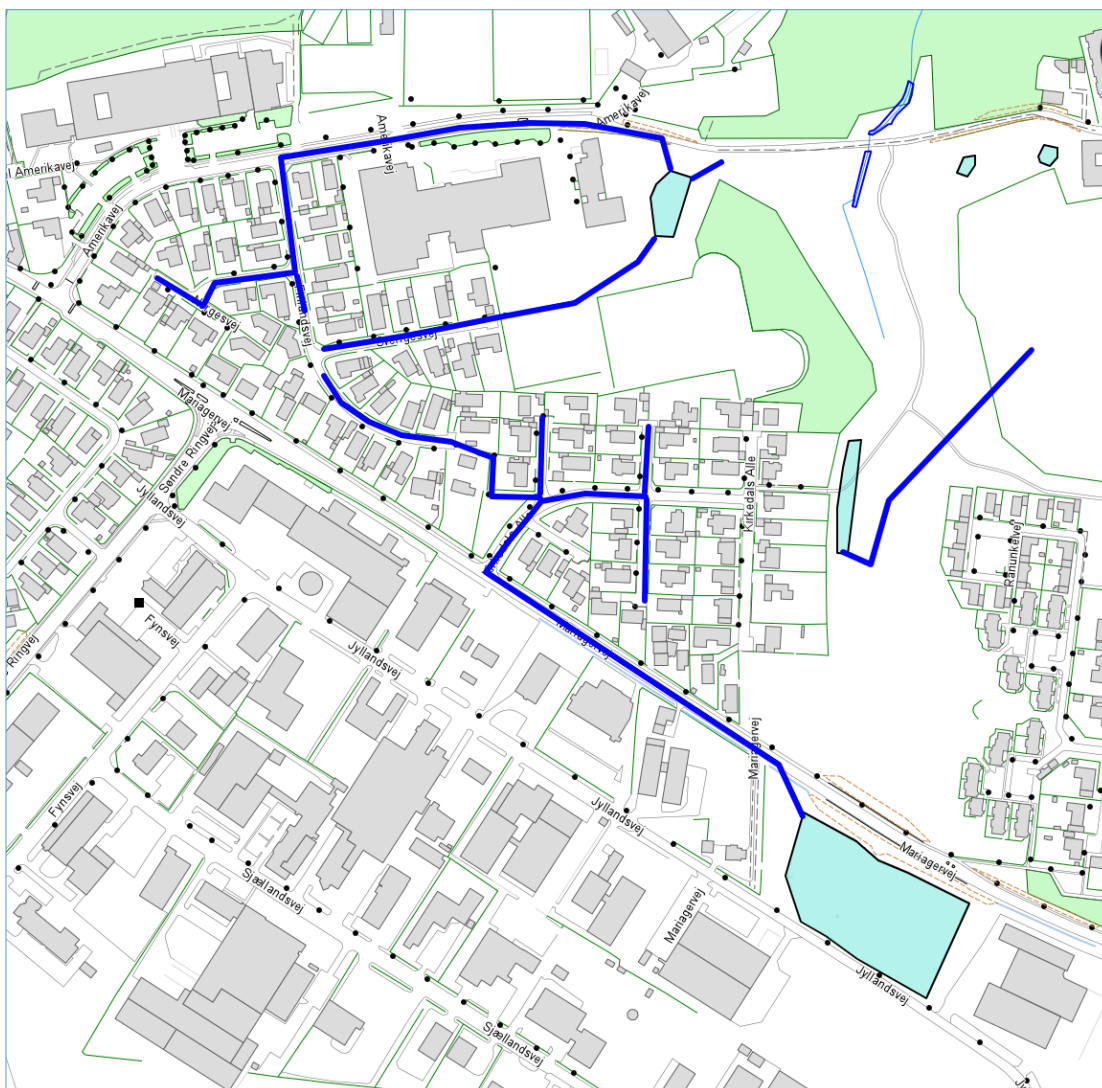

Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin er nu startet op. Entreprenørfirmaet HME var lavestbydende. Udførelsen afsluttes i marts 2026. Bassinerne i slugten, bag vandrehjemmet og ved Amerikavej forventes etableret i 2026.


Øvrige projekter i Hobro

Separering af Løgstørvej og Ølsvej er afsluttet.


På Gammelvej i Hobro gennemføres separering samt reovering af vandledninger. Arbejdet pågår og afsluttes primo 2026. For at opnå fuld separering fra de ejendomme, der i dag leder fællesvand til det separate spildevandssystem forventes gennemført en mindre projektudvidelse, vist med stiplede linje nedenfor.



På Hadsundvej sættes der nu gang i projekteringen af en større og dybere beliggende regnvandsledning for dels at skabe kapacitet i regnvandssystemet, samt at muliggøre afledning af regnvand fra flere store matrikler, hvor det ikke er muligt i dag – herunder at vende afledningen fra et delområde af Lupinvej til Hadsundvej. Ledningen er budgetteret til udførelse i 2026.

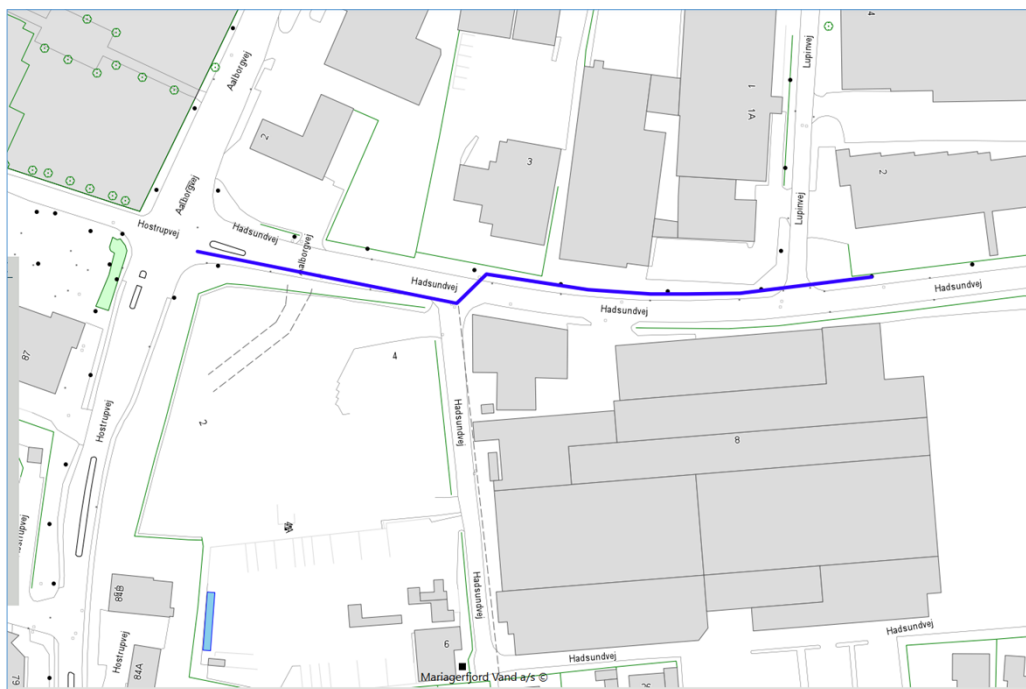

I 2026-2027 udføres arbejdet med separering af området ved og omkring Vestergade / V. Allé. Projektet er ud over separeringen også en forberedelse til fremtidig byudvikling i den sydlige og vestlige del af Hobro ved Fyrkat Eng sø.

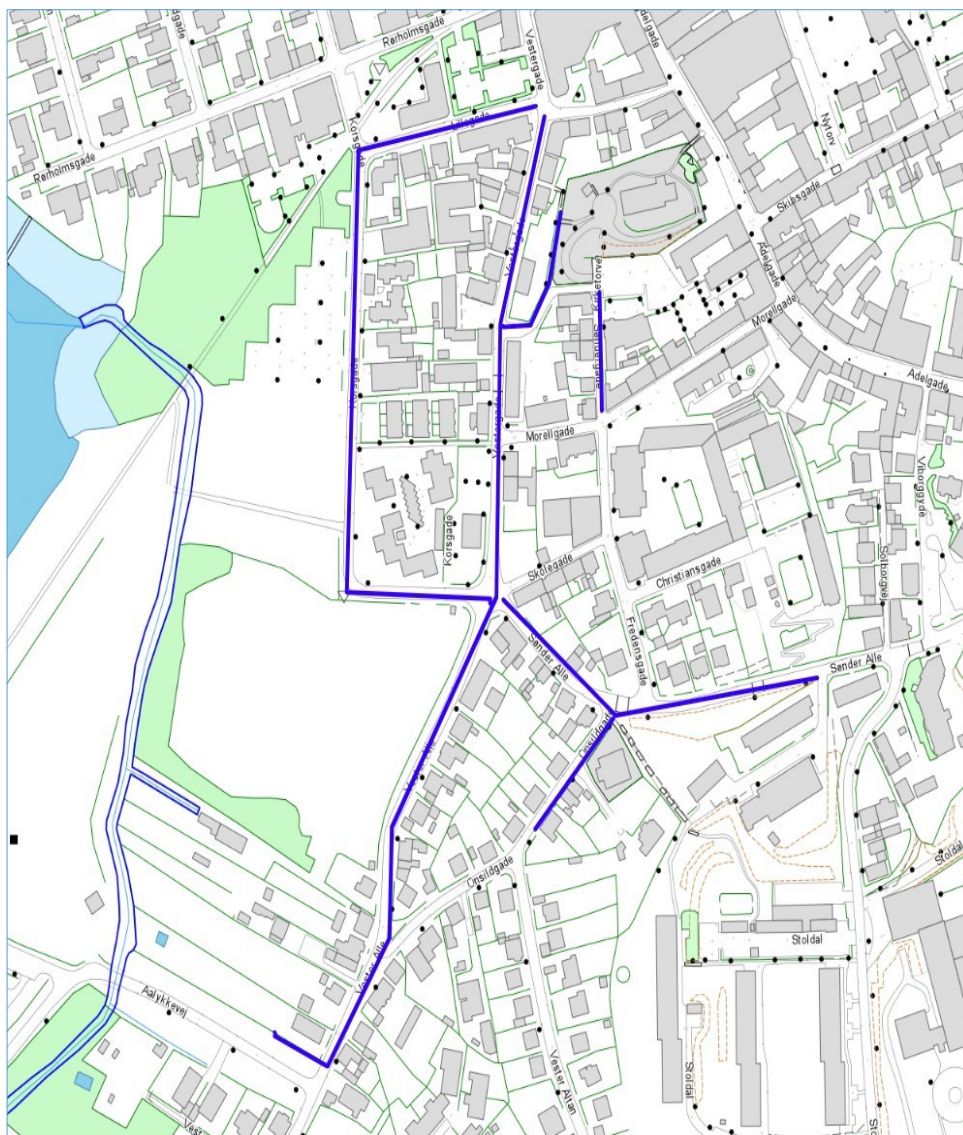

Direktionen indstiller


- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Indstillingen godkendt

I den 1. etape er der etableret en regnvandspumpestation på havnen, og overløbsbygværket er renoveret til tidssvarende forhold (arbejds miljø, drift og overvågning).

Arbejdet skrider planmæssigt fremad.

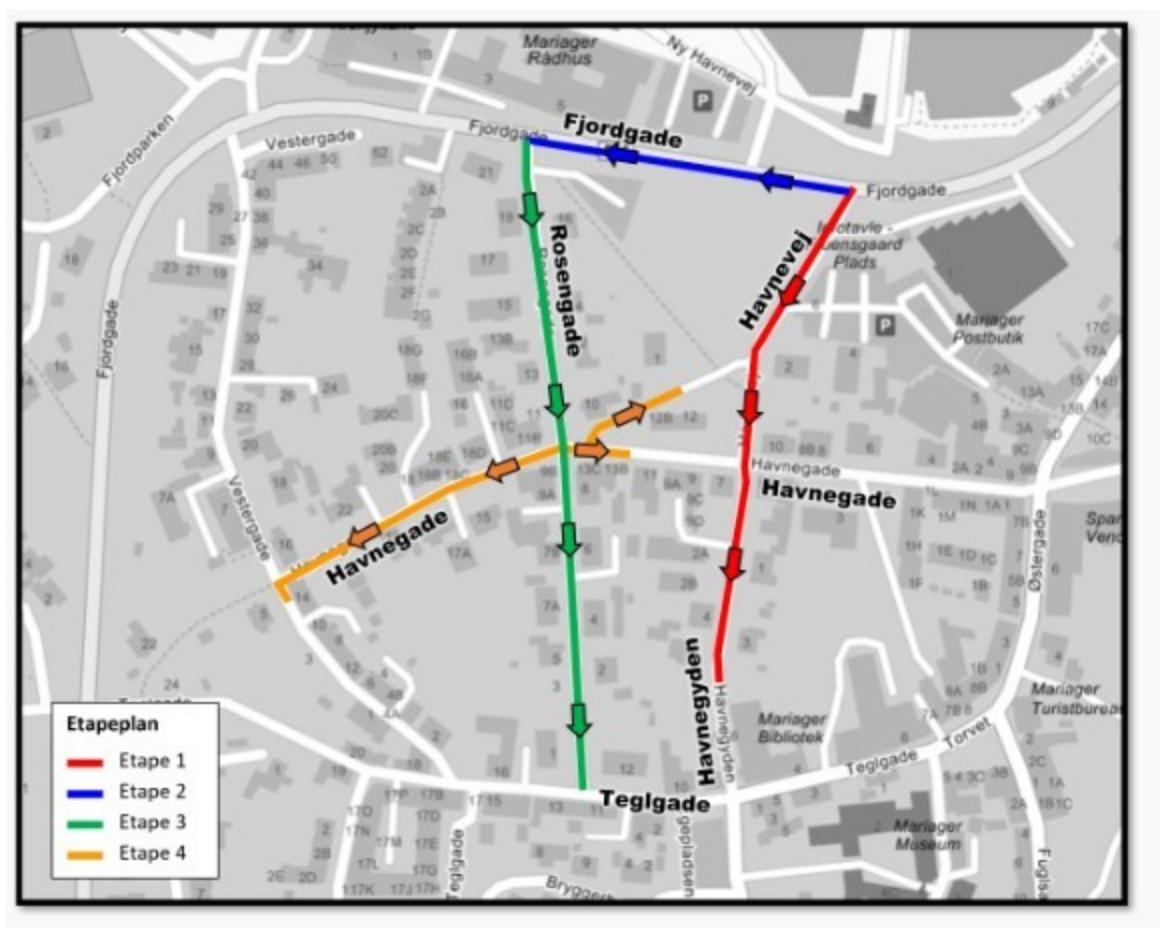

Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029. Næste etape er Separering i Teglgade, Egepladsen Kirkegyden m.fl., hvor projekteringen skal til at starte op, med forventet udførelse i 2027.

Direktionen indstiller:


- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**

Indstillingen godkendt

Sommerhuskloakering syd for Als

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 har foregået hele 2025 og fortsætter frem til februar 2026.

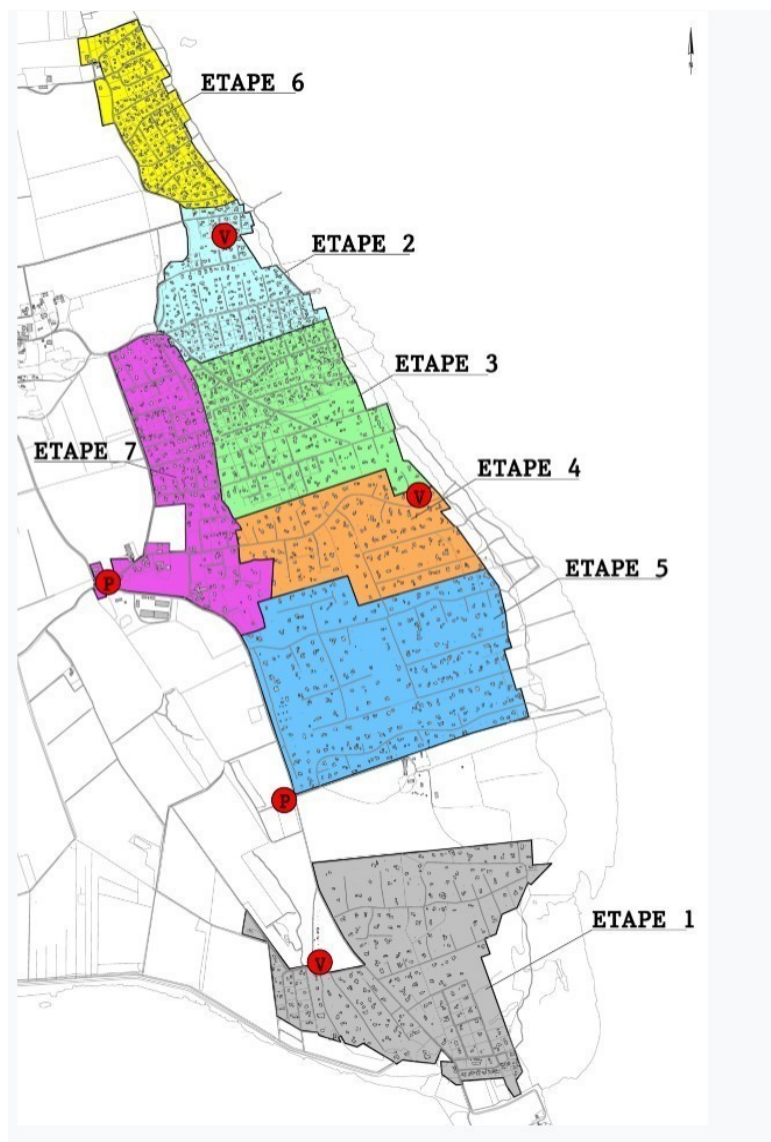

Entreprenøren har god fremdrift og der graves med flere gravehold. Det er forventningen at entreprenøren når i mål til februar næste år.

Vakuumstationen er bygget, og mangler intern installation af rør, pumper styring. Denne del udføres i øjeblikket.

Etape 2 projekteres og sendes i udbud i starten af 2026. Anlægsstart forventes at blive februar/marts 2026 og ventes at tage et års tid.

Etape 3, som er den sidste etape med etablering af en vakuumstation, forventes udført i 2027. Sommerhuskloakeringen fortsætter til og med 2030.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**

Indstillingen godkendt

Det har trukket ud med at få de sidste godkendelser til boring 2 men nu er alle givet. Det er aftalt med boreentreprenøren at boring 2 udføres primo 2026, og den forventes godkendt til indvinding, sammen med boring 1, medio 2026.

Når borerne er udført og godkendt til indvinding, etableres der råvandsledning til Skjellerup Vandværk. Råvandsledningen forventes påbegyndt etableret ultimo 2026.

Udbygningen af Skjellerup Vandværk forventes påbegyndt i 2027.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Indstillingen godkendt

Opsamling på Boringskontroller 2025

Omfang af prøver

Som de seneste år, er der udtaget en årskontrol på vores 11 indvindingsboringer, for løbende at kunne dokumentere vores kvalitet i det indvundne grundvand.

Undersøgelsesresultaterne kan ses i vedlagte bilag 1. Der er analyseret for ca. 130 stoffer i hver boring. Generelt har vi noget meget fint grundvand, der distribueres fra vores 4 vandværker, med 2 boringer til Østvandværket, 5 boringer til Skivevejens Vandværk, 1 boring til True Vandværk og 3 boringer til Skjellerup Vandværk.

Pesticider

For samtlige analyserede boringer er koncentrationerne af de undersøgte pesticider og PFAS- forbindelser under detektionsgrænsen (typisk < 0,01 µg/l).

Metaller og uorganiske stoffer

- Arsen varierer fra 0,046 til 4,0 µg/l, hvilket er under grænseværdien for drikkevand ved forbrugerne (5 µg/l). Driftskontrol ved afgang vandværk viser dog at der renses ned til et niveau på 0,11 µg/l på det vandværk hvor niveauerne i boringerne er højest.
- Jern varierer fra <0,01 til 0,79 mg/l, hvor enkelte boringer nærmer sig eller overstiger den vejledende grænseværdi (0,2 mg/l). Igen performer vandværkets filteranlæg tilfredsstillende og reducere indholdet til under detektionsgrænsen.
- Ammonium, nitrat og nitrit ligger generelt lavt og under grænseværdierne.

Særlige bemærkninger

- For enkelte boringer er detektionsgrænsen for pesticider hævet pga. interferens, hvilket betyder, at der kan være usikkerhed om tilstedeværelsen af meget lave koncentrationer.
- Alle prøver er udtaget akkrediteret af laboratorievirksomheden Eurofins.

Konklusion

Vandkvaliteten i de undersøgte boringer vurderes generelt som god og overholder de gældende krav til drikkevand. Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede

stoffer over detektionsgrænsen, og de fleste øvrige parametre ligger inden for de anbefalede værdier.

Enkelte boringer har forhøjet Arsen eller Jern – men ved driftskontrol på vandværkerne samt akkrediterede prøver på ledningsnettet, er vi for de samme parametre, langt under grænseværdierne.

Direktionen indstiller:

- At ovenstående tages til efterretning

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**

Indstillingen godkendt

Budgetopfølgningerne 31.10.2025 for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) udviser fortsat en stabil udvikling for både VAND (bilag 1) og SPILDEVAND (bilag 2), hvor resultatet forventes at blive ca. 10% bedre end budgetteret.

Der har stadig været meget få vandbrud i 2025.

På spildevandssiden har der været forholdsvis meget vedligeholdelse på pumpestationer, hvor der arbejdes på at få forbedret driftssikkerheden de mest ressourcekrævende steder. For ledningsanlæggene har der været få nedbrud indtil november, hvor der er sket to større hændelser.

For HLR følges driftsbudgettet meget fint og årets lave vandmængde, er medvirkende til at gøre MFVs resultat bedre, da den lave vandmængde øger betalingen i særbidrag og betalingen fra RVS og VHV.

Samlet forventes et resultat i 2025 som er ca. 10% bedre end forventet.

De store variationer mellem budgetterede og realiserede omkostninger skyldes flere forhold, men for både VAND og SPILDEVAND skyldes den store ændring under posten Administrationsbidrag, den nye fordelingsberegning af fællesudgifterne i RenForM, således anlægssagerne og MAR betaler en stor del af fællesomkostningerne, som kommer MFV drift til gode.

For SPILDEVAND skyldes den store afvigelse mellem Salg el under Indtægter og Drift og vedligeholdelse under Rensningsomkostninger, at det meste af det el vi producerer, bruger vi direkte på renseanlægget, uden afgifter mv.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen gennemgås**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Indstillingen godkendt

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025

Fra oktober 2025 er anlægsoversigten opdelt i tre områder: Drikkevand, Spildevand og Fællesrensning Himmerland (FH). Ændringen giver en klar opdeling af brutto og netto udgifterne for hvert område. For FH er netto udgiften, når Rebild og Vesthimmerlands andel er fratrasket.

Opdateret estimat på anlægsbudgettet pr. 15.10.2025 vurderes for **Vand til brutto 3,4 mio. kr. og netto 3,1 mio. kr.** For **Spildevand til brutto 85 mio. kr. og netto 81 mio. kr.** For **FH til brutto 8,6 mio. kr. og netto 4,6 mio. kr.** Samlet giver det en brutto anlægsinvestering på ca. 97 mio. kr. i 2025, som der skal være likviditet til at gennemfører. Netto udgiften forventes at lande på 88,7 mio. kr.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af bilag 1. Nedenfor er redegjort for baggrunden for de enkelte budgetforskydninger:

VAND

For VAND er der ikke forskydninger i budget 2025 siden sidste bestyrelsesmøde.

SPILDEVAND

På Gammelvej i Hobro er der en lidt mindre fremdrift end forventet. Det skyldes primært mange fremmedledninger, som har generet fremdriften. Det betyder, at der skal overføres et beløb fra 2025 til 2026, hvor det så bliver udført de første par måneder.

I september 2025 blev der udlagt slidlag på Løgstørvej. Det betyder at udgiften er afholdt i 2025 i stedet for i 2026.

Projektet med separering af Finlandsvej, Kirkedals Allé m.fl. sendes i udbud her inden jul 2025, hvilket betyder, at mindre forbruget i 2025 overføres til afholdelse i 2026.

Ombygningen af bassinet ved Mariagervej / Jyllandsvej i Hobro er netop startet op. Der startes med ledninger og ikke med bortgravning af den forurenede jord, hvilket betyder en mindre udgift i 2025, som så forfalder i 1. kvartal 2026 i stedet.

I Hadsund er det ved projekt Pejtersborgvej ikke lykket at få alle lodsejeraftaler på plads, hvorfor opstarten og dermed anlægsøkonomien udskydes til primo 2026 i stedet.

Etablering af de sidste regnvandsledninger ved Arden Skole udføres først i 2026. Et mindre beløb overføres således til næste år.

Endelig er der et merforbrug på renovering af pumpestationer, hvilket primært skyldes, at renovering af pumpestation Havnegade 10 i Hadsund er udført her ultimo 2025.

Fællesrensning Himmerland (FH)

Der er i 2025 afsat økonomi til etablering af en ny centrifuge (slutafvander) på renseanlægget. I løbet af efteråret er der gennemført forundersøgelser, udbud og testkørsler med forskellige leverandører. På baggrund af de indkomne tilbud, er udbuddet blevet aflyst og i stedet arbejdes der på udskiftning til 2 nye dekantere af samme type, som de nedslidte der er i dag. Levering og installation vil først ske i 2026.

Der forventes samlet forbrugt 1,5 millioner kr. i 2025. I 2026 forventes anvendt 4.500.000 kr. så nye slutafvander i alt beløber sig til ca. 6 millioner kr. hvoraf de ca. 0,5 millioner kr. vil gå til undersøgelse af fremtidens slamhåndtering fra HLR.

Langs det afskærende system fra Aars til HLR, arbejdes der fortsat med lugtbegrænsende tiltag, således der i 2026 kan etableres blivende løsning. Processen pågår det første halvår af 2026, før der forventes grundlag til valg af varig løsning.

Direktionen indstiller:

- **At opdateret netto anlægsbudget, for Vand på 3,1 mio. kr., for Spildevand på 81 mio. kr. og for FH på 4,6 mio. kr. godkendes**
- **At ved udskudte arbejder fra 2025 til 2026, overføres ikke anvendt budget i 2025 til budget 2026.**

- At øvrig orientering tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Bilag 1 er først udsendt den 15. december til bestyrelsen. Bilaget er en detaljeret uddybning af de angivne konklusioner i punktet, og ændrer ikke ved indstillingen.

Indstillingen godkendt

Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år

Nedenfor er oplistet de projekter, hvor der er justeringer i økonomien i forhold til den aktuelle fremdrift.

I Hobro er arbejdet med at ombygge det store regnvandsbassin ved Mariagervej nu gået i gang. Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt licitation, og det endelige bud på økonomien er nu på plads. Det er som tidligere orienteret en betydelig økonomi forbundet med bassinprojektet, dels er der meget store mængder jord der skal håndteres, og dels er der en del af jorden i nuværende bassin forurenede med en ret betydelig deponeringsudgift til følge. På 10 års planen ses fordelingen af økonomien for 2025 hhv. 2026.

Separatkloakeringsprojektet ved Finlandsvej har fået et større omfang end tidligere forudsat. Det skyldes, at nogle af de eksisterende ledninger, som var forudsat genbrugt, ikke har en sådan kvalitet, at de kan genbruges. Endvidere er omfanget af omlægning af interne private ledninger også større end forventet, en omlægning som er nødvendig for at få udført et fremtidigt driftssikkert og -hensigtsmæssigt kloaksystem. Det betyder, at der er afsat økonomi til udførelse i både 2026 og 2027.

I 10 års planen har der tidligere som en sum figureret "Bassiner Kirkedalen". De er nu delt op i 3 separate bassinprojekter.

Projektet Vestergade, Søndergade, V. Allé, Onsildgade m.fl. er slået sammen til ét projekt, som udføres over 2 år. Der er licitation i januar 2026 med udførelse 2026-2027.

Fordeling på Gammelvej i Hobro er tilpasset arbejdets fremdrift hen mod årsskiftet. Det afsluttes i 1. kvartal 2026.

Økonomien for etablering af klimasikringspumpestation ved Havnegade i Hadsund er rykket til 2026 grundet udfordringer med at få fastlagt kvaliteten af spunsvæggen ud til fjorden, som orienteret om tidligere.

Økonomien forbundet med renovering af forskellige pumpestationer (Andrupvej, Randersvej og Gasværksvej i Hobro) er flyttet til udførelse i 2026.

Det nylige driftsstop i Bettebyen (Vebbestrup), gør at det undersøges om den planlagte totalrenovering i 2027 skal fremrykkes til 2026, hvorunder fremtidig pumpestationsstruktur for Vebbestrup og Øster Doense skal afklares som det første.

På sommerhusområdet foreslås det for 2027 at ændre investeringsrammen fra 27 mio. kr. til 20 mio. kr., og at rykke investeringen til 2029, som så øges tilsvarende. Baggrunden er ønsket om et mere tilpasset omfang af ny-anlæg i 2027.

På VAND er økonomien for vandprojektet ved Randersvej og Søndervang justeret, dels efter afholdt licitation og nu med indregning af VANDs andel i projektets fællesomkostninger (Randersvej er dyr at grave i).

For FH er det ultimative ny VVM og udledningstilladelse for HLR. Forventes først endelig vedtaget i første halvår af 2027. Der er afsat et skønsmæssigt beløb til færdiggørelsen.

Lokalplan og tillæg til spildevandsplanen for udvidelse af HLR følger VVM'en, så der vil tidligst kunne påbegyndes udbygning i 2027.

I udvidelsen af HLR er 4.-rensetrin den langt største investering, med pt. en skønnet omkostning på 130 millioner kr. Udredningsarbejdet for valg af 4.-rensetrin er allerede startet i 2025 og vil pågå i hvert år frem til 2028, hvor den egentlige etablering forventes at ske fra.

Direktionen indstiller:

- **At nærværende 10-årsplan anvendes som grundlag for MFV's fremtidige investeringer.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Indstillingen godkendt

Tiden rinder ud for de Byrådsudpegede i denne valgperiode og der må forventes ændringer blandt de Byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer i 2026.

Nærværende punkt er tænkt til anbefalinger/refleksioner over de sidste 12 års arbejde i MFV, som bestyrelsen gerne vil have sendt videre til den nye bestyrelse.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Der opfordres til at orienteringerne kun berigtiges/suppleres på de væsentligste områder på møderne.

Generelt ønskes der fokus på områderne, hvor bestyrelsen har beslutningskompetencen/ansvaret.

Ved spørgsmål/kommentarer der er udover dagsordenens indhold, skal det behandles under "Eventuelt" eller optages på næstkommende dagsorden.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**

Intet at bemærke

Mødekalender for 2025

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 20.00.

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RenForM og MFV.

Torsdag den 28. januar 2026 (Ekstraordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 23. februar 2026 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse og lånegarantier 2026)

Mandag den 27. april 2026 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2025)

Torsdag den 28. maj 2026 (Ordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 22. juni 2026 (Bestyrelsesmøde – besigtigelse af anlæg og projekter)

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 15. december 2025:

Blev taget til efterretning

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

- V 75 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer
- V 76 – Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
- V 77 – Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 78 – Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund
- V 79 – Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro
- V 80 – Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager
- V 81 – Sommerhuskloakering
- V 82 – Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads
- V 83 – Boringskontroller 2025
- V 84 – Budgetopfølgning pr. 31.10 2025
- V 85 – Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025
- V 86 – Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025
- V 87 – Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 88 – Evaluering af den forgangne bestyrelsesperiode
- V 89 – Eventuelt
- V 90 – Næste møde
- V 91 – Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- V 92 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne V 77, V 87 og V 92 holdes som lukket.**

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
15. december 2025:**

Indstillingen godkendt
