

REFERAT Mariagerfjord Vand A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 15:00

Mødested Fægekroen Hadsund, Færgevej 1-2, Hadsund Syd, 9560 Hadsund

Indholdsfortegnelse

V 47 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer.....	3
V 48 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	4
V 49 - Bestyrelsestur.....	5
Lukket.....	7
V 51 - Ud- og overløbsregistrering af overløbssystemet.....	7
V 52 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund.....	9
V 53 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro.....	14
V 54 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager.....	21
V 55 - Separatkloakering og klimatilpasning øvrige opland.....	24
V 56 - Sommerhuskloakering.....	30
V 57 - Status - udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads.....	33
Lukket.....	34
V 59 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2026.....	34
V 60 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026.....	35
V 61 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2026.....	39
Lukket.....	41
V 63 - Eventuelt.....	41
V 64 - Næste møde.....	42
V 65 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	43
Lukket.....	45

Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer

Velkommen til udvidet bestyrelsesmøde, hvor størstedelen af mødet vil foregå sideløbende med møderne i MAR og RenForM, på en bestyrelsesrundtur for at besigtige dele af vores aktiver.

Under turen vil orienteringspunkter blive afsluttet, efter sidste besigtigelse som orienteringspunktet omhandler.

Under punkter hvor der er indstillet beslutninger, afsluttes punktet først under det særskilte bestyrelsesmøde for MFV, der afholdes i umiddelbar forlængelse af besigtigelsesturen. Det særskilte møde for MFV afholdes før RenForM og MAR møderne.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Orienteringen blev taget til efterretning

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2026 blev frigivet fra First Agenda den 28. april 2026.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda. Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i.

Alle har godkendt referatet i First Agenda.

Direktionen indstiller:

- **At referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2026 er indført som godkendt.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Bestyrelsestur 2026

Nærværende møde foregår dels ved bustur rundt i kommunen for at bese diverse aktiver i selskaberne og dels ved et kort ordinært møde, når vi er tilbage fra busturen. Møderne afsluttes med fælles middag ca. kl. 19.30.

Alle afdelingsledere vil deltage i busturen, hvor relevante punkter fra dagsordenen vil blive behandlet ved de respektive besigtigelser.

Afdelingslederne er:

- Arne Stensgård Poulsen, økonomichef
- Kirstin Bjørnbak Kjær, sekretariatschef
- Susanne Selch Skov, afdelingsleder affald
- Jan Laursen, afdelingsleder ledningsanlæg og anlægsprojekter
- Anne-Marie Truelsen, afdelingsleder Himmerlands Renseanlæg (HLR), virksomheder, tømningsordninger og Fællesrensning Himmerland (FH)
- Jonas Peter Støvring, afdelingsleder vandværker, pumpestationer og IT

Busturen starter og stopper ved Fægekroen, Færgevej 1, Hadsund Syd og ruten er ca. som følger: Fægekroen – Als Odde – Als – Hadsund – Rostrup – Hobro – Mariager – Hadsund Syd – Fægekroen.

For MFV vil følgende blive besigtiget under turen:

- Ny vakuumstation ved Als Odde (status på sommerhuskloakeringen)
- Udluftningsbrønd på udløbsledningen syd for Als (status på drift HLR og miljøundersøgelser i VVM-processen)
- Pumpestation Stadionvej i Hadsund (separatkloakering Hadsund, ombygning overløb, regnvandsbassiner ved separatkloakering og klimatilpasning)
- På tur fra Hadsund til Rostrup orienteres om separatkloakering af oplandsbyer.
- Rostrup og Nr. Redsø Vandværker (ansøgninger om overtagelse samt fremtidige indvindingsområder)
- Udluftningsbrønd på Tobberupvej (samarbejdet om FH samt ansøgningsstatus for ny VVM)

- Pumpestation Gasværksvej, Hobro (driftsproblematikker, overløbsregistrering, forskønnelsesønsker fra omgivelserne og ombygningsplaner)
- Randersvej og Jyllandsvej i Hobro (separatkloakering Hobro, regnvandsbassiner og sløjfning af overløbsbygværker).
- På turen fra Hobro til Mariager orienteres om stade på fremtidig håndtering af slam fra HLR.
- Rosengade/Havnegade i Mariager (separatkloakering Mariager, herunder skybrudsvej og arkæologi)
- På tur fra Mariager til Hadsund Syd orienteres om separatkloakering af Assens Vest og ”mørnet” trykledning fra Norup til Assens)
- Banevej, Hadsund Syd (besigtigelse af itu gået fjordledning samt ny ledning)

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Status på registrering af regnvejsbetingede overløb


Der arbejdes fortsat med at etablere overvågning på alle overløbsbygværker, der ikke forventes nedlagt inden 5 år (inden udgangen af 2031), inden udgangen af 2026.

Status pt er at der skal monteres og idriftsættes udstyr på yderligere 8 bygværker i 2026, således der herefter er registrering på 39 overløbsbygværker (se bilag 1 og 2)

De overløbsbygværker der ikke monteres overvågning på er:

3 stk. i Visborg, 3 stk. i Hadsund, Vive, 2 stk. i Øster Doense, Hadsundvej, Hobro, 6 stk. i Vestergade/Vesterallé, Hobro, Randersvej, Hobro, Holmgård, Skjellerup og Assens Vest, i alt 20 stk.

Derudover er der monteret adskillige "lus" i de separatkloakerede områder. De er registreret som nødoverløb, indtil området lusen dækker, bliver erklæret separatkloakeret på egen grund, af MFK, hvorefter lusen fjernes. Der pågår et arbejde med at få registreret lus i vores system.

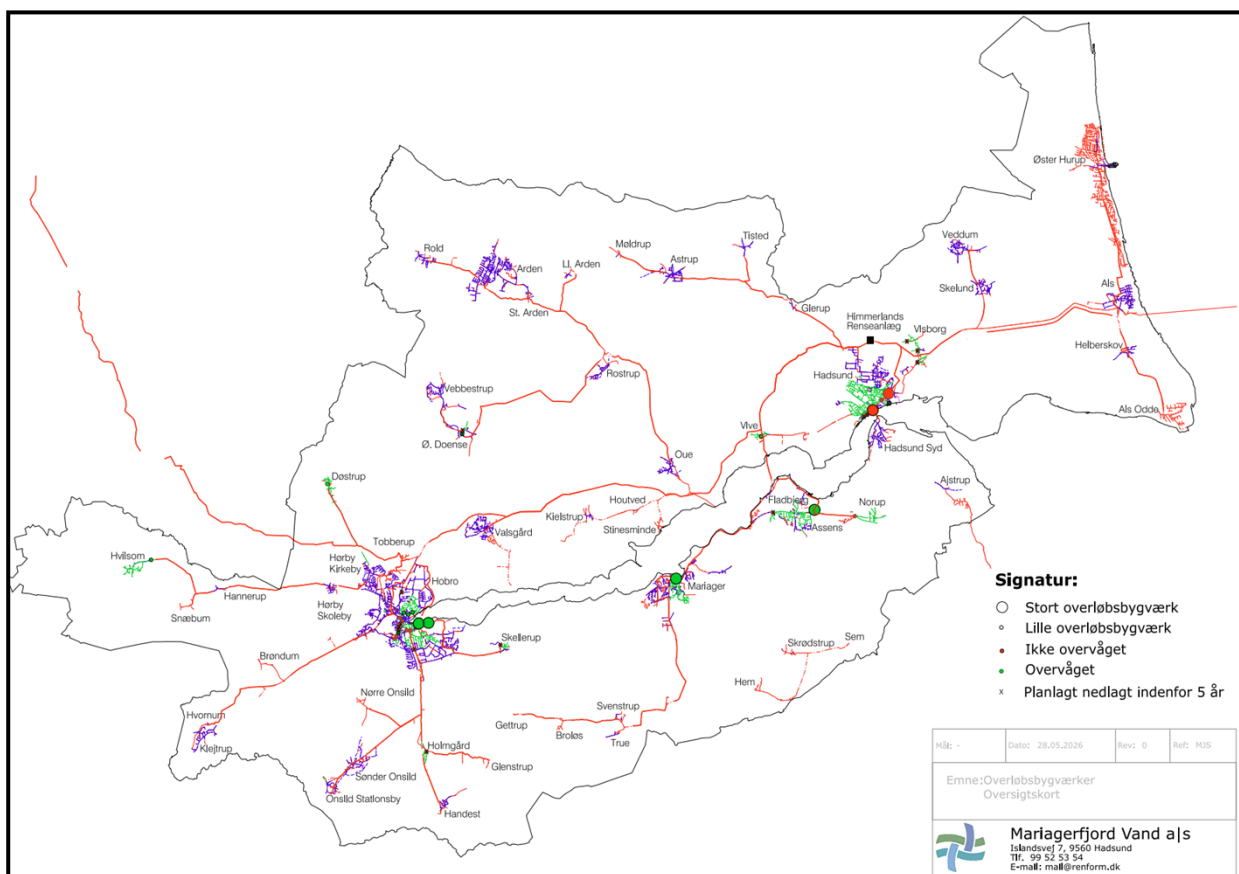

Figur 1- Oversigtskort for overløbsbygværker

Siden sidste bestyrelsesmøde har man kvalificeret viden/data omkring de manglende 8 overløbs-bygværker ved hjælp af bl.a. fotodokumentation. På baggrund af dette skal der nu defineres opgaver ved hvert enkelt bygværk, som beskriver den konkrete ombygning der skal finde sted, før en valid registrering kan etableres, hvad enten det omfatter antal/varighed og/eller flow.

Lovgivningsmæssigt er der ikke noget nyt, men det forventes at den nye regering vil fremsætte lovforslag der indfører afgift på overløbsvand.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund


Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkloakering

Arbejdet udføres i 2 etaper – skitseret med blå hhv. rød markering på skitsen nedenfor. Første etape er den blå etape, som omfatter de ejendomme, som også har været udfordret af kælderopstuvninger. Etape 1 forventes udført i 2026. Etape 2 projekteres i 2026 med henblik på udførelse i 2027.

I projektet omlægges fjernvarme, Hadsund Vandværk deltager på Jernbanegade og endelig udskifter kommunen fortøve på enkelte strækninger og retter det op på resten.

Status på etape 1 er at der graves i Rolighedsvej og Jernbanegade, og ombygningen af bassinet til overløbsbassin pågår pt.

I forbindelse med separeringen skal der etableres forsinkelsesbassin sydøst for Stadionvej. Dette skal sandsynligvis ske, uden at Tykkenkærgrøften berøres. Bassinet forventes udnyttet via en regnvandspumpestation, der etableres i tilknytning til den eksisterende pumpestation.

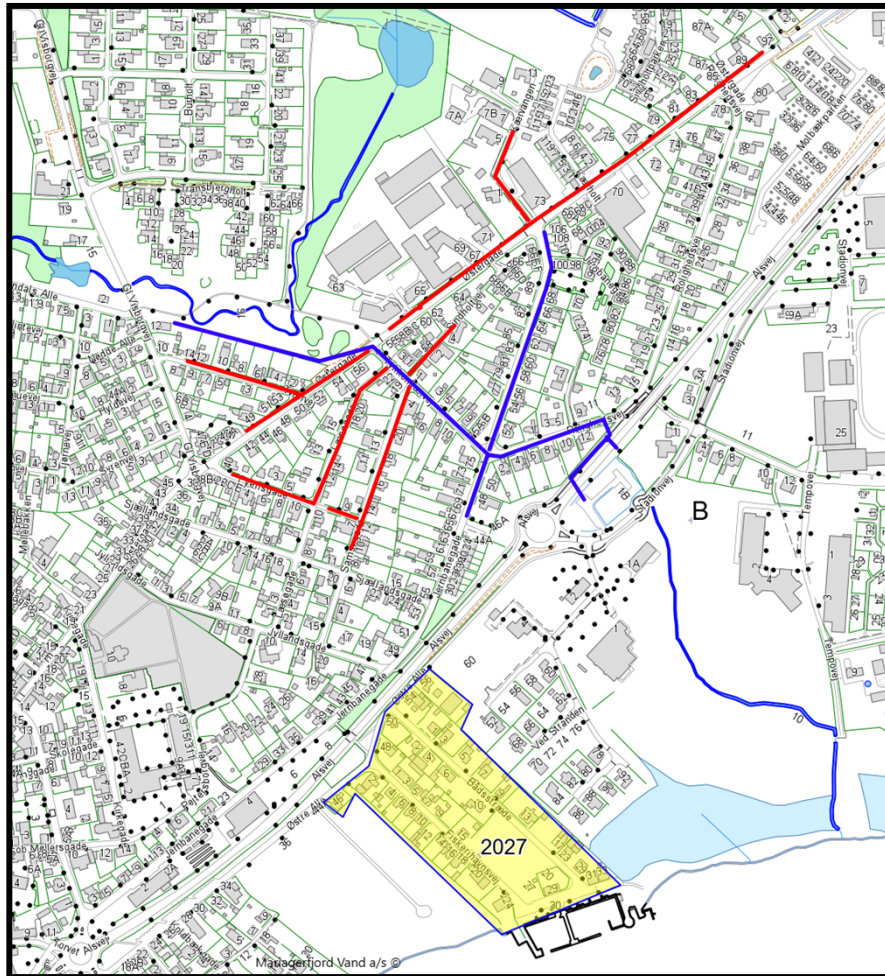

Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2027 forventes Fiskerihavnsvej og Bådsstræde separatkloakeret, begge fjordnære områder med nye regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. Området umiddelbart øst for, forventes klimasikret i samme forbindelse. I 2026 udarbejdes skitseprojekt, hvor der er fokus på minimering af gravedybden. Området er vist med gult ovenfor.

I forbindelse med etappen, disponeres eksisterende areal øst for området for klimatilpasning sammen med nærværende etapes løsninger.


Regnvandspumpestation Havnegade

Som vist på skitsen nedenfor er der arbejdet på at etablere en ny regnvands- og klimasikringspumpestation ved Havnegade i Hadsund. Pumpestationen skal mens, det lavtliggende område stadig er fælleskloakeret, hjælpe til med udpumpning af

overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen dimensioneres samtidig til at være den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring. Pumpestationen vil være af samme type, som er etableret ved havnen i Mariager.

På baggrund af stærk forurening i jord og grundvand, hvor pumpestation og udløbsledninger har været planlagt – kigges der på alternative placeringer. Bl.a. vurderes mulighed for regnvandspumpestation ved kanalen med udløb øst for Da Vinci. Et andet alternativ er at placere pumpestation ved det store overløbsbygværk ved Brolandingen. Vurderinger pågår i øjeblikket.

Aktuelt har vi modtaget henvendelser fra flere ejere på Strandvej (både telefonisk og via mail), som stadig oplever kælderopstuvninger – og spørger til status på afhjælpning af forholdene. Vi har aftalt at mødes med vejlaugene på Strandvej og forklare hvilke tiltag vi allerede har udført, og hvad løsningen forventes at blive.

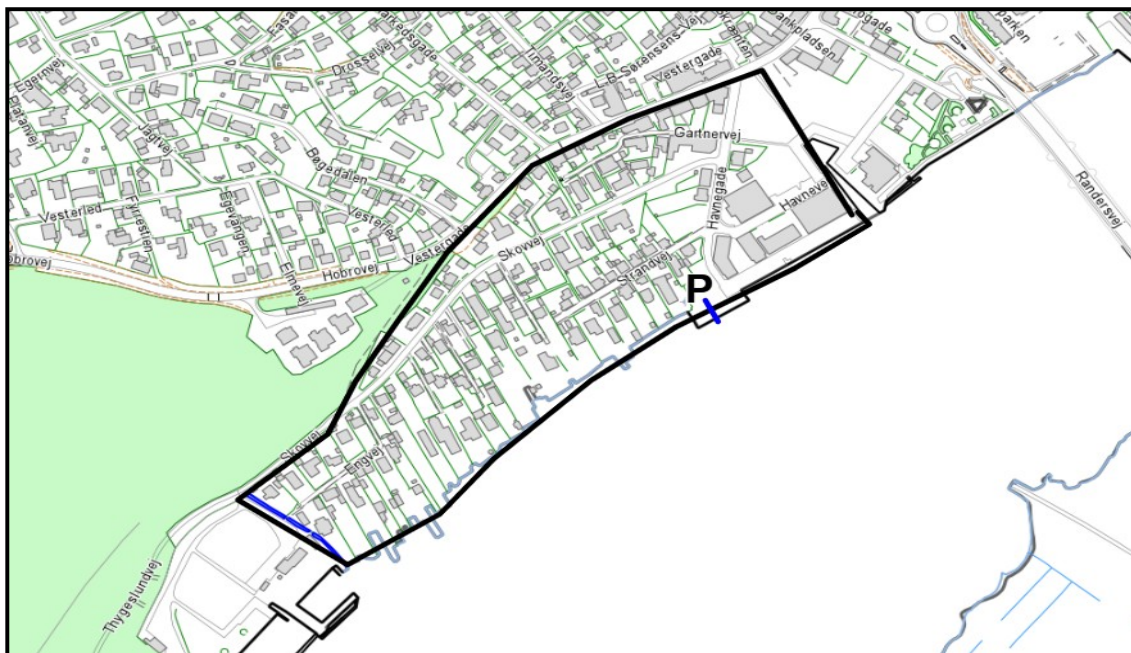

Pumpestationsprojektet med tilhørende ledningsanlæg koordineres med havneforsønnelsesprojektet lige vest for brolandingen.

Renovering af overløbsbygværk Brolandingen Hadsund


Det store overløbsbygværk ved Brolandingen i Hadsund trænger til en renovering i forhold til at forbedre drift og arbejdsmiljø. Således forventes etableret nye riste, skumskærme og dæksler – som ved overløbsbygværket ved havnen i Mariager. I den forbindelse undersøges det om overløbskanten kan hæves til samme niveau som ved Stadionvej. Og ikke mindst etableres der overvågning på bygværket.

Derudover bliver det sandsynligvis nødvendigt at klimatilpasse bygværket med en udløbspumpe.

Trykledning Hadsund Syd

Den eksisterende trykledning under fjorden, blev der konstateret flere brud på i november 2025. Ledningen anses for at være i så dårlig kvalitet, at der skal etableres en erstatning.

Aktuelt er der opstillet 2 store gyllecontainere til håndtering af spildevandet fra Hadsund Syd. Der foretages tømning et par gange i døgnet med gylletransporter, så der er styr på den almindelige driftssituation.

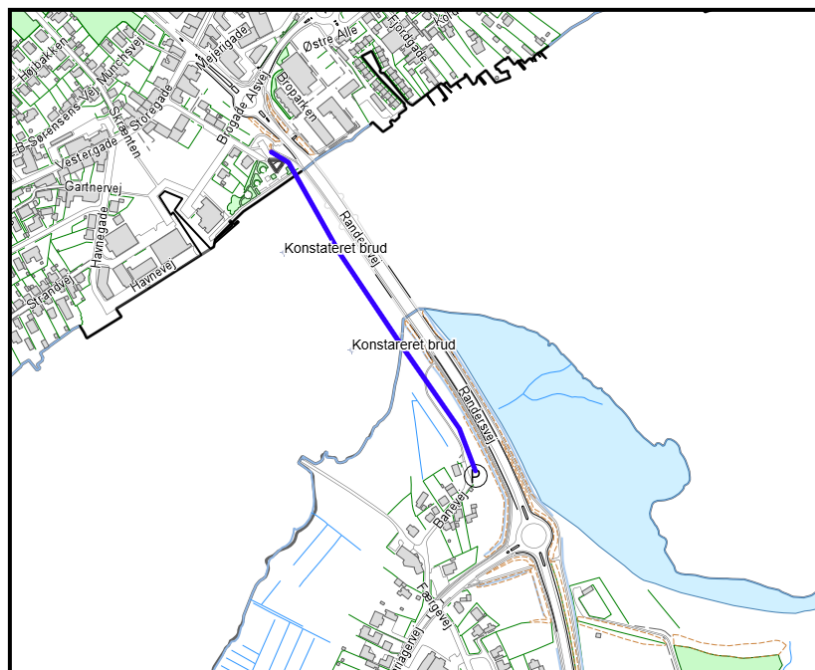

Det forventes, at der etableres en ny "synkeledning" med et medierør(trykrør) indeni, så medierøret er beskyttet af et robust "kapperør". Synkerøret spules ned i fjordbunden med en slæde – en metode, som vurderes at være nænsom i forhold til ophvirvlning af sediment – i forhold til f.eks. gravning.

Kystdirektoratet har netop sendt tilladelse i 4 ugers høringsperiode, og kommer der ikke indsigelser, vil vi kunne gå i gang med udførelsen fra ca. 6. juli – i praksis efter sommerferien (august/september). Dialog og tilbudsindhentning ifm. udførelses kommer til at foregå i juni/juli måned.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:


Indstillingen godkendt



Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Hobro syd

Separatkloakeringen af Sydbyen i Hobro har forløbet over de sidste tre år. Status ses nedenfor.

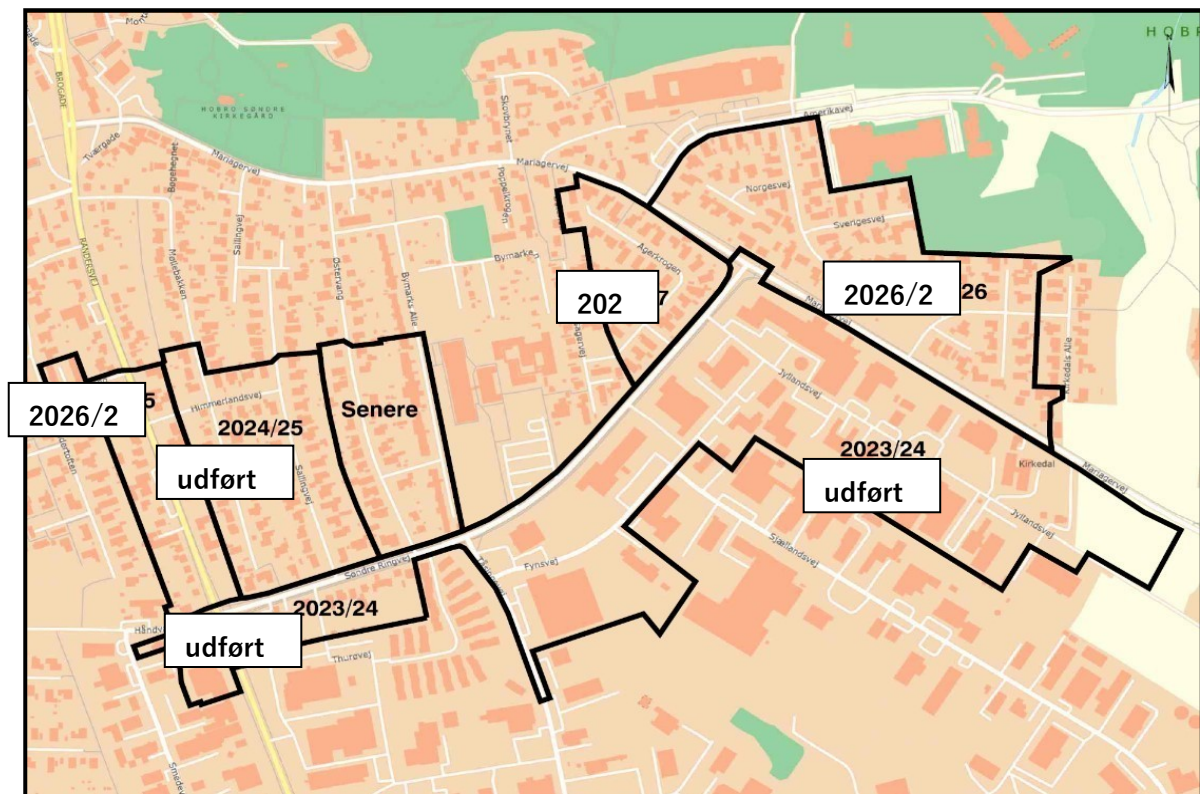

Randersvej

Fællesprojektet på Randersvej er godt i gang. Fællesprojektet omfatter separatkloakering, renovering af vandledninger, etablering af både transmissionsledninger og distributionsledninger til Fjernvarme, og endelig etableres cykelsti med renovering af fortove, belysning og beplantning fra kommunens side.

Trafikken opretholdes i 2 spor, mens arbejdet gennemføres. Aktuelt graves der i vestsiden mellem Ingo og Søndervang. Efter sommerferien starter arbejdet i østsiden fra lyskrydset og mod nord, samtidig med at vestsiden færdiggøres ved Søndervang. Når der arbejdes ved lyskrydset vil sidebenene være lukket i et par uger.

Randersvej forventes færdiggjort i 2026, mens Søndervang etableres i 2027.

Det er Mortensen og Nymark, Klarup, der er entreprenør.

Norgesvej, Finlandsvej m.fl.

I Norgesvej, Finlandsvej, Kirkedals Allé, Sverigesvej og del af Amerikavej gennemføres separatkloakeringen over 2 år. Firmaet VAM A/S er godt i gang med arbejdet og har etableret ledningerne i Mariagervej fra bassinet og op til Kirkedals Allé. Pt. graves der inde på Kirkedals Allé. Mariagervej er ved bestyrelsesmødets afholdelse asfalteret og genåbnet igen.

Det udbudte projekt omfatter også et nyt vådt bassin øst for vandrehjemmet på Amerikavej.

I 2026 forventes Mariagervej, Kirkedals Allé samt den sydlige del af Finlandsvej etableret, mens arbejderne fortsætter i 2027 på resten af Finlandsvej, Norgesvej, Amerikavej samt på bassinet ved Vandrehjemmet.



Bassiner

Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelses- og rensebassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd – bassiner, hvis placering og størrelse er afstemt med vandløbs-, spildevands- og naturmyndigheder hos MFK.

- Ombygning af eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra et tørt til vådt bassin (netop afsluttet)
- Etablering af vådt bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej (med i Finlandvejprojektet)
- Etablering af vådt bassin i slugten øst for Kirkedals Allé (2027)
- Etablering af tørt og vådt bassin ved Amerikavej, øst for Kirkedals bækken (2027).

Bassin Mariagervej / Jyllandsvej

Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin er afsluttet.

Udover omdannelsen, har projektet også omfattet en afkortning af bassinet mod øst, på ca. 15 meter, som overtages af Powercon, når MFVs arbejder er afsluttet.


Bassinet er i brug.

Øvrige projekter i Hobro

Gammelvej, Hobro

På Gammelvej i Hobro er gennemført kloakseparering samt renovering af vandledninger. Projektet blev udvidet med det stiplede, for at alle ejendomme der har udløb via Gammelvej har fået separate skelbrønde. Der kom 10 ekstra med. Hobro Varme er efter opstarten hoppet med i projektet.

Arbejdet er afsluttet.

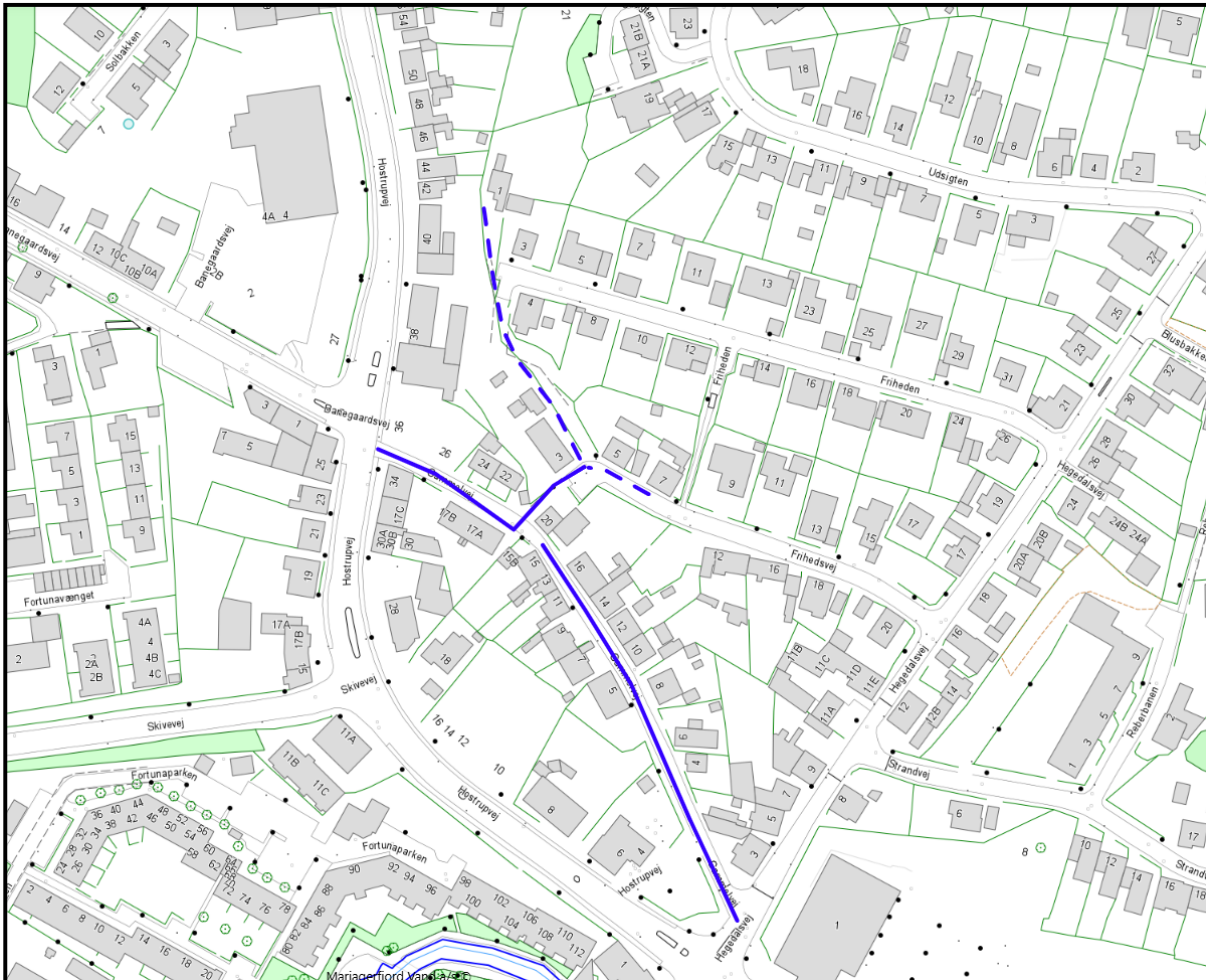


Vestergade, V. Allé

I 2026-2027 udføres arbejdet med separering af området ved og omkring Vestergade / V. Allé. Projektet er ud over separering, også en forberedelse til fremtidig byudvikling i den nordvestlige del af Hobro ved Fyrkat Engsø og op til Løgstørvej. I projektet foretages også renovering af vandledninger og i mindre grad etablering af fjernvarme.

Entreprenørfirmaet Arkil A/S er anlægsentreprenør. Da der konstateredes en kraftig forurening i Korsgade blev det besluttet at ændre projektet, så ledningerne i Korsgade flyttes op i Vestergade. Det betyder "klemte" ledninger samt snævre arbejdsforhold, da flere huse i den nordlige del af Vestergade ligger helt ud mod fortovet.


Entreprenøren er rykket over i Sdr. Allé og Onsildgade og arbejder der. Herefter udføres Søndergade og Vestergade og til sidst Vestre Allé.

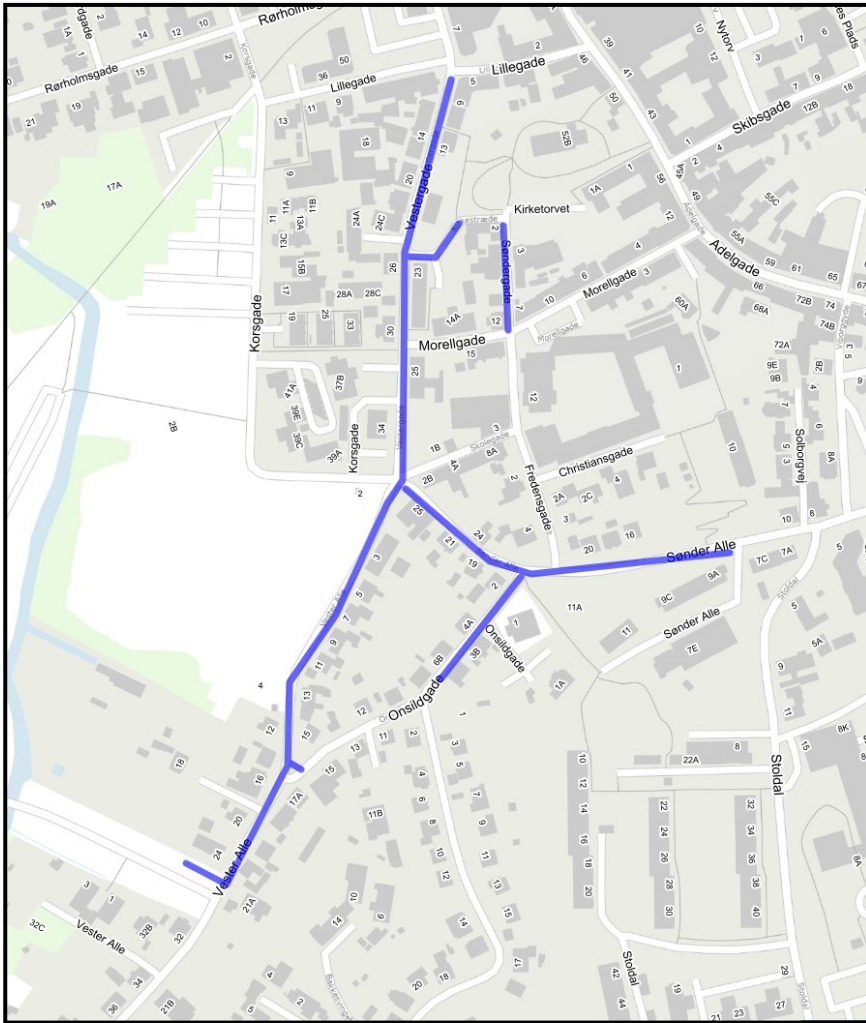

Hadsundvej, regnvandsledning

På Hadsundvej forventer vi i 2026 at etablere en større og dybere beliggende regnvandsledning for dels at skabe kapacitet i regnvandssystemet, samt at muliggøre afledning af regnvand fra flere store matrikler, hvor det ikke er muligt i dag – herunder at vende afledningen fra et delområde af Lupinvej til Hadsundvej. Projektering påbegyndes inden sommerferien.

Området syd for Hadsundvej (Elco-byg) er fortrinsvis fælleskloakeret og vil blive separatkloakeret ved etableringen af regnvandsledningen.

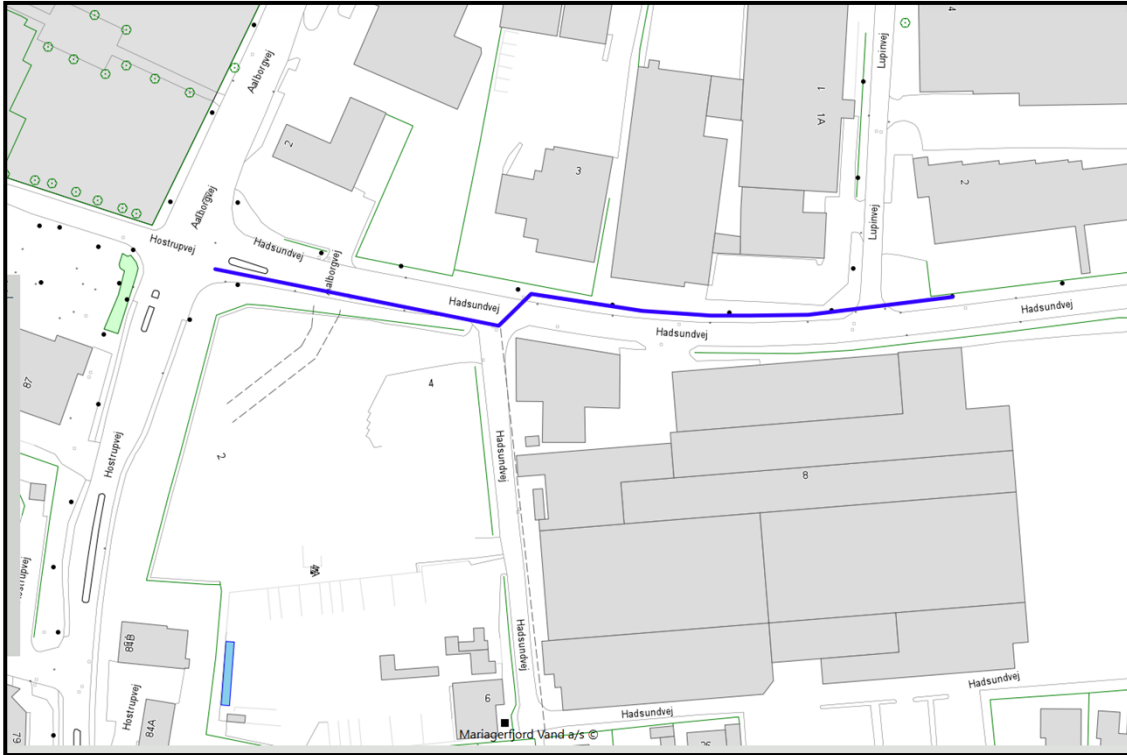

Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt



Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

Etaperne i Mariager er vist nedenfor:

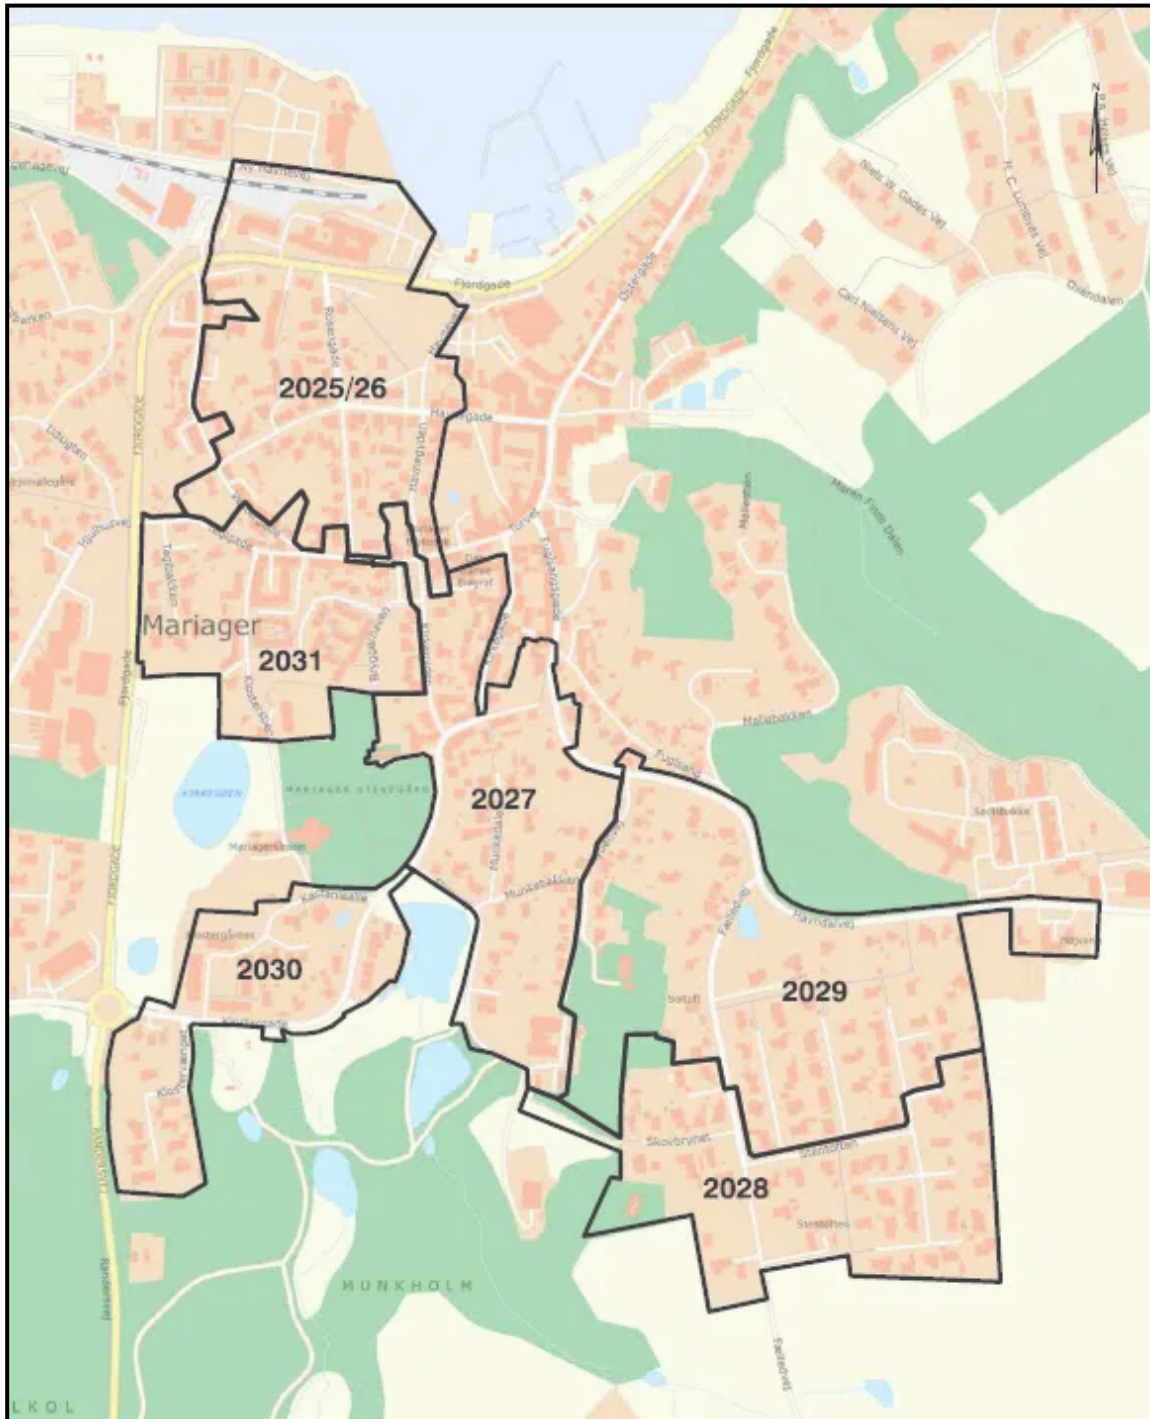


I den 1. etape er der etableret en regnvandspumpestation på havnen, og overløbsbygværket er renoveret til tidssvarende forhold (arbejds miljø, drift og overvågning).

Rosengade m.fl. - separatkloakering

Etape 2 omfatter separatkloakering af Rosengade, Havnevej, Havnegyden samt den vestlige del af Havnegade. Se skitse nedenfor.

Arbejdet går planmæssigt. Aktuelt er Havnevej og Havnegyden afsluttet. I Rosengade Og Havnegade er ledningerne også etableret og der asfalteres inden sommerferien. I august færdiggøres arbejderne i de private haver mellem Vestergade og Rosengade. Det er entreprenørfirmaet VAM A/S, der graver i Mariager.

Der har især i den seneste tid været stor arkæologisk aktivitet, som både har kostet i både tid og penge. Til trods herfor afsluttes arbejderne i august, et par måneder før tid.

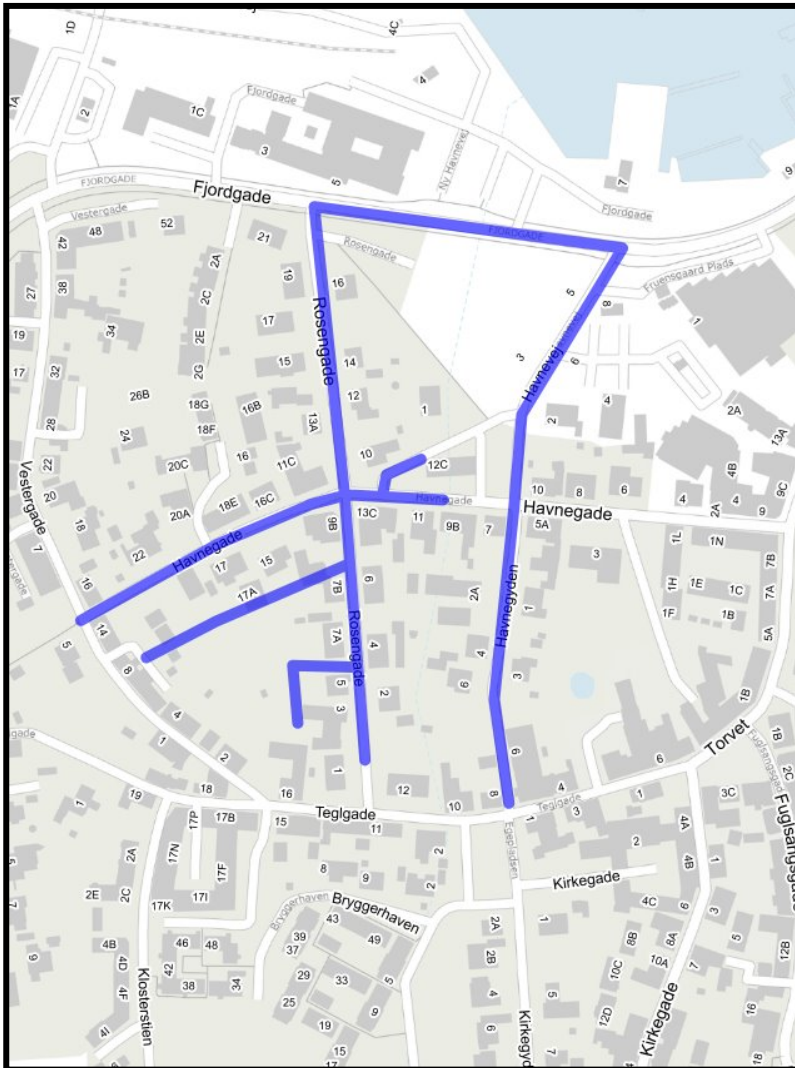

Næste etape er separering i Teglgade, Egepladsen, Kirkegyden m.fl., hvor projektering og udbud vil pågå resten af året, med forventet udførelse fra primo 2027.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Separatkloakering – øvrige opland

Dagsordenspunktet ”separatkloakering i det øvrige opland” omfatter projekter **udenfor** Hobro, Mariager og Hadsund.


Holmgaard – separatkloakering

I 2026 er der afsat beløb til separatkloakering af Holmgaard by. Udover separatkloakeringen skal pumpestationen fornyes/renoveres.

Ud over den miljømæssige gevinst ved sløjfning af overløbsbygværket i Holmgaard, vil separering af Holmgaard også have positiv effekt på den vandmængde, der pumpes til den sydlige del af Hobro.

Projektering og forundersøgelser (geoteknik, opmåling, TV inspektion) er langt fremme, men vi mangler afklaring omkring placering og type af bassin til håndtering af regnvandet. Aktuelt afventer vi gennemførelse af nedsivningstest for at vurdere, om det er muligt at etablere et nedsivningsbassin eller om det er aktuelt med et traditionelt vådt bassin og udledning til vandløb / Glenstrup Sø.

Vurdering af bassintype, ansøgning og myndighedsbehandling samt afklaring med lodsejer forventes at tage det meste af 2026, hvorfor det på nuværende tidspunkt vurderes realistisk at anlægsarbejdet tidligst kan starte sidst på året og mere realistisk først i 2027.

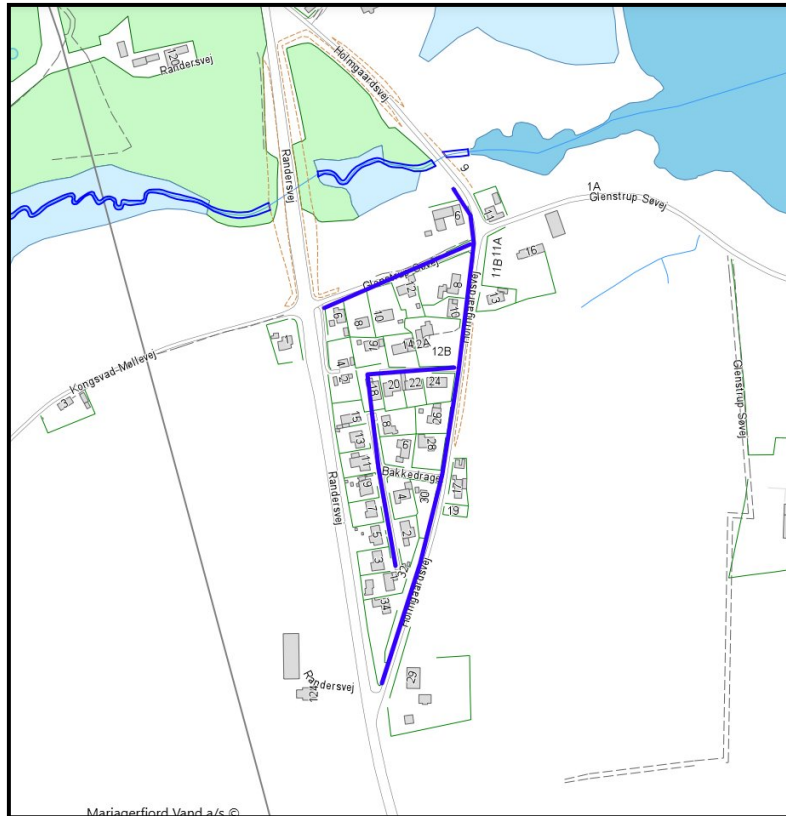

Renovering af pumpestationer Andrupvej og Randersvej

Som følge af en forventet mindre indpumpning fra Holmgård og Sdr. Onsild gennemføres renovering af pumpestationerne på Andrupvej og Randersvej lige syd for Hobro.

Da trykledningen dels er for stor til den fremtidige belastning (snart den aktuelle belastning) og da der på trykledningen har været flere ledningsbrud gennem de seneste år – vil renoveringerne også omfatte en vurdering af om trykledningen skal fornyes og neddimensioneres. F.eks. ved at trække en mindre ledning gennem den nuværende trykledning.

Hele projektet vil blive set som en helhed, hvor udbygning af Andrup og reduktion af Randersvej vurderes. I 2026 forventes projektudformningen og rammer at være på plads, så renoveringerne kan udføres i 2027.

Pumpestation Gasværksvej, Hobro

På den store pumpestation Gasværksvej i Hobro forventes etableret en trykforøger ved Neder Strandvej/lystbådehavnen, så der kan etableres mindre pumper på Gasværksvej – pumper, som er billigere at vedligeholde, og samlet vil give en betydeligt billigere og mere sikker drift af hele systemet.

Også her forventes projektudformningen og rammer at være på plads i år, så renoveringerne kan udføres i 2027.

Pumpebygningen ved Gasværksvej er i sin tid projekteret som kombineret indløbs- og ristebygværk til Hobro Renseanlæg samt centralt overløbsbygværk for hele Hobro. Funktionen som overløbsbygværk udbygget siden etableringen, mens de to andre funktioner er nedlagt, hvor kælderen hvor indløbspumperne var placeret, er ombygget til en dobbelt pumpestation, der pumper spildevand til Hobro Nord. Teknisk kan pumpehuset reduceres ca. 3 meter i højden, men det vil kræve at der findes en anden placering til hydroforbeholdere og nødgeneratoren.


MFK og private lodsejere i området, presser på for at bygningen kan reduceres i højden og i øvrigt forskønnes til omgivelserne. MFV har meddelt at vi vil se på at flytte det tekniske udstyr ved ombygningen, men ikke vil afholde omkostningerne til kosmetiske ombygninger af pumpestationen.

Assens – Spurvevej, afskærende ledning

I 2026 etableres afskærende ledning (vist med blå nedenunder) med henblik på at kunne sløjfe en pumpestation, der er udtjent, med dårlig driftsmæssig placering, ringe arbejdsmiljø og som stod overfor en større renovering. Området vist med gult står til separering i 2028-30.

Skitseprojekt for separering af området vist med gult nedenunder er sat i gang for dels at få fastlagt koter og ledningsdimensioner samt for at vurdere, om der med fordel også kan etableres regnvandssystem i cykelstien i indeværende projekt – så man ikke kommer til at grave 2 gange samme sted. Skitseprojektet indeholder også mulighed for at tage vejene Vibevej og Lærkevej med i separeringen, da det naturlige fald dels er mod nord og mod vest for disse 2 veje. Det vurderes også, om bassinet kan etableres som et nedsivningsbassin.

Se skitse næste side.

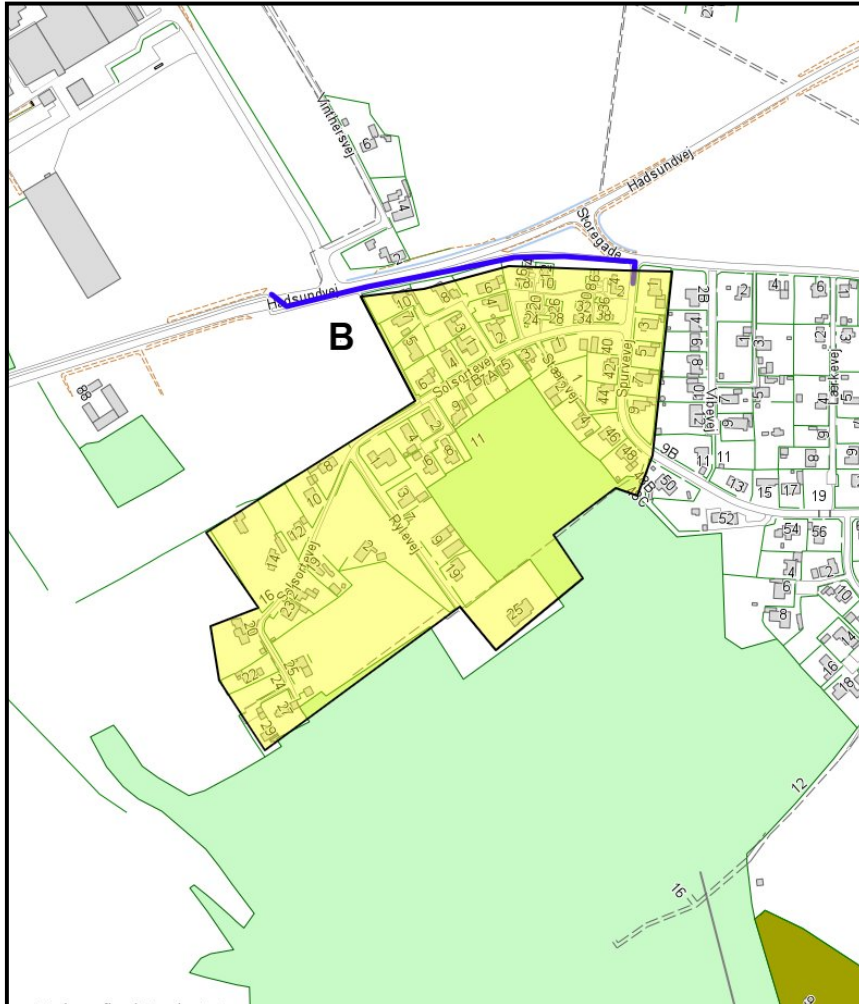

Mælkevejen, Oue, regnvandsbassin

I Oue gennemfører Mariagerfjord Kommune i 2026 et vandløbsrestaureringsprojekt i Oue Bæk. Forud for dette projekt etablerer MFV et regnvandsbassin/nedsivningsbassin – så regnvandet både forsinkes og renses inden udledning. I dag er der direkte regnvandsudløb fra byen til bækken. Bassintegninger og udformning er pt under udarbejdelse, ligesom der er god dialog med den lodsejer, som ejer det areal, som nedsivningsbassinet skal ligge på. Herefter skal der søges og gives landzonetilladelse før udbud og projekt kan gennemføres. Udførelse forventes sidst på året.


Arden Skole – regnvandsledninger

For et par år siden blev der etableret tidssvarende regnvandsledninger til håndtering af regnvandet i oplandet ved og omkring skolen. En del af planen var at udlede regnvandet til skov / moseområdet nord for skolen. Ejerforholdene er nu på plads for arealet og lodsejeraftale er indgået. Vi kan nu formelt ansøge om at udlede regnvandet til mosen, som jf. oplysninger fra kommunens naturafdeling – vil have godt af at få tilført vand. Der er afsat et mindre beløb til de sidste ledningsstrækninger i 2026.

Trykledning Norup - Assens

Trykledningen mellem Norup og Assens har været udsat for en hel del ledningsbrud de seneste år. Derfor arbejdes der i øjeblikket på et projekt, hvor ledningen fornyes, evt. placeres i et nyt tracé langs vejrabatten. I dag løber ledninger tværs over markarealer og jordstykker med juletræer. Vurdering af tracé samt anlægsøkonomi sker pt, men ledningen forventes fornyet/omlagt her i 2026. Og af 10 års anlægsplanen vil projektet nu fremgå til udførelse i 2026.

Enten omlægges ledningen ved cracking/relining i eksisterende tracé (vist med grønt), eller der etableres en ny ledning ved boring/gravning i vejarealet.

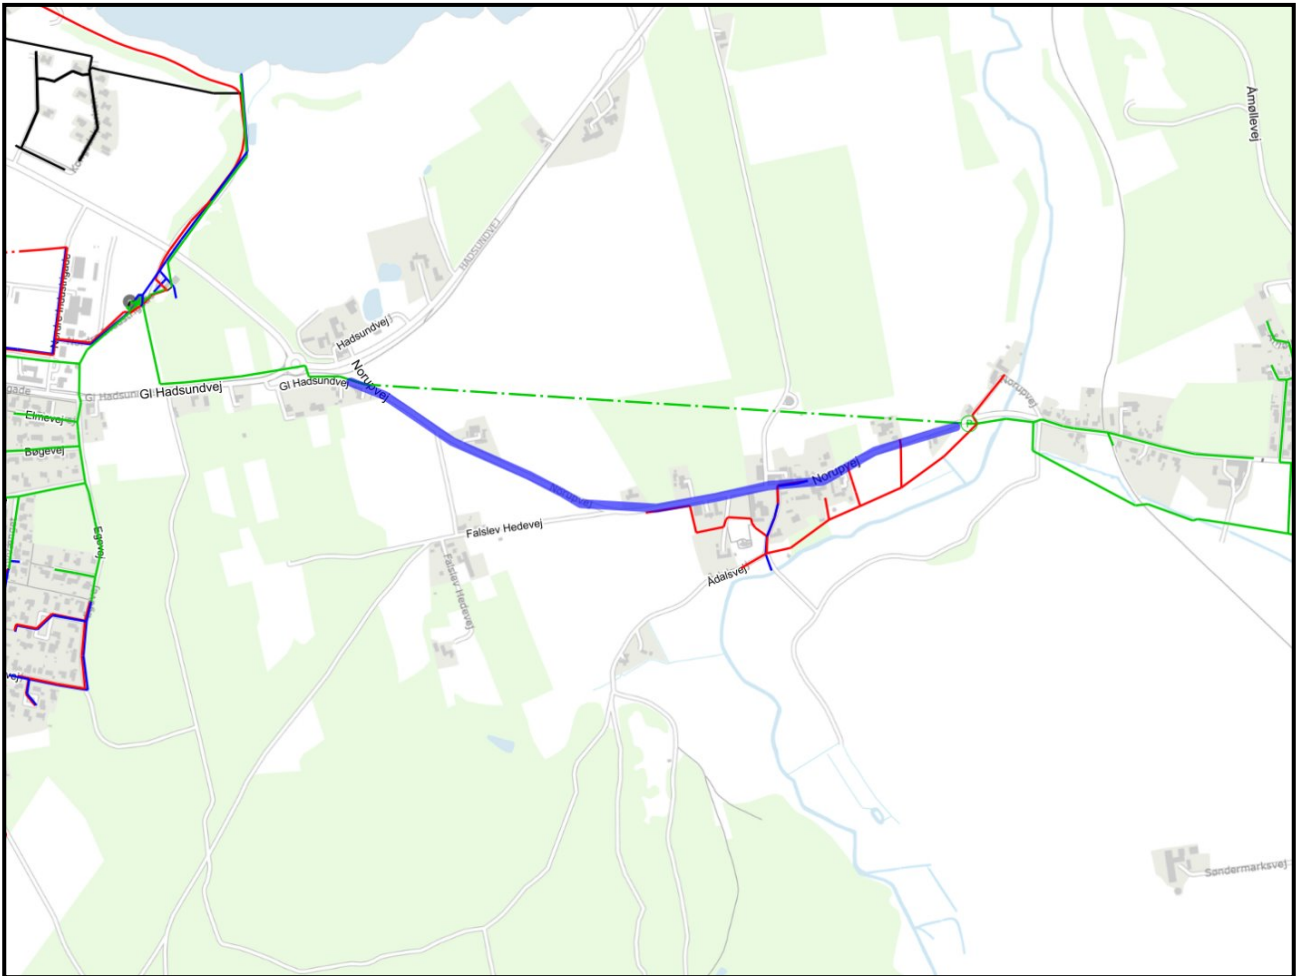

Skitseprojekter

I 2026 forventes der udarbejdet skitseprojekter for separering af den sidste del af Skjellerup, for Norup samt for separering af Ø. Doense. For oplandet omkring Ø. Doense (Vebbestrup og Bettebyen)) kigges der også på strukturen for det afskærende ledningssystem. Alle skitseprojekter gennemføres med henblik på at have systemløsninger klar til udførelse 2027 og frem.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**


Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Sommerhuskloakering syd for Als

Frem til og med 2030 gennemføres spildevandskloakering af sommerhusområdet syd for Als. I alt kloakeres ca. 1400 sommerhuse. Kloakeringen gennemføres med et såkaldt vakuumsystem, som også er etableret i Øster Hurup området.

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 er afsluttet. Systemet er i drift og sommerhusejerne har fået brev om at de kan slutte sig til det nye spildevandssystem, ligesom der er udsendt opkrævning på tilslutningsafgift.

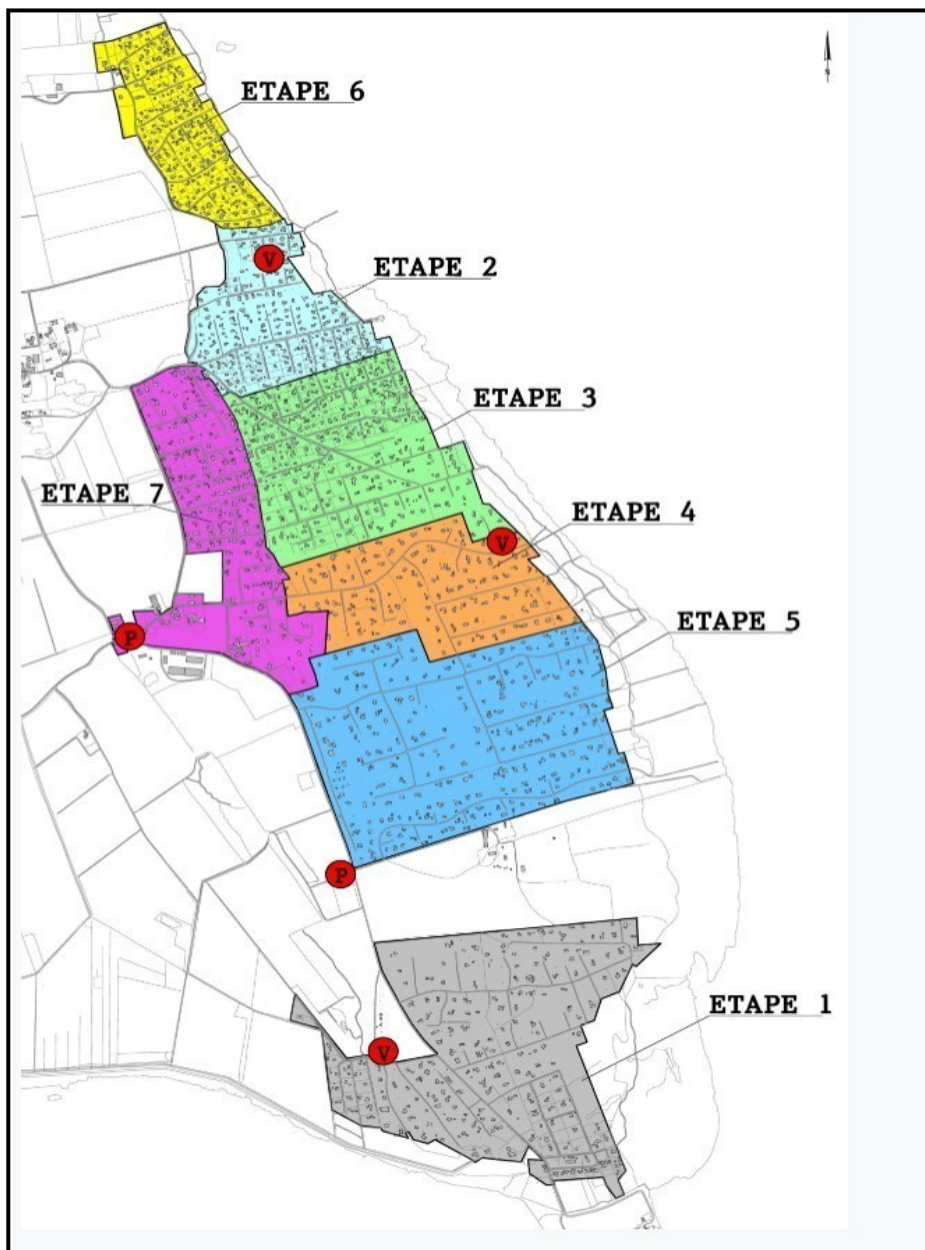

Etape 2 har været i licitation. Firmaet A/S Mortensen og Nymark var lavestbydende på projektet.

Arbejdet er startet op foregår lige nu i Korsikanerskov/lysevej. Efter sommerferien startes arbejdet med etablering af Vakuumstation. Der arbejdes ikke i juli og august måned.

Etape 2 omfatter spildevandskloakering til ca. 190 sommerhuse i området øst for Helberskov, og ventes at tage et års tid med afslutning til april 2027.



Etape 3, som er den sidste etape med etablering af en vakuumstation, forventes udført i 2027. Sommerhuskloakeringen fortsætter til og med 2030.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Status på udvidelse af kildeplads Skjellerup

Udførelsen af den anden prøveboring på den nye kildeplads går i gang primo juli, efter der er etableret adgangsvej i uge 25 - 27. Forventningen er stadig at der til efteråret er resultater på både grundvandskemi og vandføring, så en endelig konklusion vedr. potentialet af kildepladsen kan finde sted.

Primo 2027 forventes der anlæg af råvandsledning fra de nye boringer samt sideløbende færdiggørelse af boringshuse med styring og udstyr. Forventningen er at ombygningen af Skjellerup Vandværk påbegyndes ultimo 2027.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Budgetopfølgning pr. 30.04 2026

Budgetopfølgningerne 30.04.2026 for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) udviser fortsat en stabil udvikling for både VAND (bilag 1) og SPILDEVAND (bilag 2), hvor resultatet forventes at blive ca. 5 - 10% bedre end budgetteret. Det er primært indtægtssiden der forbedres, ved større solgte vandmængder og betalende spildevandsmængder. For spildevand gælder desuden at særbidraget er steget med over 20% i 2025, som for nuværende forventes videreført i 2026.

På indtægtssiden for SPILDEVAND, er der reguleringer for 2025 på ca. 2 millioner kr. som er et engangsbeløb. For VAND er der en divergens i indtægtsgrundlaget på omkring 0,4 millioner på årsbasis. Den forventes ændret i forbindelse med opkrævningen af anden aconto.

På driftssiden for SPILDEVAND er der et mindre forbrug på ca. 0,5 millioner kr., mens budgettet følges for VAND.

Samlet forventes et resultat i 2026 for SPILDEVAND som er 6 til 9 millioner kr. bedre end budgetteret. 2026 resultat for VAND forventes at følge budgettet.

Variationerne mellem budgetterede og realiserede omkostninger skyldes flere forhold, men for både VAND og SPILDEVAND skyldes den store ændring under posten Administrationsbidrag, den nye fordelingsberegning af fællesudgifterne i RenForM, således anlægssagerne og MAR betaler en stor del af fællesomkostningerne, som kommer MFV's drift til gode.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen gennemgås**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026

Anlægsoversigten er opdelt i de tre hovedområder: Drikkevand, (VAND) Spildevand (SPV) og Fællesrensning Himmerland (FH)., Hvert hovedområde er budgetmæssigt opdelt efter "Renovering", som dækker anlæg der egen finansieres af årets driftsindtægter og "Ny-anlæg" der som udgangspunkt forventes lånefinansieret. Omkostningerne reduceres med evt. tilslutningsbidrag, hvorefter netto omkostningerne fremkommer for hvert hovedområde. For FH er netto udgiften, når Rebild og Vesthimmerlands ejerandele er fratrasket.

Opdateret **netto**estimat på anlægsbudget for **2026** vurderes for **Vand, til 2,2 mio. kr.** for renovering og **4,8 mio. kr. for nyanlæg.** For **Spildevand vurderes 30,7 mio. kr.** for renovering og **80,6 mio. kr. for nyanlæg.** For MFV's andel af **FH vurderes 2,6 mio. kr.** for renovering og **4,7 mio. kr. for nyanlæg.**

Samlet giver det en **netto anlægsinvestering** på ca. 35,5 mio. kr. for renovering og **90,1 mio. kr. for nyanlæg i 2026**, som der skal være likviditet til at gennemføre.

I **netto** estimatet er det forudsat at Rebild og Vesthimmerland betaler 5,5 millioner kr. af FH's investeringer, og der opkræves 9,2 mio. kr. i tilslutningsbidrag for SPV og VAND.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af V60 bilag 1, 2 og 3. Nedenfor er redegjort for baggrunden for de enkelte budgetforskydninger, idet det bemærkes, at en stor del af forslag til korrektioner er redegjort for på sidste møde, men er gentaget her, så dagsordenspunkt og bilagsafsnit passer sammen.

VAND

For VAND er der, som redegjort for ved seneste bestyrelsesmøde, forskydninger i budgettet for projektet ved Vestergade, Korsgade m.fl. Dette skyldes projektændringen med, at der ikke skal etableres ledninger i Korsgade grundet forurening. Der er nu klarhed over omfanget af vandledningsarbejdet, som kommer til at omfatte fornyelse i del af Sdr. Allé, hele Søndergade samt Vestergade – I

Vestergade både transmission og distribution. Det betyder, at der i 2026 forventes behov for et budget på 2,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 3,4 mio. kr.

På Gammelvej i Hobro er der i 2026 foretaget mindre vandarbejder, herunder oprydning i stikforhold ved et par ejendomme, som delte fælles vandstik. Det har ikke tidligere været budgetlagt, og beløber sig til 0,2 mio. kr.

Ny kildeplads Skjellerup

Prøveboring forventes iværksat primo juli. Resultater heraf forventes først medio Q4.

Færdiggørelse af tavle og instrumentering ved boringen samt påbegyndelse af råvandsledning udskydes til 2027 – det medfører 2,4 mio. kr. overført til 2027.

SPILDEVAND

Ombygningen af det store regnvandsbassin ved Mariagervej/Jyllandsvej i Hobro er afsluttet. I forbindelse med afleveringen blev det besluttet at foretage mindre projektudvidelser, bl.a. betonfyldning af et par ledninger udenfor projektområdet, udskiftning af dæksler mm. resulterende i et behov for en budgetforøgelse på knap 0,3 mio. kr. (hvor rammen blev nedskrevet 0,2 mio. kr. ved sidste bestyrelsesmøde).

Omfanget af de arkæologiske undersøgelser i Rosengade i Mariager har været betydeligt større end forventet. Da projektet startede, var der skønsmæssigt afsat 1,0 mio. kr. til arkæologi, som nu vurderes at ende i ca. 3,0 mio. kr. – inkl. ekstraomkostninger for ventetid, når gravemaskinen holder stille. Samlet medfører det et behov for en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. – i forhold til udmeldingen på sidste bestyrelsesmøde.

Udgiften til færdiggørelse, opstart og indkøring af vakuumsystemet i sommerhuskloakering samt slutretableringen, etape 1 har haft et omfang større end forventet, hvilket medfører behov for forøgelse af budgettet med i alt 2,75 mio. kr.

Sommerhuskloakering etape 2. Som redegjort for ved sidste bestyrelsesmøde, var der behov for en budgetforøgelse efter afholdt licitation. Og indregnes erfaringerne fra den

første etape med den interne tid, resulterer det i budgetbehov på 20,5 mio. kr. i 2026 og 4,5 mio. kr. i 2027.

I Hobro har der været licitation på projektet ved Finlandsvej og det er nu startet op, og med 9 anlægsmåneder inkl. sommerferien resten af året vurderes fremdriften lidt mindre i 2026 og lidt mere i 2027. Samlet foreslås budgettet for 2026 nedskrevet med 1,0 mio. kr., som så til gengæld overføres til udførelse i 2027. I 2027 vil der yderligere være et behov for 2,0 mio. kr. så den samlede anlægsøkonomi ender på 24,5 mio. kr. for de 2 etaper i 2026 og 2027.

Grundet projektændring ved Vestergade i Hobro vurderes en mindre udgift på 3 mio. kr. i 2026. Samlet budget forventes uændret. Der er i overslaget indregnet udgifter til særlig afstivning ifm. gravearbejderne gennem Vestergade. Det er muligt, at arbejderne kan gennemføres med en mere enkel type afstivning.

Gammelvej projektet i Hobro vurderes at blive 0,4 mio. kr. dyrere, men ender måske billigere end her forudsat, hvilket skyldes at indtægter fra fælles retablering fra Hobro Varme og Mariagerfjord Kommune vil kunne indregnes i projektet.

Grundet forurening ved den påtænkte placering af ny udløbspumpestation / klimasikringspumpestation ved Havnegade i Hadsund, skal projektet revurderes og pumpestation og nyt udløb til fjorden skal flyttes. Anlægsøkonomien forskydes derfor til næste år – dog afsættes beløb til en midlertidig løsning, så risikoen for kælderopstuvning ved Strandvej reduceres.

Endelig er der en ikke budgetlagt omkostning på knap 1,0 mio. kr. til bassin ved Viborg Landevej i Sdr. Onsild. Det skyldes at slutregningen først, mod forventning, blev konteret i 2026.

Renovering pumpestation Gasværksvej

En forestående renovering af hovedpumpestationen Gasværksvej må udskydes på grund ressourceknaphed og samtidighed af øvrige projekter. En undersøgelse af

potentielle muligheder forventes dog iværksat i Q4. Herfor foreslås 2,3 mio. kr. overført til 2027 budget.

Renovering pumpestation Andrupvej/Randersvej

En forestående renovering af de to pumpestationer Andrupvej og Randersvej må udskydes på grund ressourceknaphed og samtidig af øvrige projekter. En undersøgelse af potentielle muligheder forventes dog iværksat i Q4. Herfor foreslås 0,8 mio. kr. overført til 2027 budget.

FÆLLESRENSNING HIMMERLAND (FH)

Der er en mindre korrektion på ca. 0,5 millioner kr.

Direktionen indstiller:

- **At opdateret nettoanlægsbudget for nyanlæg, for Vand på 4,8 mio. kr., nyanlæg for Spildevand på 80,6 mio. kr. og nyanlæg for FH på 4,7 mio. kr. godkendes - samlet opdateret nyanlæg i 2026 på 90,1 mio. kr.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år

10-årsplanen er udtryk for MFVs vurdering af behov for anlægsarbejder de kommende 10 år. Planen justeres løbende, når der opstår ændringer i planen. Planen bruges som udgangspunkt for budgetlægningen af anlægsprojekter i MFV og bliver hvert år ført over i en anlægsplan for det kommende budget år, som gennemgået under pkt. 16.

Nedenfor er oplistet de projekter, hvor der er justeringer i økonomien i forhold til den aktuelle fremdrift og licitationsresultater.

På projekt Finlandsvej, Sverigesvej, Kirkedals Allé er det sket en forskydning mellem budgetbehov i 2026 og 2027, se også dagsordenspunktet om forslag til korrektioner af anlægsbudget for 2026.

Grundet forurening og deraf følgende projektændring er der også her sket en budgetforskydning mellem 2026 og 2027, så der bruges mindre i 2026 og mere i 2027.

Projekt Havnegade, Hadsund Udløbspumpestation. En stor del af økonomien er flyttet til udførelse næste år, da pumpestationen skal have anden placering, også her grundet kraftig jord- og grundvandsforurening.

På Rosengadeprojektet i Mariager er 2026 økonomien opjusteret for 2026 som redegjort for under andet dagsordenspunkt.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 til fornyelse af trykledningen mellem Norup og Assens, nyt projekt grundet mange brud på trykledningen den seneste tid.

Stort set hele anlægsøkonomien for Holmgaard separering er flyttet til 2027, da der ikke er klarhed over bassin type / udformning og placering.

Økonomien for sommerhuskloakering, etape 1, 2 og 3 er tilpasset de forhold, der er omtalt under andet dagsordenspunkt.

På VAND er økonomien for vandprojektet på Vestergade, V. Allé m.fl. tilpasset efter projektændring.

Fordeling af udgifter på den nye kildeplads i Skjellerup er tilpasset jf. redegørelse om forslag til budgetkorrektioner for 2026.

Direktionen indstiller:

- **At nærværende 10-årsplan anvendes som grundlag for MFV's fremtidige investeringer.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Eventuelt

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Intet at bemærke

Næste møde

Mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RenForM og MFV.

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Taget til efterretning

Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

- V 47 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)
- V 48 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
- V 49 - Bestyrelsestur (Åben)
- V 50 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 51 - Ud- og overløbsregistrering af overløbssystemet (Åben)
- V 52 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)
- V 53 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)
- V 54 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)
- V 55 - Separatkloakering og klimatilpasning øvrige opland (Åben)
- V 56 - Sommerhuskloakering (Åben)
- V 57 - Status - udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)
- V 58 - Opgradering af kommunikation med SCADA-systemet (SRO) - (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 59 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2026 (Åben)
- V 60 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026 (Åben)
- V 61 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2026 (Åben)
- V 62 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 63 - Eventuelt (Åben)
- V 64 - Næste møde (Åben)
- V 65 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)
- V 66 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne V 50, V 58, V 62 og V 66 holdes som lukket.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt
