

REFERAT Mariagerfjord Vand A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 27-10-2025

Mødedato Mandag d. 27. oktober 2025 kl. 18:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

V 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer.....	3
V 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
V 60 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund.....	9
V 61 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro.....	14
V 62 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager.....	21
V 63 - Sommerhuskloakering.....	24
V 64 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads.....	28
Lukket.....	30
Lukket.....	31
V 67 - Budgetopfølgning pr. 30.09. 2025.....	32
V 68 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025.....	34
V 69 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 20%	38
Lukket.....	40
Lukket.....	41
V 72 - Eventuelt.....	42
V 73 - Næste møde.....	44
V 74 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	46
Lukket.....	49

Punkt 1: V 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer

Det er første møde med ændret møderækkefølge, således der umiddelbart før nærværende møde er afholdt bestyrelsesmøder i MAR og RenForM.

Det bliver også den første møderække hvor godkendelse af referatet skal godkendes elektronisk.

På baggrund af ovennævnte er der udført tilretninger i Forretningsordenen, der behandles under særskilt punkt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Orienteringen blev taget til efterretning

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med at anførte bilag til relevante punkter ikke er medsendt dagsordenen, og forventer at dette ikke vil ske fremover.

**Punkt 2: V 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført
protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet 10. september 2025 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 25. september 2025.

Fra og med nærværende møde, vil godkendelse af referater skulle ske elektronisk via First Agenda. Der er op til 14 dage at godkende referatet i, efter det er udsendt.

På næstkommende møde vil det blive indført at referatet fra nærværende møde er godkendt.

Hvis der er kommet indsigelse mod referatet, vil indsigelsen blive behandlet under nærværende punkt, på det efterfølgende møde.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Referat blev underskrevet.

Ny procedure for online godkendelse af referat blev godkendt, derfor tilføjes der et punkt, der er lukket.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: V 60 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund

Hadsund

Fjordgade og Koldbæksgade - separatkløkering

Anlægsarbejdet er afsluttet. Klimasikringspumpestationen ved Munchs Eng er driftsklar, mens ombygningen af pumpestationen i Fjordgade pågår og vil være afsluttet i oktober. Tilbage mangler økonomiafslutning og afleveringsforretning med entreprenøren.




Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkløkering

Projekt Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade har stået til opstart her i efteråret 2025. Udfordringer med at finde skurplads/plads til jorddepot samt en projektændring medfører, at opstarten rykkes til januar 2026. Licitationen forventes afholdt i december 2025.

Projektændringen omfatter ombygning af eksisterende bassin på 1000 m³, med etablering af overløbsfunktion i bassinet, for de fælleskløkerede områder der ikke

separatkloakeres i 2026 – 2027. samtidig etableres der styring fra øvrige overløbsbygværker, så der ikke vil ske overløb fra det afskærende ledningssystem. Ændringen vurderes billigere og bedre end den først planlagte.

Arbejdet påtænkes udført i 2 etaper – skitseret med blå hhv. rød markering på skitsen nedenfor. Første etape er den blå etape, som omfatter de ejendomme, som også har været udfordret af kælderopstuvninger. Etape 1 forventes udført i 2026, etape 2 i 2027. Det er etape 1, der sendes i udbud her i 2025.

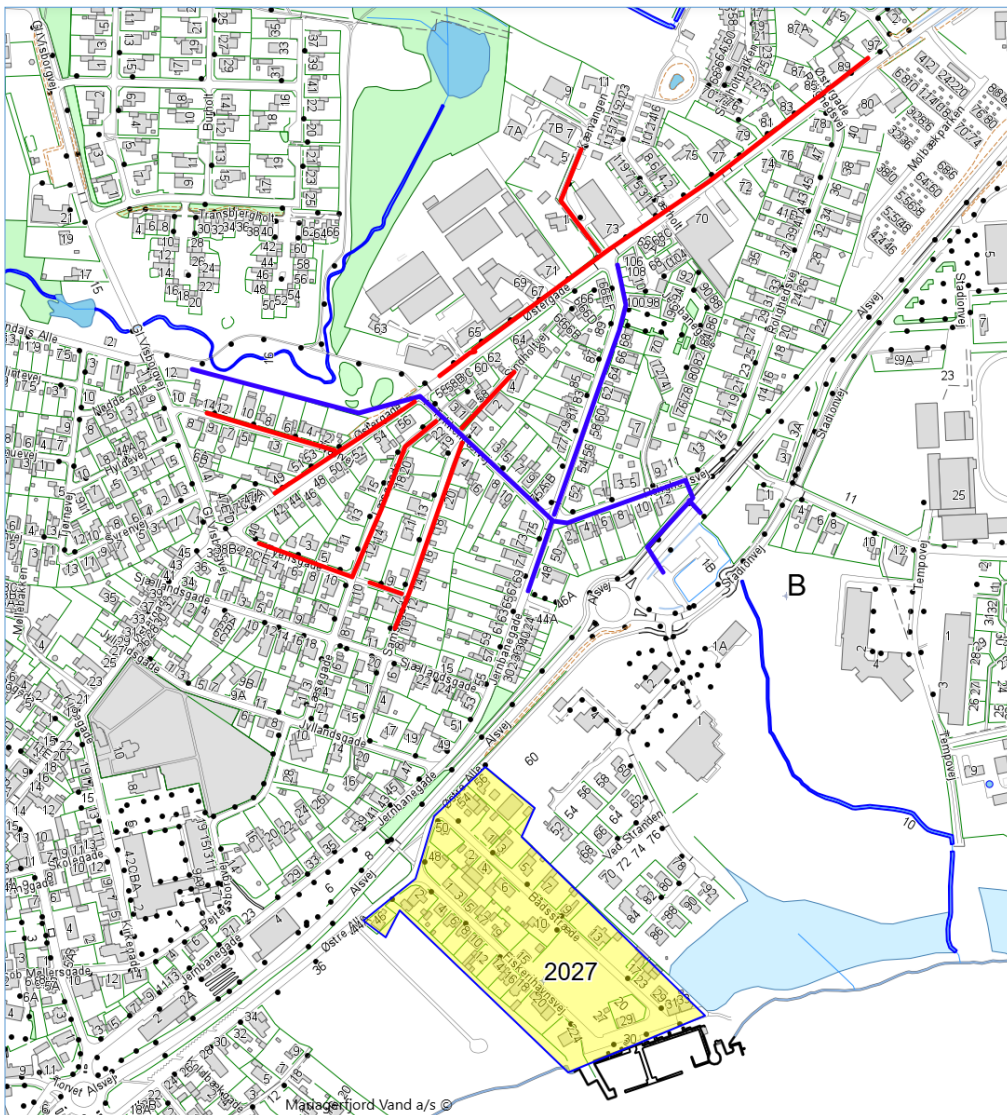


Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2027 forventes Fiskerihavnsvej og Bådsstræde separatkloakeret, begge fjordnære områder med nye regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. Området umiddelbart øst for, forventes klimasikret i samme forbindelse. I 2026 udarbejdes skitseprojekt, hvor der er fokus på minimering af gravedybden. Området er vist med gult ovenfor.

Regnvandspumpestation Havnegade

Vest for broen ved Havnegade i Hadsund etableres der en ny regnvandspumpestation – en pumpestation, som, mens området stadig er fælleskloakeret, skal hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen, som dimensioneres til at være den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring, forventes etableret primo 2026. Det har tidligere været forventningen med opstart ultimo 2025, men især forhold omkring gennemføring af spunsen med ledninger har tidsmæssigt været mere omfangsrig end tidligere antaget. Pumpestationen vil være af samme type, som er etableret ved havnen i Mariager.

Placering af udløbspumpestation samt angivelse af lavtliggende område til separering er vist nedenfor.

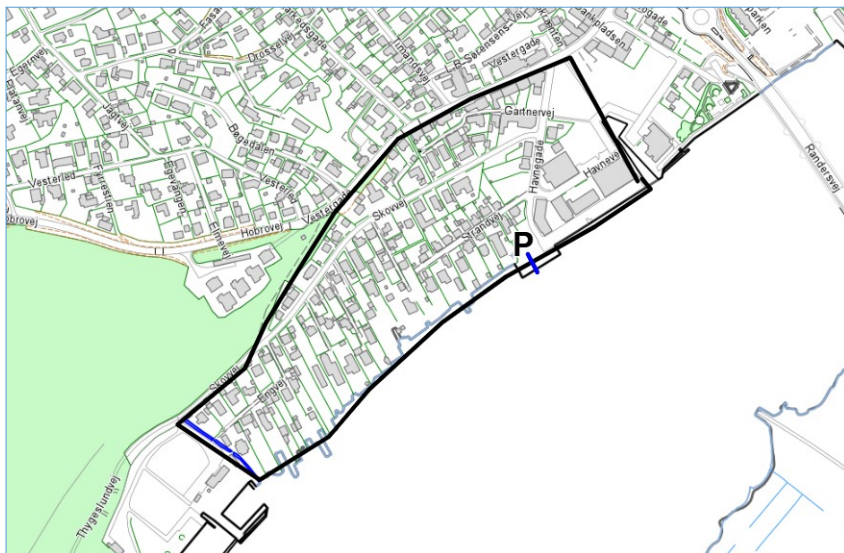


Pejtersborgvej

På seneste møde er Bestyrelsen orienteret om et mindre projekt med etablering af nye hovedledninger over privat areal – etableret ved styret underboring. Aktuelt er

projektering i gang og der har været afholdt borgermøde med de involverede ejendomme, som skal have ledningsanlæg placeret på deres matrikler.

Det er forventningen, at lodsejerforholdene falder på plads, og at ledningsanlæggene kan etableres sidst på året, se skitse nedenfor.

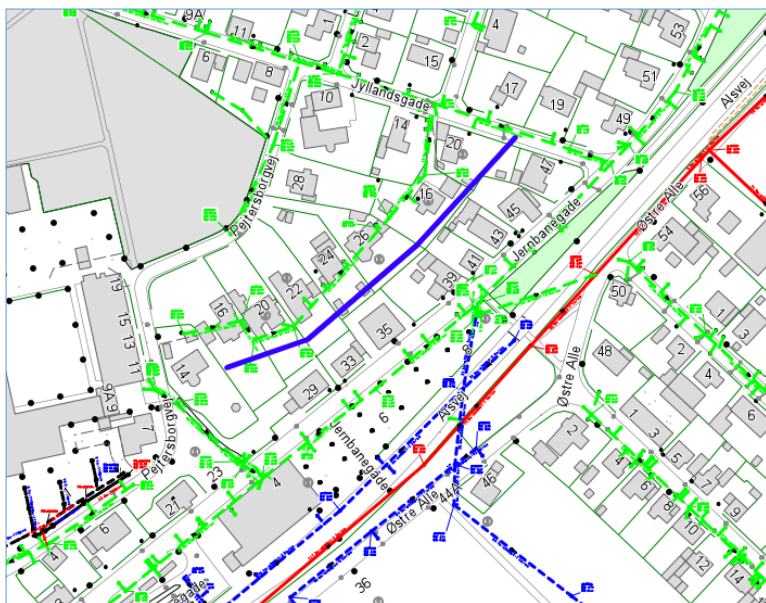

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt


Punkt 6: V 61 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Hobro syd

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er afsluttet.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er også afsluttet.

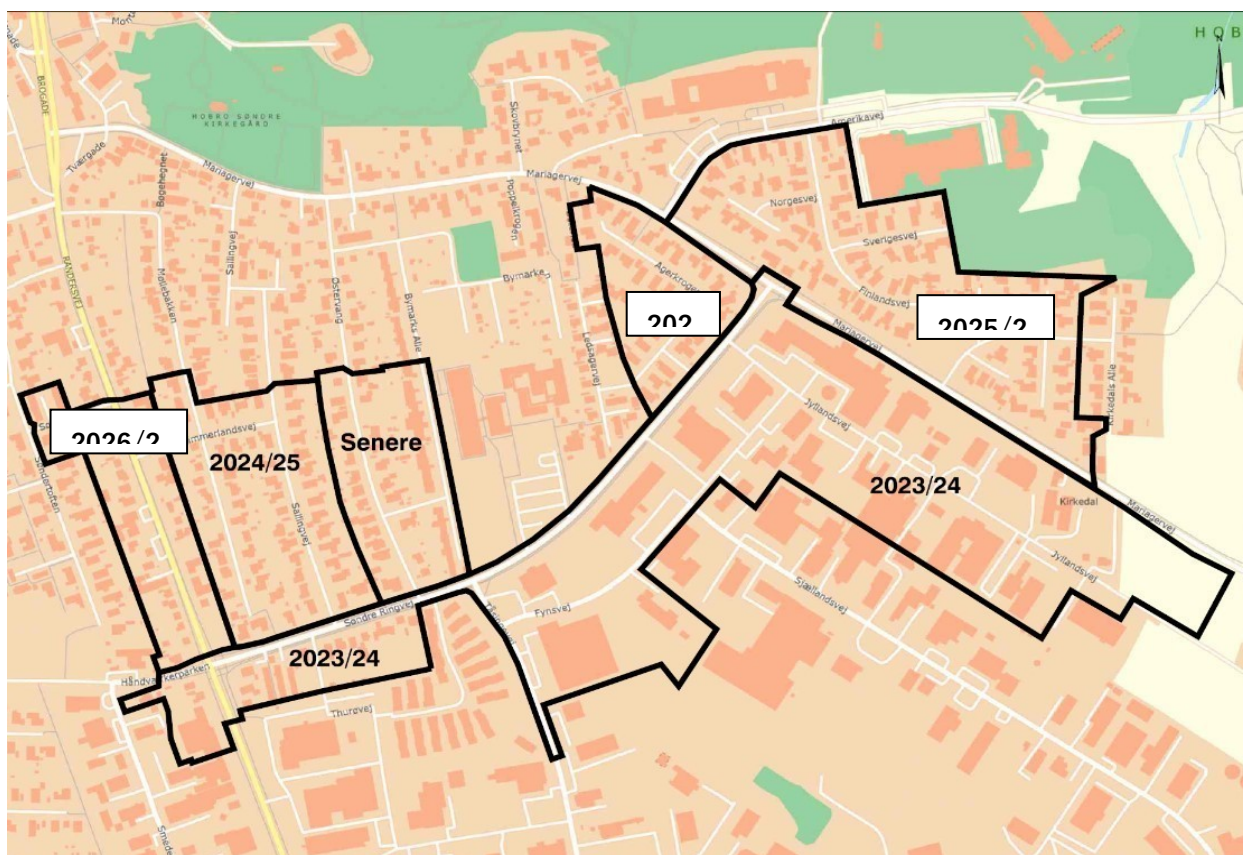


Koordineringsarbejdet i projekt Randersvej har pågået her i 2025. Kommunens vejprojekt integreres i ledningsprojektet, hvor ledningsplacering har været fastlagt et stykke tid. Der er holdt licitation på projektet den 18/9 2025, og kontrahering afventer behandling i byrådet vedr. vejprojektet, herunder de økonomiske rammer. Hvis byrådet godkender vejprojektet og økonomien herfor, vil arbejdet foregå fra januar 2026 til april 2027. Trafikken forventes opretholdt i 2 spor, mens arbejdet gennemføres.

I Norgesvej, Finlandsvej og Kirkedals Allé m.fl. gennemføres separatvloakeringen over 2 år og starter forventet i december måned 2025. Projektet vil starte med etablering af ny regnvandsledning fra bassinet på Jyllandsvej til Kirkedals Allé. Projektet sendes i udbud sidst i oktober, licitation i november og opstart december.

Bassiner

Som et led i separatvloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Forventningen er, at der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd – bassiner, hvis placering og størrelse er afstemt med vandløbs-, spildevands, og naturmyndigheder hos MFK.

- Ombygning af eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra et tørt til vådt bassin
- Etablering af vådt bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej
- Etablering af vådt bassin i slugten øst for Kirkedals Allé, samt
- Etablering af tørt og vådt bassin ved Amerikavej, øst for Kirkedals bækken.

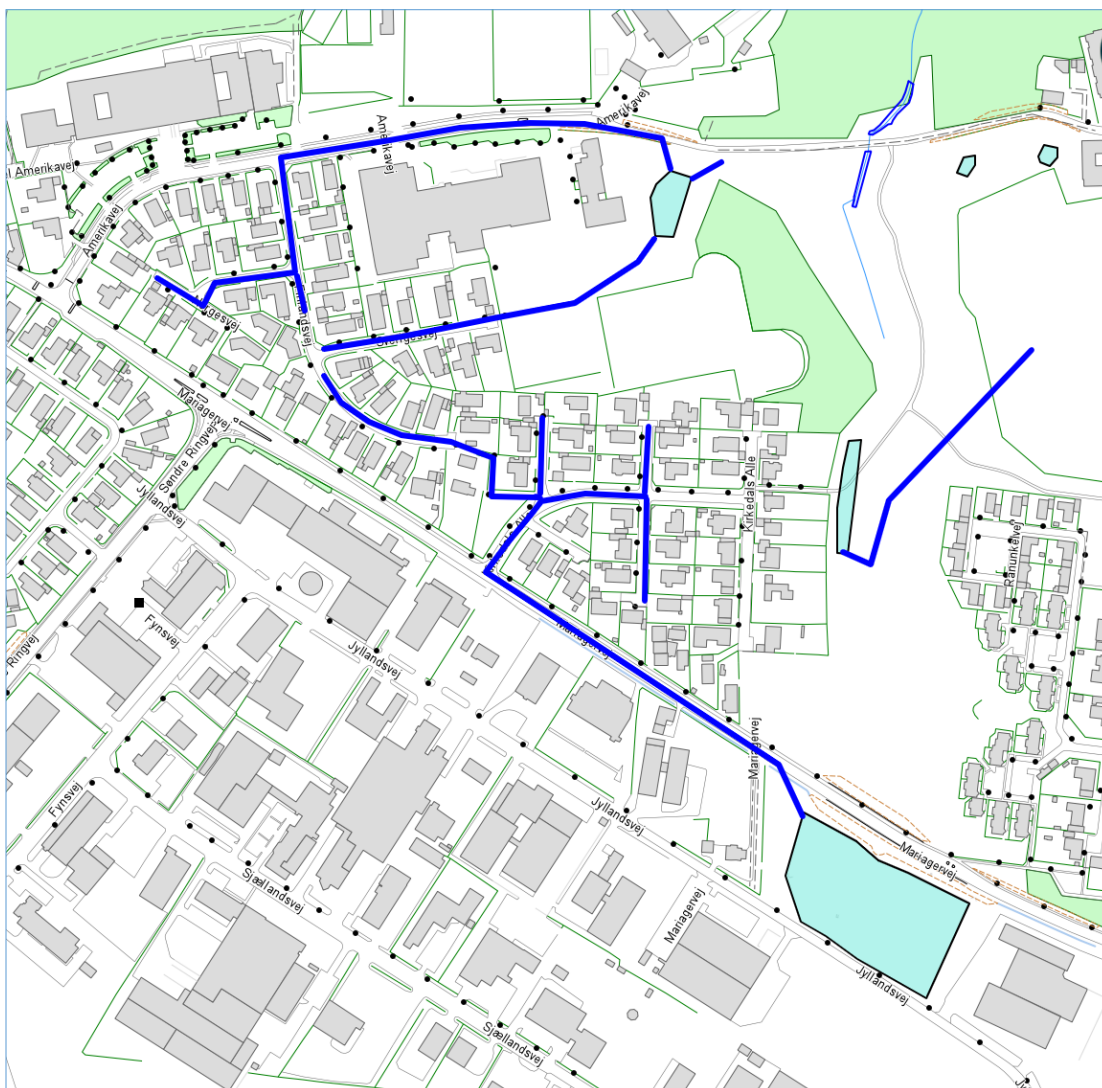

Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin forventes udført i perioden november 2025 – februar 2026, mens bassinerne i slugten, bag vandrehjemmet og ved Amerikvej forventes etableret i 2026.

Øvrige projekter i Hobro

I Hobro – i den nordvestlige del – er der gennemført separering af Løgstørvej og Ølsvej. I projektet separeres den sidste del af området, hvorved et eksisterende overløbsbygværk kan sløjfes – når borgerne har separeret internt på deres ejendom. Anlægsarbejdet er afsluttet.

På Gammelvej i Hobro gennemføres separering for at reducere regnvandsbelastningen på det lavtliggende spildevandssystem i byen. I dag ledes fællesvand uforsinket på

spildevandssystemet. Samtidig med separering forlægges og renoveres vandedningerne i vejen. Arbejdet pågår og afsluttes primo 2026. For at opnå fuld separering fra de ejendomme, der i dag leder fællesvand til det separate spildevandssystem forventes gennemført en mindre projektudvidelse, vist med stiplede linje nedenfor.


Dels forventes boret en ekstra ledning i en sti for at fange et allerede separeret område mens ejendommene Frihedsvej 5 og 7 også tages med. Projektet inkl. udvidelsen vil have positiv effekt på belastningen af det allerede separerede og lavtliggende spildevandssystem i Hobro.



I forbindelse med måleprogrammet DRYP i Hobro, for at reducere tilledningen af uvedkommende og overfladevand til kloaksystemet, er det konstateret at der sker uforholdsmæssig tilledning til spildevandssystemet ved Skovvej, umiddelbart op ad

Brogade. Der er sat undersøgelser i gang om de virkelige tilslutninger og der vil blive etableret de nødvendige vandbremsere, for at reducere tilledningen.

På Hadsundvej sættes der nu gang i projekteringen af en større og dybere beliggende regnvandsledning for dels at skabe kapacitet i regnvandsystemet, samt at muliggøre afledning af regnvand fra flere store matrikler, hvor det ikke er muligt i dag – herunder at vende afledningen fra et delområde af Lupinvej til Hadsundvej. Ledningen er budgetteret til udførelse i 2026.

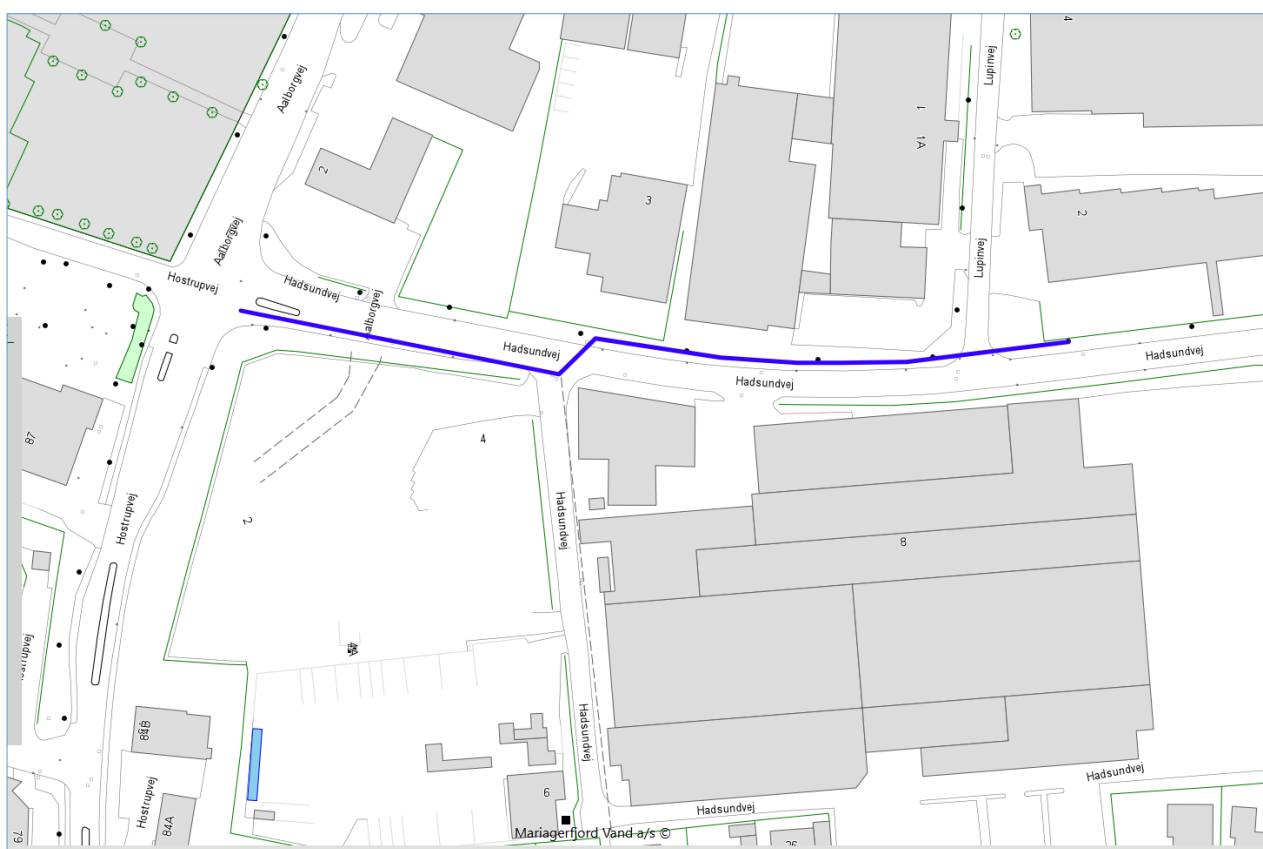

I 2026-2027 forventes arbejdet med separering af området ved og omkring Vestergade / V. Allé udført. Projektet er ud over separeringen også en forberedelse til fremtidig byudvikling i den sydlige og vestlige del af Hobro ved Fyrkat Engso.


Projektet sendes i udbud her i efteråret 2025 – se skitse næste side

Punkt 7: V 62 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

I den 1. etape er der etableret en regnvandspumpestation på havnen, og overløbsbygværket er renoveret til tidssvarende forhold (arbejdsmiljø, drift og overvågning).

Etape 2 omfatter separatkloakering af Rosengade, Havnevej, Havnegyden samt den vestlige del af Havnegade. Se skitse nedenfor, hvor det bemærkes, at pilene er graveretningen (modsat strømningsretningen). Ledninger er udført i Havnevej og pågår i Havnegyden. Endvidere graves der også i Fjordgade, hvor der pt. er ensrettet kørsel samt omkørsel via havnearealet. Arbejdet i Fjordgade går godt, og vejen forventes asfalteret og genåbnet i starten af december. Dog har MFK erfaret at de har et regnvandssystem i meget dårlig forfatning i Fjordgade, hvor der pågår en afklaring af, om det skal fornyes af MFVs entreprenør. Projektet fortsættes og afsluttes i 2026.

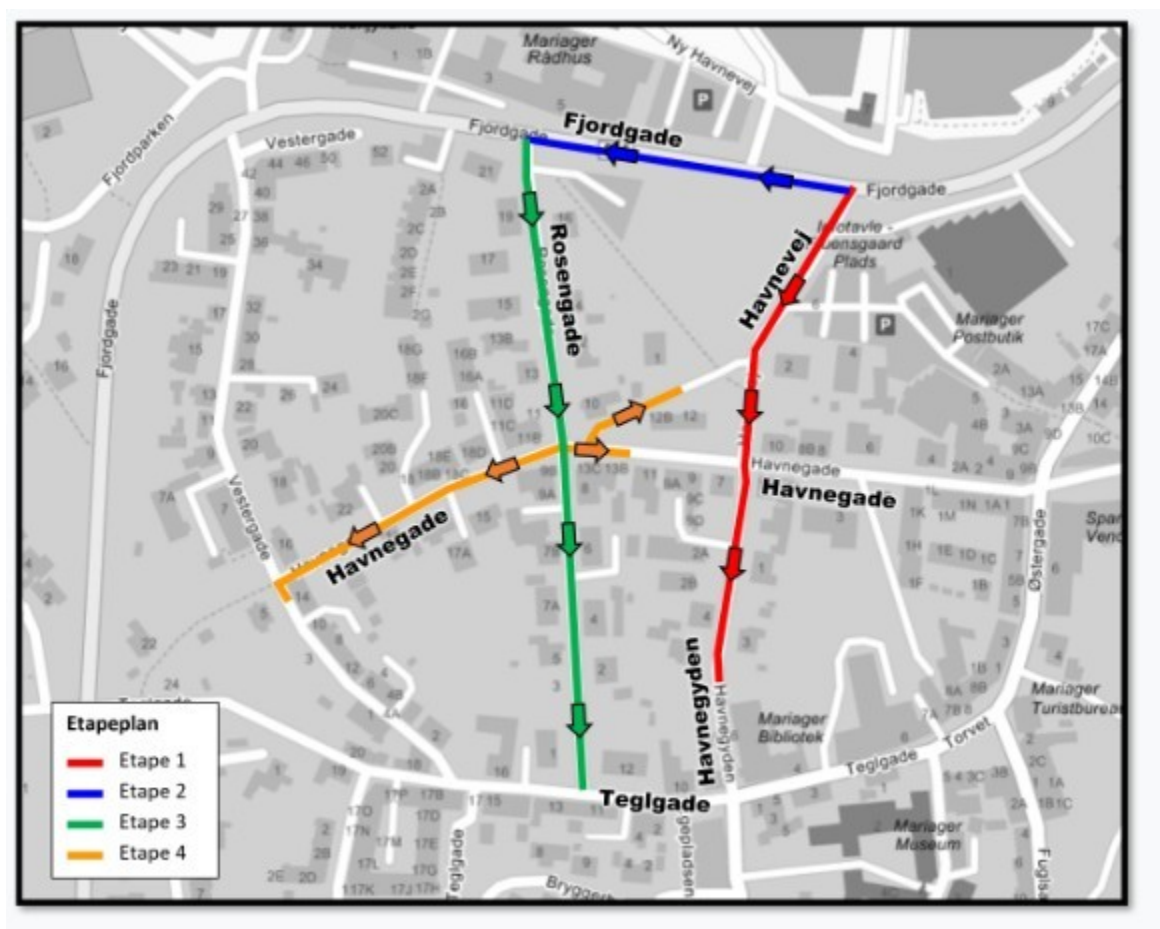

Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029. Næste etape er Separering i Teglgade, Egepladsen Kirkegyden m.fl., hvor projekteringen skal til at starte op, med forventet udførelse i 2027.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**


Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt 8: V 63 - Sommerhuskloakering

Sommerhuskloakering syd for Als

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 har ligget stille i juli og august for at tage hensyn til områdets benyttelse. Arbejdet er startet op igen 1. september og fortsætter frem til februar 2026.

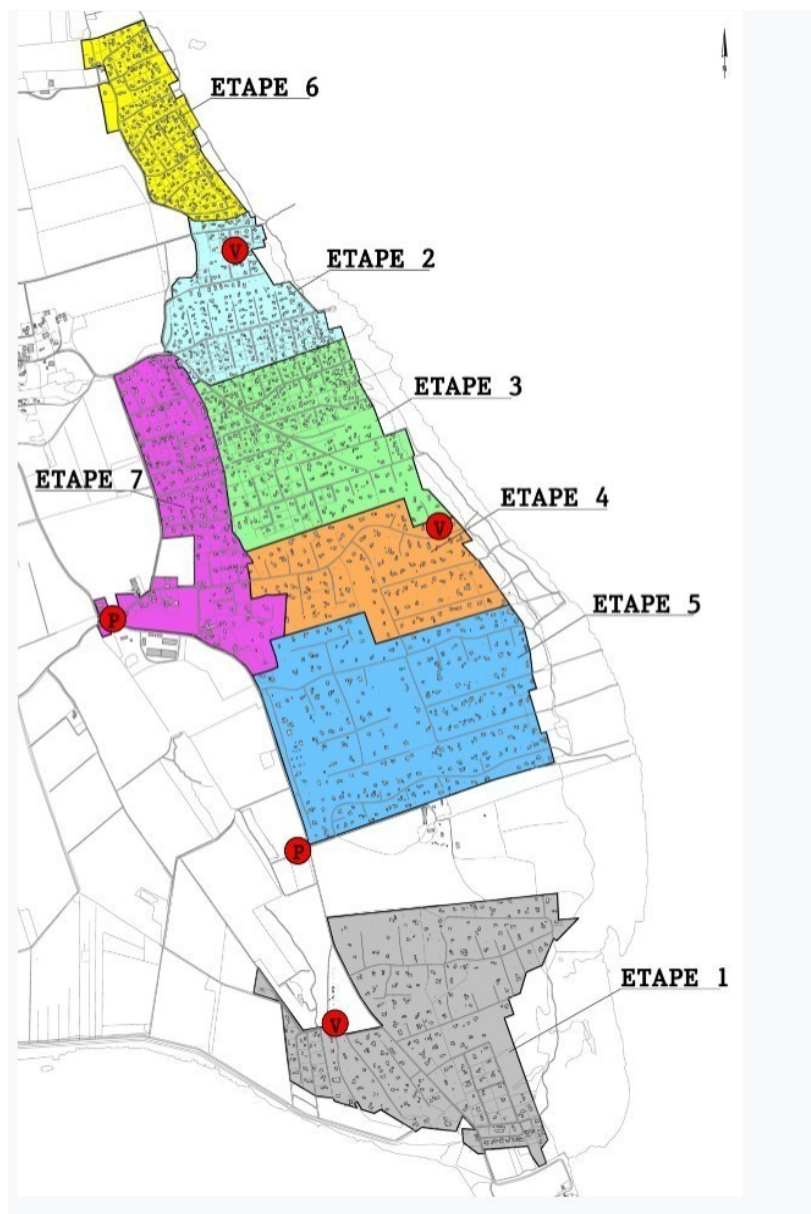

Entreprenøren har god fremdrift og der graves med flere gravehold. På skitsen næste side ses stade i uge 41, hvor de fuldt optrukne linjer er udført, mens de stillede mangler at blive udført. Det er forventningen at entreprenøren når i mål til februar næste år.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
27. oktober 2025:**

Indstillingen godkendt

Punkt 9: V 64 - Udbygning Skjellerup Vandværk inkl. ny kildeplads

Bilag

Punkt V 64, Bilag 1_Skjellerup Vandværk - ny risikovurdering september 2025

MFK har afgjort, efter der er udført en ny risikovurdering (se bilag), at det ikke er nødvendigt at udfører BNBO-arealer ved de tre eksisterende boringer for Skjellerup Vandværk, således den normale 25 meters beskyttelse vil være gældende.

Ovennævnte betyder at MFV har bedt Niras udføre den samme risikovurdering for den første udførte boring, da en etablering uden nødvendig BNBO-sikring og uden at gå på kompromis med drikkevandssikkerheden, er en stor hjælp for placeringen af nye boringer og letter dialogen med lodsejerne. Samtidig ligger der også en forholdsvis stor økonomisk besparelse i ikke at skulle etablere BNBO-areal.

Der har trukket ud med at få de sidste godkendelser til boring 2, og den forventes først etableret og godkendt til indvinding, sammen med boring 1, i første halvår af 2026.

Når boringerne er udført og godkendt til indvinding, etableres der råvandsledning til Skjellerup Vandværk. Råvandsledningen forventes påbegyndt etableret ultimo 2026.

Udbygningen af Skjellerup Vandværk forventes påbegyndt i 2027.

Direktionen indstiller:

- **At det godkendes at der ikke udføres BNBO-beskyttelse ved eksisterende boringer ved Skjellerup Vandværk.**
- **At de nye boringer ved Skjellerup også udføres uden BNBO-beskyttelse hvis muligt.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: V 67 - Budgetopfølgning pr. 30.09. 2025

Bilag

V67 bilag 1 - Resultat VAND 30-09-2025_NY_12-11-2025

V67 bilag 2 - Resultat SPV 30-09-2025_NY_12-11-2025

Budgetopfølgningen 30.09.2025 for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) vil først blive udsendt umiddelbart før mødet og vil blive gennemgået der.

Der har indtil medio oktober været et meget lavt antal vandbrud og spildevandshavarier i 2025, således reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne holdes på et lavt leje, under det budgetterede i 2025.

For HLR følges driftsbudgettet meget fint og årets lave vandmængde, er medvirkende til at gøre MFVs resultat bedre, da den lave vandmængde øger betalingen i særbidrag og betalingen fra RVS og VHV.

Samlet forventes fortsat et resultat i 2025 som budgetteret eller lidt bedre.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen gennemgås**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Bilag 1 og 2 blev udleveret ved start af punktet.

Punktet blev først taget efter pkt. 68.

Punktet tages op ved næste møde med regulerede mængder.

**Punkt 13: V 68 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget
2025**

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025

Fra nærværende møde vil anlægsoversigten være opdelt i tre områder: Drikkevand, Spildevand og Fællesrensning Himmerland (FH). Ændringen giver en klar opdeling af brutto og netto udgifterne for hvert område. For FH er netto udgiften, når Rebild og Vesthimmerlands andel er fratrukket.

Opdateret estimat på anlægsbudgettet pr. 15.10.2025 vurderes for **Vand til brutto 3,7 mio. kr. og netto 3,1 mio. kr.** For **Spildevand til brutto 78,3 mio. kr. og netto 74,8 mio. kr.** For **FH til brutto 6,0 mio. kr. og netto 3,6 mio. kr.** Samlet giver det en brutto anlægsinvestering på ca. 88 mio. kr. i 2025, som der skal være likviditet til at gennemfører. Netto udgiften forventes at lande på 81,5 mio. kr.

Tidligere estimeret netto anlægsbudget pr. 04.06.2025 var på 4,6 mio. kr. for Vand og 106,7 mio. kr. for Spildevand og 3,8 mio. kr. for FH.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af bilag 1. Nedenfor er redegjort for baggrunden for de enkelte budgetforskydninger:

VAND

For VAND er budgettet for Møllebakken og Sallingvej forhøjet. Det skyldes en projektudvidelse, hvor VAND har udskiftet dårlige anboringsbøjler (stiktilslutninger på hovedledningen) på både Møllebakken og Sallingvej, forud og i forbindelse med kommunal renovering af fortove i området og nord for fællesprojektet ved Møllebakken / Sallingvej.

SPIILDEVAND

Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt licitation på projektet ved Gammelvej i Hobro. Budget 2025 er tilpasset licitationsresultatet, som var en smule dyrere end forventet. Arbejdet er i gang og vil fortsætte i 2026, bl.a. på grund af en projektudvidelse, som vurderes at beløbe sig til kr. 0,8 mio. kr.

Projekt separatkloakering af Tykkenkærvej og Jernbanegade i Hadsund forventes at starte i januar 2026. Siden udfordringerne med at skaffe en byggeplads / jorddepot og få tilladelse hertil, har MFV revurderet projektet med randbetingelser for hvor meget vand, der skal løbe igennem området i ”en 3. ledning” fra det opstrøms og højt beliggende område ved Aalborgvej m.fl. Samtidig er der optimeret på gravedybder i området. Samlet betyder det, at vi kan holde licitationen i 2025 og starte op først i 2026. Forsinkelsen medfører en mindredgift i 2025 med en tilsvarende merudgift i 2026.

På den anden side af broen i Hadsund skal der etableres en regnvandspumpestation ved Havnegade. En pumpestation, som her og nu skal fungere som en hjælp til at pumpe overløbsvand ud i fjorden ved høj vandstand og kraftig regn, men som fremover skal være regnvandspumpestation til klimasikring. Det tager lidt tid at få klarhed og tilladelse til gennembrydning af havnespunsen. Opstarten er derfor rykket til primo 2026, med en tilsvarende overflytning af projektøkonomien.

I Oue er MFV pålagt at etablere et regnvandsbassin forud for en vandløbsrestauration af Oue bæk. Der har været dialog med Oue Varmeværk om erhvervelse af areal til forbassin, men denne dialog har endnu ikke båret frugt. I stedet ses der på en alternativ placering, hvor alene én lodsejer berøres. Som med alle andre regnvandsbassiner er det kompliceret at finde areal og få tilladelser til disse – således også i Oue. Det er derfor bedste bud, at projekt, lodsejeraftale og myndighedsbehandling kan afsluttes i 2025/primo 2026, med udførelse i Q2 2026.

Ved Ny Blåkilde har MFV leveret vandforsyning og kloakforsyning til et nyt boligområde. Tilslutningen af spildevand til MFV's eksisterende kloaksystem har været mere kompliceret end forventet, eftersom flere af de større ledninger i området står på pæle og betonplade, hvilket har umuliggjort at komme ned til den dybere liggende spildevandsledning (boret ledning). Det har således været nødvendigt at etablere en ekstra strækning til spildevand, hvilket har medført en meromkostning. Yderligere fandt vi så et større fundament/tank fra det gamle renseanlæg, som yderligere vanskeliggjorde arbejdet.

Fællesrensning Himmerland (FH)

Der er i 2025 afsat økonomi til etablering af en ny centrifuge (slutafvander) på renseanlægget. I løbet af efteråret er der gennemført forundersøgelser, udbud og testkørsler med forskellige leverandører, og valg af leverandør forventes afklaret i 2025. Selve levering og installation vil dog først kunne ske i 2026.

Der forventes at de afsatte 600.000 kr. i 2025 forventes anvendt fuldt ud og der er afsat 3.500.000 kr. i 2026 til projektet.

Langs det afskærende system fra Aars til HLR, arbejdes der fortsat med lugtbegrænsende tiltag, således der i 2026 kan etableres blivende løsning. I den forbindelse har der ved Hobro Nord vist sig at der opbygges et meget stort flydelag (ca. 2 måneder fra det bliver fjernet til der er et nyt opbygget) som er medvirkende til lugtudvikling og giver en dårlig drift af pumpeumpen. På den baggrund er det nødvendigt at etablere noget nyt opblandingsmateriel samtidig med at det eksisterende skal renoveres, hvilket sker ved udskiftning. Ændringerne beløber sig til ca. 200.000 kr., som forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for det afskærende system i 2025.

Direktionen indstiller:

- **At opdateret netto anlægsbudget, for Vand på 3,1 mio. kr., for Spildevand på 78,3 mio. kr. og for FH på 3,6 mio. kr. godkendes**
- **At ved udskudte arbejder fra 2025 til 2026, overføres ikke anvendt budget i 2025 til At der udføres ny omrøring i pumpeump Hobro Nord til 200.000 kr.**
- **budget 2026.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt 14: V 69 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025

Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år

I forhold til Bestyrelsens behandling på seneste bestyrelsesmøde er der ikke de store forskydninger i budgettet og overslagsårene. På årets sidste møde i december vil justeringer i forhold til den aktuelle fremdrift på igangværende projekter blive tilpasset.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt 15: Lukket

Punkt 16: Lukket

Punkt 17: V 72 - Eventuelt

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den
27. oktober 2025:**

Intet at bemærke

Punkt 18: V 73 - Næste møde

Mødekalender for 2025

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 27. oktober 2025 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Forslag til mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RENFORM og MFV.

Torsdag den 28. januar 2026 (Ekstraordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 23. februar 2026 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse og
lånegarantier 2026)

Mandag den 4. maj 2026 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2025)

Torsdag den 28. maj 2026 (Ordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 22. juni 2026 (Bestyrelsesmøde – besigtigelse af anlæg og projekter)

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Mødet den 4. maj ændres til den 27. april 2026.

Øvrigt taget til efterretning.

Punkt 19: V 74 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

- V 56 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)
- V 57 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
- V 58 - Ændring og tilretning af forretningsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 59 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 60 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)
- V 61 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)
- V 62 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)
- V 63 - Sommerhuskloakering (Åben)
- V 64 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)
- V 65 - Tømningsordning for bundfældningstanke (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 66 - Afslutning af kloakering af Sem (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 67 - Budgetopfølgning pr. 30.09. 2025 (Åben)
- V 68 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)
- V 69 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025 (Åben)
- V 70 - Godkendelse af Takstblad 2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 71 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 72 - Eventuelt (Åben)
- V 73 - Næste møde (Åben)
- V 74 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne V58, V59, V65, V66, V70 og V71 holdes som lukket.
- At beslutningerne fra punkterne tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Indstillingen godkendt

Punkt "V 75 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)" tilføjes oversigten, som punkt til online godkendelse af referatet.

Punkt 20: Lukket
