

REFERAT Mariagerfjord Vand A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 27-04-2026

Mødedato Mandag d. 27. april 2026 kl. 17:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

V 28 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer.....	3
V 29 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	4
V 30 - Budgetopfølgning pr. 28.02.2026.....	5
V 31 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026.....	7
Lukket.....	10
Lukket.....	10
V 34 - Ud- og overløbsregistrering af overløbssystemet.....	10
V 35 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund.....	11
V 36 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro.....	16
V 37 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager.....	23
V 38 - Separatkloakering og klimatilpasning øvrige opland.....	26
V 39 - Sommerhuskloakering.....	30
V 40 - Status - udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	34
V 43 - Eventuelt.....	34
V 44 - Næste møde.....	35
V 45 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	36
Lukket.....	38

Formanden bød velkommen.

Da det er første gang der aflægges regnskab i RenForM-koncernen, herunder selvstændigt i MAR og MFV, er det valgt at årsregnskab MAR tages som det sidste i MARs bestyrelsesmøde med deltagelse af revisor.

Efter MARs bestyrelsesmøde starter bestyrelsesmøde i MFV, hvor punkterne Budgetopfølgning pr. 28. februar, Korrektioner af anlægsbudget og Årsregnskab 2025 MFV, med deltagelse af revisor, som det første under deres dagsorden. MFVs dagsorden suspenderes efter Årsregnskab 2025, og der fortsættes til RenForMs bestyrelsesmøde, som færdiggøres, hvorefter MFVs dagsorden genoptages og færdiggøres, hvorefter bestyrelsesmøderne er slut.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Der har den 8. april været afholdt fællesmøde mellem bestyrelserne i Rebild, Vesthimmerland og MFV i Fællesrensning Himmerland, med positiv tilbagemelding.

Øvrig orientering taget til efterretning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar 2026 blev frigivet fra First Agenda den 04. marts 2026.

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 08. april 2026 blev frigivet fra First Agenda den 09. april 2026.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda.

Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i – godkendelsen af referatet sker på det sidste punkt på agendaen.

Alle har godkendt referaterne i First Agenda.

Direktionen indstiller:

- **At referat fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2026 er indført som godkendt.**
- **At referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8. april 2026 er indført som godkendt.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:
Indstillingen godkendt.

Budgetopfølgningerne 28.02.2026 for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) udviser fortsat en stabil udvikling for både VAND (bilag 1) og SPILDEVAND (bilag 2), hvor resultatet forventes at blive ca. 5% bedre end budgetteret. Det er primært indtægtssiden der forbedres, ved større solgte vandmængder og betalende spildevandsmængder. For spildevand gælder desuden at særbidraget er steget med over 20% i 2025, som for nuværende forventes videreført i 2026.

I 2026 har der indtil nu, været meget få vandbrud, og kun et enkelt under frostperioden. Der udføres løbende renoveringsarbejder på vandledninger i forbindelse med separatkloakeringerne. Disse udføres som anlægsprojekter og er en af årsagerne til, at der er meget få uprovokerede brud (et provokeret brud er når f.eks. et anlægsarbejde påfører en skade).

På spildevandssiden har der været forholdsvis meget vedligeholdelse på pumpestationer, hvor der arbejdes på at få forbedret driftssikkerheden de mest ressourcekrævende steder. For ledningsanlæggene har der været flere sprængninger på trykledninger i Q1, hvor det specielt er strækningerne Norup – Assens og Karlby – Andrup der har løbende hændelser.

For HLR følges driftsbudgettet meget fint og årets, indtil nu, lave vandmængde, er medvirkende til at gøre MFVs resultat bedre, da den lave vandmængde øger betalingen i særbidrag og betalingen fra RVS og VHV.

Samlet forventes et resultat i 2026 som er ca. 5% bedre end forventet.

Variationerne mellem budgetterede og realiserede omkostninger skyldes flere forhold, men for både VAND og SPILDEVAND skyldes den store ændring under posten Administrationsbidrag, den nye fordelingsberegning af fællesudgifterne i RenForM, således anlægssagerne og MAR betaler en stor del af fællesomkostningerne, som kommer MFV drift til gode.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen gennemgås
- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026

Anlægsoversigten er, udover opdelingen i de tre områder: Drikkevand, Spildevand og Fællesrensning Himmerland (FH), også opdelt efter "Renovering", som dækker de anlæg der egen finansieres og "Ny-anlæg" der som udgangspunkt forventes lånefinansieret. Ændringen giver en klar opdeling af brutto og netto udgifterne for hvert område. For FH er netto udgiften, når Rebild og Vesthimmerlands andel er fratrasket.

Opdateret estimat på anlægsbudgettet for 2026 vurderes for **Vand til 2,1 mio. kr. Renovering og 5,0 mio. kr. Nyanlæg.** For **Spildevand til 32,7 mio. kr. Renovering og 94,4 mio. kr. Nyanlæg.** For **FH til 4,5 mio. kr. Renovering og 7,7 mio. kr. Nyanlæg.** Samlet giver det en brutto anlægsinvestering på ca. 39,3 mio. kr. Renovering og 107,1 mio. kr. Nyanlæg i 2026, som der skal være likviditet til at gennemfører.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af bilag 1. Nedenfor er redegjort for baggrunden for de enkelte budgetforskydninger:

VAND

For VAND er der forskydninger i budgettet for projektet ved Vestergade, Korsgade m.fl. Dette skyldes projektændringen med at der ikke skal etableres ledninger i Korsgade grundet forurening. I stedet rykker anlægsarbejdet til start i Sdr. Allé, Onsildgade og Søndergade, hvor omfanget af vandledningsprojekt er væsentlig mindre end i Korsgade. Budgettet for 2026 var tidligere estimeret til 3,4 mio. kr. og foreslås i 2026 nedskrevet til 1,0 mio. kr. Når vi har tilpasset anlægsprojektet for arbejderne i Vestergade og dermed har overblik over omfanget af vandarbejderne, opdateres det endelige anlægsbudget for 2026 og 2027 for hele projektet. Det overblik vil vi have til næste bestyrelsesmøde.

Allerede nu vurderes det at hele budgettet til udvidelse af kildeplads ved Skjellerup ikke realiseres i 2026. Først i Q3 forventes resultater fra prøveboringer, hvorfor råvandsledningen formentlig først udføres i 2027. 1,3 mio. kr. foreslås overført til udførelse i 2027.

SPILDEVAND

I Hobro har der været licitation på projektet ved Finlandsvej og det er nu startet op, og med 9 anlægsmåneder inkl. sommerferien resten af året vurderes fremdriften lidt mindre i 2026 og lidt mere i 2027. Samlet foreslås budgettet for 2026 nedskrevet med 2,0 mio. kr., som så til gengæld overføres til udførelse i 2027. I 2027 vil der yderligere være et behov for 2,0 mio. kr. så den samlede anlægsøkonomi ender på 24,5 mio. kr. for de 2 etaper i 2026 og 2027.

Grundet projektændring ved Vestergade i Hobro vurderes en mindre udgift på 2,0 mio kr. i 2026. Som ved vandledningsarbejderne vil et nyt budget være klar, når Vestergade er omprojekteret.

Gammelvej projektet i Hobro vurderes at blive lidt dyrere end tidligere forudsat, hvilket skyldes projektudvidelsen samt opsamling af stik over private skrånende arealer. Budgettet foreslås øget med 0,7 mio kr. i 2026. Udvidelsen medfører yderligere separatkloakering af 10 ejendomme.

Projektet styret boring Pejtersborgvej, Hadsund bliver en smule dyrere end tidligere forudsat. Det skyldes primært erstatninger til lodsejere for placering og tinglysning af ledninger over privat grund. Budgettet for 2026 foreslås hævet med 0,35 mio. kr. Projektet omfatter separatkloakering af 10 ejendomme, hvor nye skelbrønde placeres mod det sydlige skel på egen grund, hvor hovedledninger er placeret.

Grundet større museumsomkostninger og -omfang samt ventetidsomkostninger som følge af museumsundersøgelserne, vil budgettet for projekt Rosengade i Mariager blive øget med 1,1 mio. kr. i 2026.

Udgiften til færdiggørelse, opstart og indkøring af vakuumsystemet i sommerhuskloakering, etape 1 har haft et omfang større end forventet, hvilket medfører et mindre behov for forøgelse af budgettet. Omkostningen er især til den interne tid samt højere enhedspriser pr. intern time end tidligere.

Der er afholdt licitation på etape 2 sommerhuskloakering, hvilket samlet set medfører behov for opdatering af budgettet. Udgiften for 2026 forventes ikke at blive ændret, mens udgiften i 2027 vil blive større. Der har været afsat ca. 20,0 mio. kr. til etape 2 på baggrund af et tidligt overslag for økonomien ved etappen. Der vil være et behov for en samlet forøgelse på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes udgiften til ledningsarbejdet har været estimeret for lavt.

For sommerhuskloakering, etape 3 påbegyndes forundersøgelser, opmåling, projektering mm. i 2026. Der er i budgettet afsat beløb til disse aktiviteter med henblik på at etappen kan starte primo 2027.

Endelig figurerer en ikke budgetlagt omkostning på knap 1,0 mio. kr. til bassin ved Viborg Landevej i Sdr. Onsild. Det skyldes at slutregningen først mod forventning blev konteret i 2026.

Til næste bestyrelsesmøde vil 10 årsplanen være opdateret med budgetforskydninger som beskrevet ovenfor.

Fællesrensning Himmerland (FH)

Projekt VVM med udvides til i alt 9 mio. kr. med tillægsbevilling på 3.9 mio kr. med baggrund i færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten og forundersøgelser til 4.rensetrins pilotanlæg (se under pkt. Fællesrensning Himmerland)

Direktionen indstiller:

- **At opdateret anlægsbudget, for Vand på 7,1 mio. kr., for Spildevand på 127,0 mio. kr. og for FH på 12,2 mio. kr. godkendes**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Status på registrering af regnvejsbetingede overløb

Der er nu købt udstyr hjem til niveaumåling i ni overløbsbygværker, hvor flowmåling skal etableres inden udgangen af 2026. På nuværende tidspunkt foregår en analyse af hvilke konstruktive ændringer der skal anlægges for at få en veldefineret overløbskant i hvert af de ni bygværker. Når overløbskanternes geometri af kvalificeret kan man ved hjælp af niveaumålingen beregne en omtrentlig overløbsmængde.

Sammenkædes oplandsdata med overløbsmængder (og måske tidspunkt for overløb) tilnærmes de specifikke udledte stofmængde for det respektive overløb. Derved fastholdes målingsmetode B jf. lovudkastet, som angiveligt vil betyde at usikkerhedstillægget i afgiftsmodellen forbliver på 25% og ikke 50%, som hvis der ikke målt mængder.

Metode	Opgjort udledning	Usikkerhedstillæg	
A	Måling af vandmængde og stofmængde af udledt kvælstof, fosfor og organisk stof fra overløbsbygværk		33,39 kr. pr. kg for totalnitrogen 183,64 kr. pr. kg for totalfosfor 18,36 kr. pr. kg BI ₅ (modificeret)
B	Måling alene af den udledte vandmængde fra overløbet eller overløb (bypass) på renseanlæg	25 %	1,63 kr./m ³ fra kloaknettet. 4,60 kr./m ³ fra bypass på RA
C	Skematisk opgørelse af vandmængden ved modelberegning.	50 %	1,96 kr./m ³ fra kloaknettet. 5,52 kr./m ³ fra bypass på RA

Selve bekendtgørelsen om afgift på overløbsmængder, som skulle være lovbehandlet i marts, er udskudt, mindst til der bliver dannet en ny regering, og lovgivningen bliver fremsat.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Hadsund


Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkloakering

Projekt Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade blev startet op ultimo februar, da frosten var gået af jorden – lidt senere end oprindeligt planlagt.

Arbejdet udføres i 2 etaper – skitseret med blå hhv. rød markering på skitsen nedenfor. Første etape er den blå etape, som omfatter de ejendomme, som også har været udfordret af kælderopstuvninger. Etape 1 forventes udført i 2026 og starter med ombygning af overløbsfunktionen fra hele oplandet, således eksisterende bassin på Stadionvej ombygges til overløbsbassin, med færre overløbshændelser til følge. I projektet omlægges fjernvarme, Hadsund Vandværk deltager på Jernbanegade og endelig udskifter kommunen fortove på enkelte strækninger og retter det op på resten.

Etape 2 projekteres i 2026 med henblik på udførelse i 2027.

Aktuelt er arbejdet med krydsning af Alsvej afsluttet og vejen er genåbnet (uge 15). Arbejdet fortsætter i Jernbanegade og Rolighedsvej.

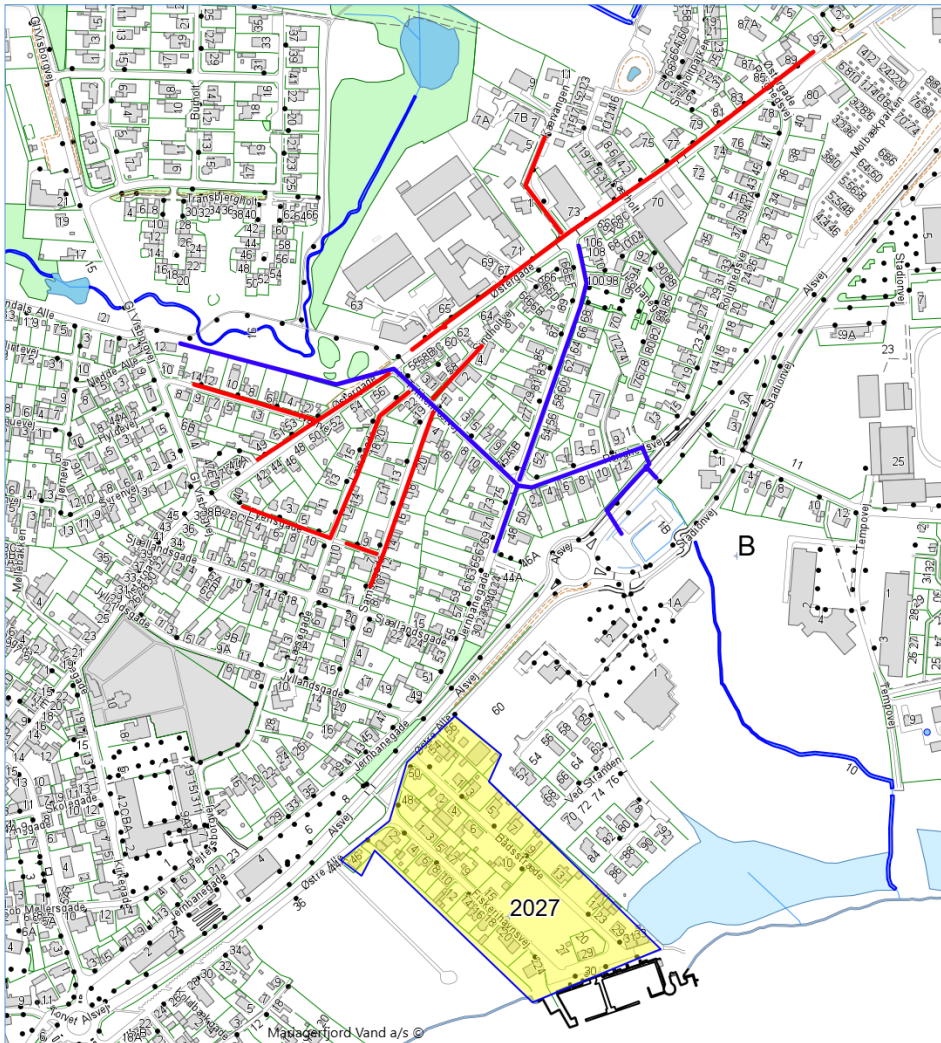


Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2027 forventes Fiskerihavnsvej og Bådsstræde separatkloakeret, begge fjordnære områder med nye regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. Området umiddelbart øst for, forventes klimasikret i samme forbindelse. I 2026 udarbejdes skitseprojekt, hvor der er fokus på minimering af gravedybden. Området er vist med gult ovenfor.

I forbindelse med etappen, disponeres eksisterende areal øst for området for klimatilpasning sammen med nærværende etapes løsninger.

Pejtersborgvej

Arbejdet med boring af ny regnvands- og spildevandsledning langs det stærkt skrånende terræn er udført i marts. Se skitse nedenfor, hvor de nye ledninger er vist med fed, blå streg. For at kunne sløjfe den gamle fællesledning udestår opsamling af de berørte ejendommers interne kloaksystem via nye stikledninger. Det har til nu ikke været en del af projektet.

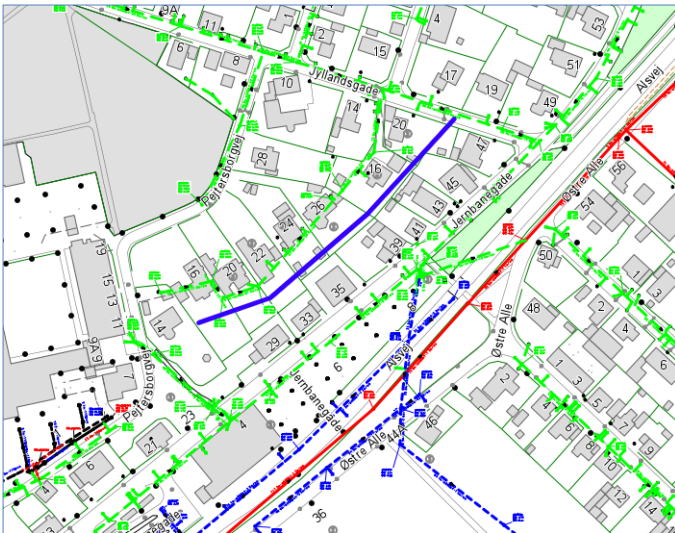


Regnvandspumpestation Havnegade

Som vist på skitsen nedenfor er der arbejdet på at etablere en ny regnvands- og klimasikringspumpestation ved Havnegade i Hadsund. Pumpestationen skal mens, det lavtliggende område stadig er fælleskloakeret, hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen dimensioneres samtidig til at være den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring. Pumpestationen vil være af samme type, som er etableret ved havnen i Mariager.

På baggrund af stærk forurening i jord og grundvand, hvor pumpestation og udløbsledninger har været planlagt – kigges der på alternative placeringer. Bl.a. vurderes mulighed for regnvandspumpestation ved kanalen med udløb øst for Da Vinci. Et andet alternativ er at placere pumpestation ved det store overløbsbygværk ved Broindingen. Vurderinger pågår i øjeblikket.


Se skitse næste side.

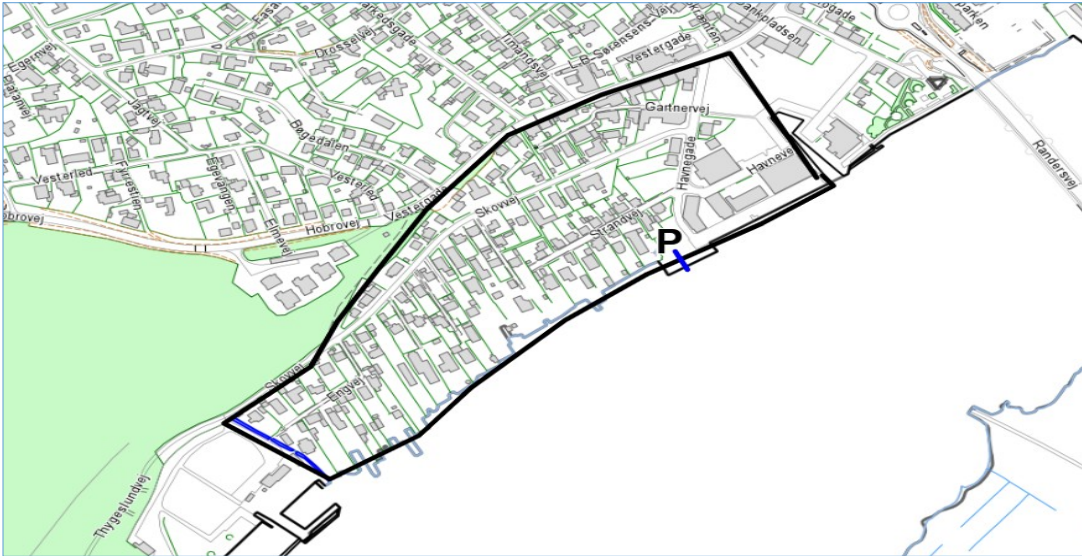

Trykledning Hadsund Syd

Den eksisterende trykledning under fjorden, blev der konstateret flere brud på i november 2025. Ledningen anses for at være i så dårlig kvalitet, at der skal etableres en erstatning.

Aktuelt er der opstillet 2 store gyllecontainere til håndtering af spildevandet fra Hadsund Syd. Der foretages tømning et par gange i døgnet med gylletransporter, så der er styr på den almindelige driftssituation.

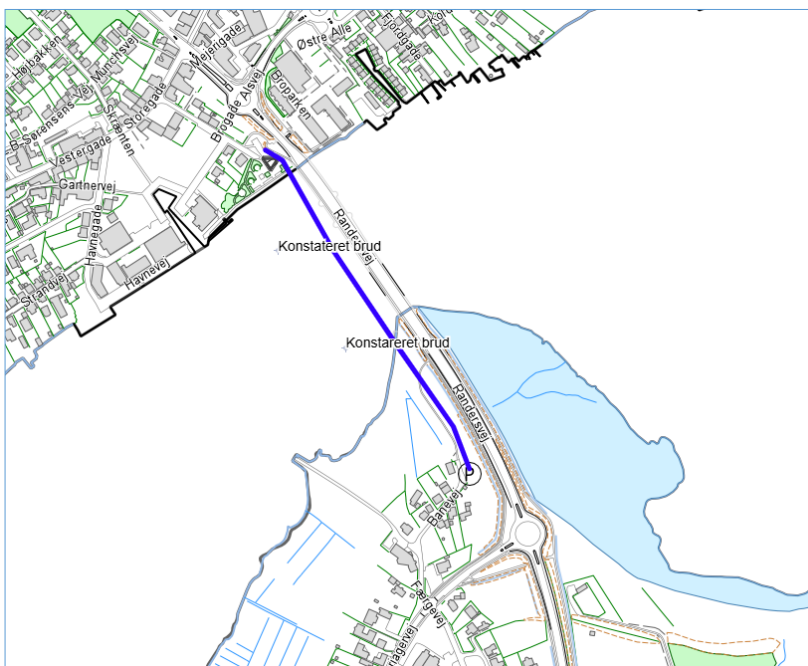

Det forventes, at der etableres en ny "synkeledning" med et medierør(trykrør) indeni, så medierøret er beskyttet af et robust "kapperør". Synkerøret spules ned i fjordbunden med en slæde – en metode, som vurderes at være nænsom i forhold til ophvirvning af sediment – i forhold til f.eks. gravning.

Ansøgning til Kystdirektoratet er fremsendt – herunder er der også svaret på supplerende spørgsmål. Vi afventer tilladelse til arbejdet, som kan gå i gang, når 4 ugers høringsperiode er overstået.

Renovering af overløbsbygværk Brolandingen Hadsund

Det store overløbsbygværk ved Brolandingen i Hadsund trænger til en renovering i forhold til at forbedre drift og arbejdsmiljø. Således forventes etableret nye riste, dæksler – som i Mariager. Og ikke mindst etableres der overvågning på bygværket.

Projektet ved Brolandingen vurderes sammen med Trykledning Hadsund Syd, Regnvandspumpestation Havnegade og overløbsbygværk ved Stadionvej, da de fire projekter har en sammenhæng i forhold til de samlede overløbsmængder i Hadsund og at løsningerne evt. kan supplere hinanden til endnu bedre løsninger.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**


Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:
Indstillingen godkendt.

Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Hobro syd

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er udført i 2023/24.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er også afsluttet (2024/25).

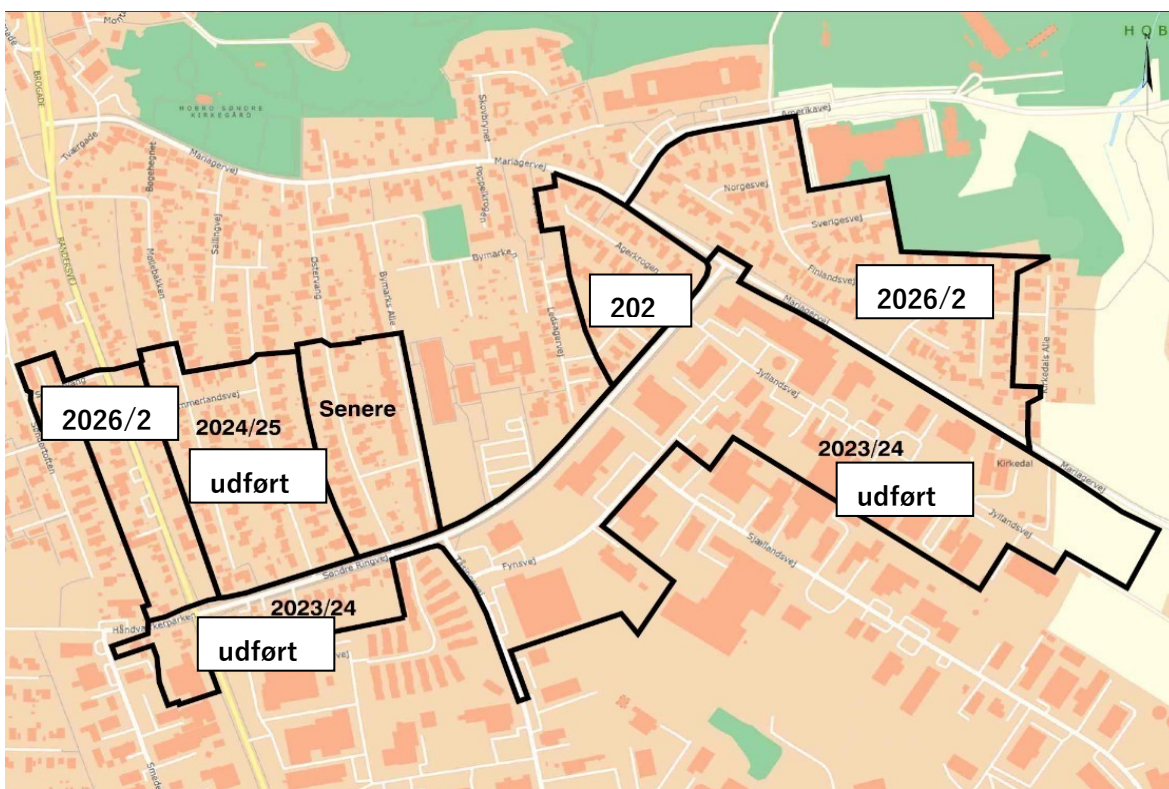

Randersvej

Fællesprojektet på Randersvej startede i uge 3, 2026. Fællesprojektet omfatter separatkloakering, renovering af vandleddninger, etablering af både transmissionsledninger og distributionsledninger til Fjernvarme, og endelig etableres cykelsti med renovering af fortove, belysning og beplantning fra kommunens side.

Trafikken opretholdes i 2 spor, mens arbejdet gennemføres. Sideben i lyskrydset har været spærret en måneds tid for at få ført diverse ledninger væk fra kryds og

helleanlæg – i vestsiden. Lyskrydset er igen fuldt åbent. Aktuelt graves der i vestsiden mellem lyskrydset og op til Ingo.

Frem til sommer etableres ledninger samt fortov/cykelsti i vestsiden – og i 2. halvdel af 2026 etableres tilsvarende i østsiden. Søndervang etableres i 2027.

Det er Mortensen og Nymark, Klarup, der er entreprenør

Norgesvej, Finlandsvej m.fl.

I Norgesvej, Finlandsvej, Kirkedals Allé, Sverigesvej, Norgesvej og del af Amerikavej gennemføres separatkloakeringen over 2 år og starter efter påske 2026. Firmaet VAM A/S var lavestbydende ved licitationen i marts måned.

Byggeplads er under etablering og arbejdet starter herefter med etablering af ny regnvandsledning fra bassinet på Jyllandsvej til Kirkedals Allé.

Det udbudte projekt omfatter også et nyt vådt bassin øst for vandrehjemmet på Amerikavej.



Bassiner

Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelses- og rensedbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd – bassiner, hvis placering og størrelse er afstemt med vandløbs-, spildevands- og naturmyndigheder hos MFK.

- Ombygning af eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra et tørt til vådt bassin (pågår, se nedenfor)
- Etablering af vådt bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej (med i Finlandvejprojektet)
- Etablering af vådt bassin i slugten øst for Kirkedals Allé (2027)

- Etablering af tørt og vådt bassin ved Amerikavej, øst for Kirkedals bækken (2027).

Bassin Mariagervej / Jyllandsvej

Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin pågår. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet HME fra Aars og har skullet udføres mens bassinet har været ”i drift”. Det er løst ved etablering af midlertidige volde inde i bassinet.

Udover omdannelsen, har projektet også omfattet en afkorting af bassinet mod syd, på ca. 15 meter, som overtages af Powercon, når MFVs arbejder er afsluttet.

Arbejdet afsluttes ultimo april og forventes således ved bestyrelsesmødets afholdelse at være færdigt.

Øvrige projekter i Hobro

Gammelvej, Hobro

På Gammelvej i Hobro gennemføres kloakseparering samt renovering af vandledninger. Hobro Varme er efter opstarten hoppet med i projektet og renoverer deres ledninger også.

Arbejdet er næsten færdigt og afsluttes ultimo april 2026. Formålet med projektet har været at fjerne det fællesvand, som tidligere er ledt til det lavtliggende separate spildevandssystem uden overløb før Gasværksvej. En mindre projektudvidelse, vist med stiptet linje nedenfor, og omfatter separatkloakering af den vestlige del af Udsigten, er også udført. Projektudvidelsen medfører at 10 yderligere ejendomme er separeret. Der asfalteres medio april.




Vestergade, V. Allé, Korsgade

I 2026-2027 udføres arbejdet med separering af området ved og omkring Vestergade / V. Allé. Projektet er ud over separering, også en forberedelse til fremtidig byudvikling i den nordvestlige del af Hobro ved Fyrkat Engsø og op til Løgstørvej. I projektet foretages også renovering af vandledninger og i mindre grad etablering af fjernvarme.

Entreprenørfirmaet Arkil A/S var lavestbydende ved licitationen i februar. Arbejdet startede midt i marts og skulle begynde med etablering af kloak og vandledninger i Korsgade. Der blev imidlertid konstateret en kraftig forurening af både jord og grundvand langs Korsgade – formentlig efterladenskaber fra en gammel losseplads i området. Det blev hurtigt vurderet, at håndtering af den kraftige forurening ville være både særdeles omkostningstung, ligesom der arbejdsmiljømæssigt skulle indføres særlige restriktioner for at kunne udføre arbejdet.

Derfor arbejdes der i øjeblikket på en projektændring, hvor ledningerne i Korsgade flyttes op i Vestergade. Det betyder "klemte" ledninger samt snævre arbejdsforhold, da flere huse i den nordlige del af Vestergade ligger helt ud mod fortovet.


Mens denne projektændring belyses fuldt ud, er entreprenøren rykket over i Sdr. Allé og Onsildgade og starter der.

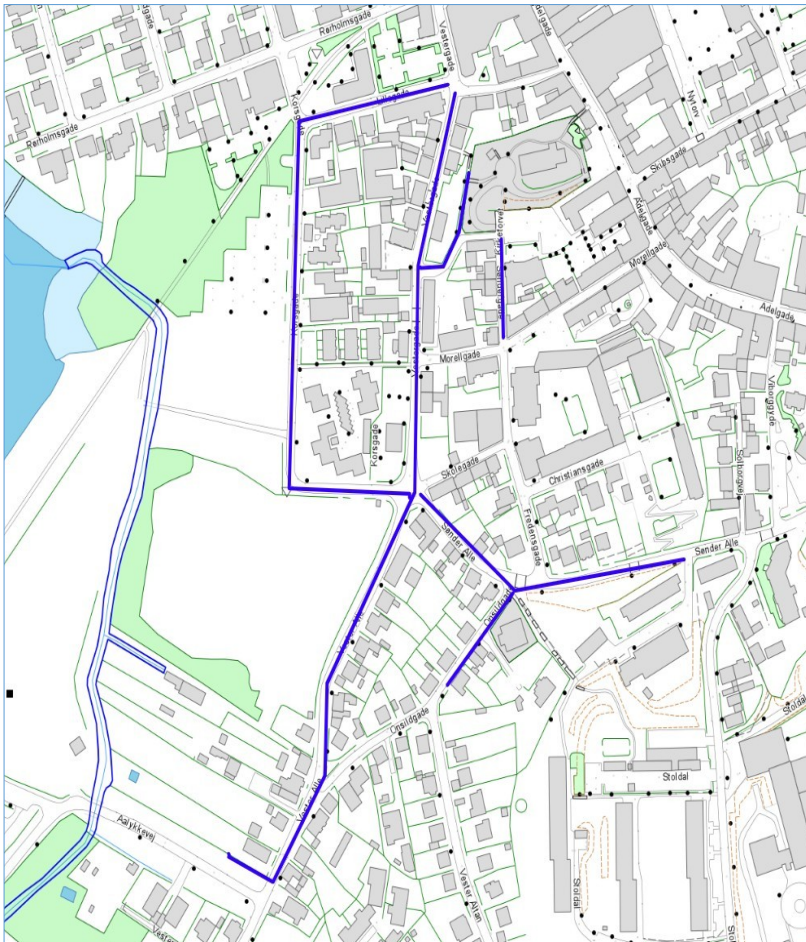

Hadsundvej, regnvandsledning

På Hadsundvej forventer vi i 2026 at etablere en større og dybere beliggende regnvandsledning for dels at skabe kapacitet i regnvandssystemet, samt at muliggøre afledning af regnvand fra flere store matrikler, hvor det ikke er muligt i dag – herunder at vende afledningen fra et delområde af Lupinvej til Hadsundvej. Projektering er ikke startet op endnu.

Området syd for Hadsundvej (Elco-byg) er fortrinsvis fælleskloakeret og vil blive separatkloakeret ved etableringen af regnvandsledningen.

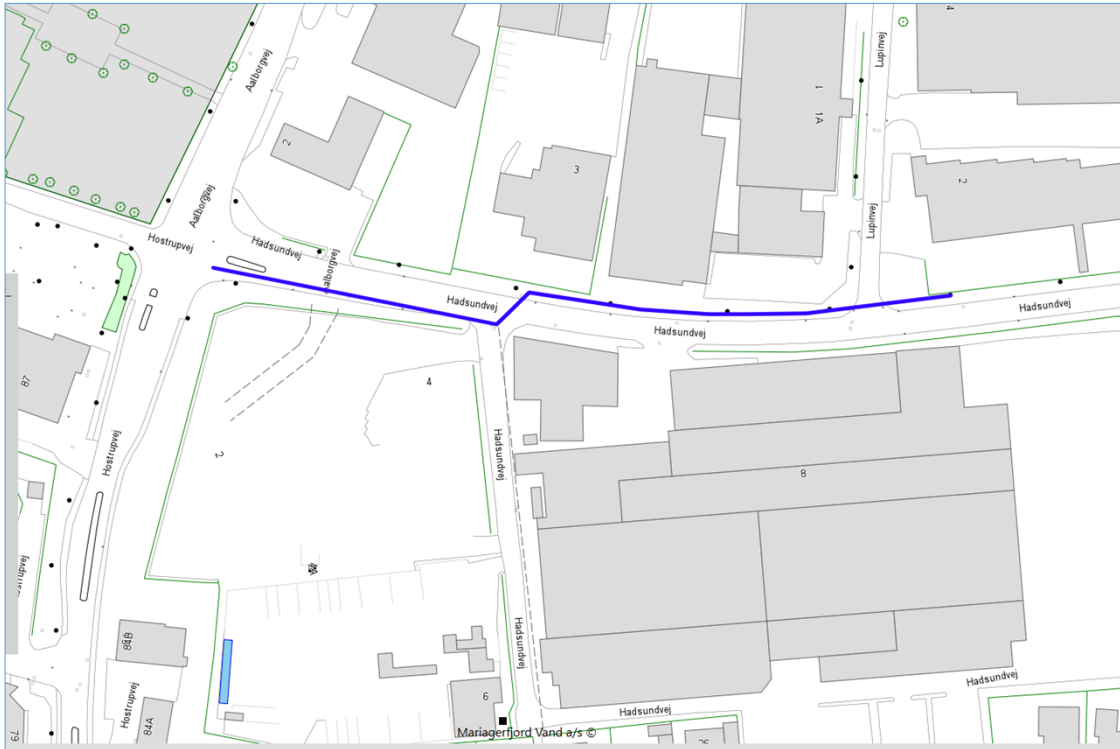

Direktionen indstiller


- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:
Indstillingen godkendt.



Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

Etaperne i Mariager er vist nedenfor:

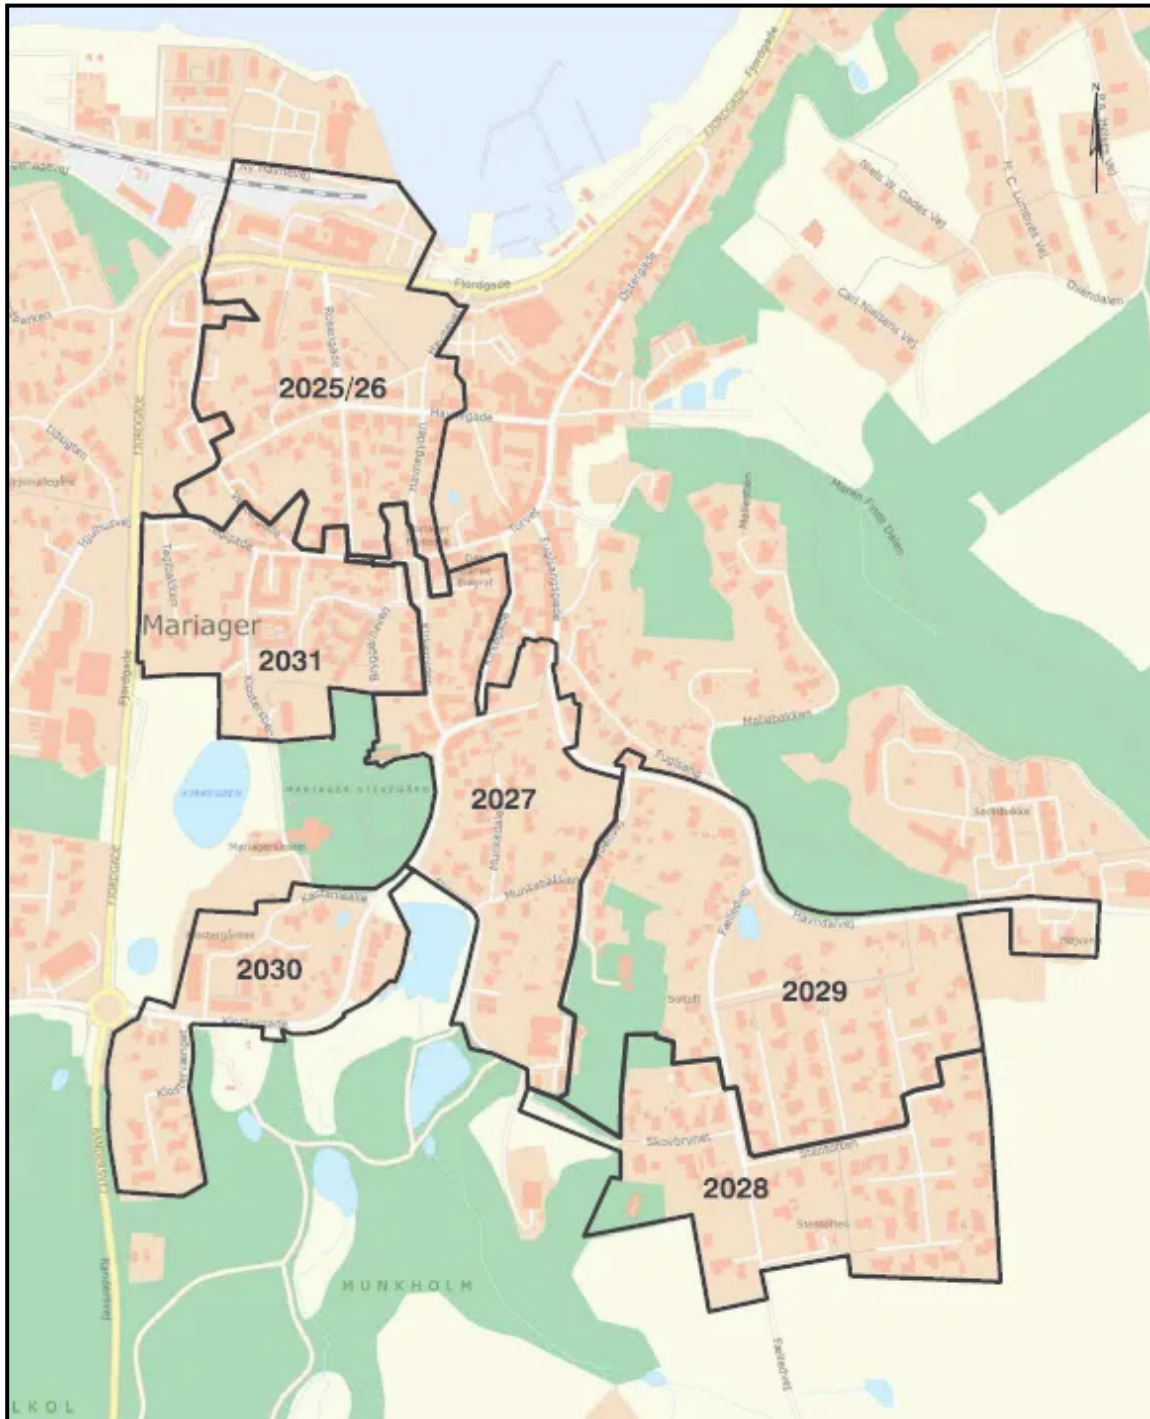


I den 1. etape er der etableret en regnvandspumpestation på havnen, og overløbsbygværket er renoveret til tidssvarende forhold (arbejds miljø, drift og overvågning).

Rosengade m.fl. - separatkloakering

Etape 2 omfatter separatkloakering af Rosengade, Havnevej, Havnegyden samt den vestlige del af Havnegade. Se skitse nedenfor, hvor det bemærkes, at pilene er graveretningen (modsat strømningsretningen). Ledninger er udført i Havnevej, Havnegyden og Fjordgade. Fjordgade blev asfalteret og genåbnet i december 2025.

Arbejdet går planmæssigt. Aktuelt er Havnevej og Havnegyden afsluttet. I Rosengade er der etableret hovedledninger frem til ca. 20-30 m inden Teglgade, ligesom hovedledninger i Havnegade mellem Vestergade og Rosengade er etableret. Aktuelt graves i private haver mellem Vestergade og Rosengade. Det er entreprenørfirmaet VAM A/S, der graver i Mariager. Etapen afsluttes til sommer 2026.

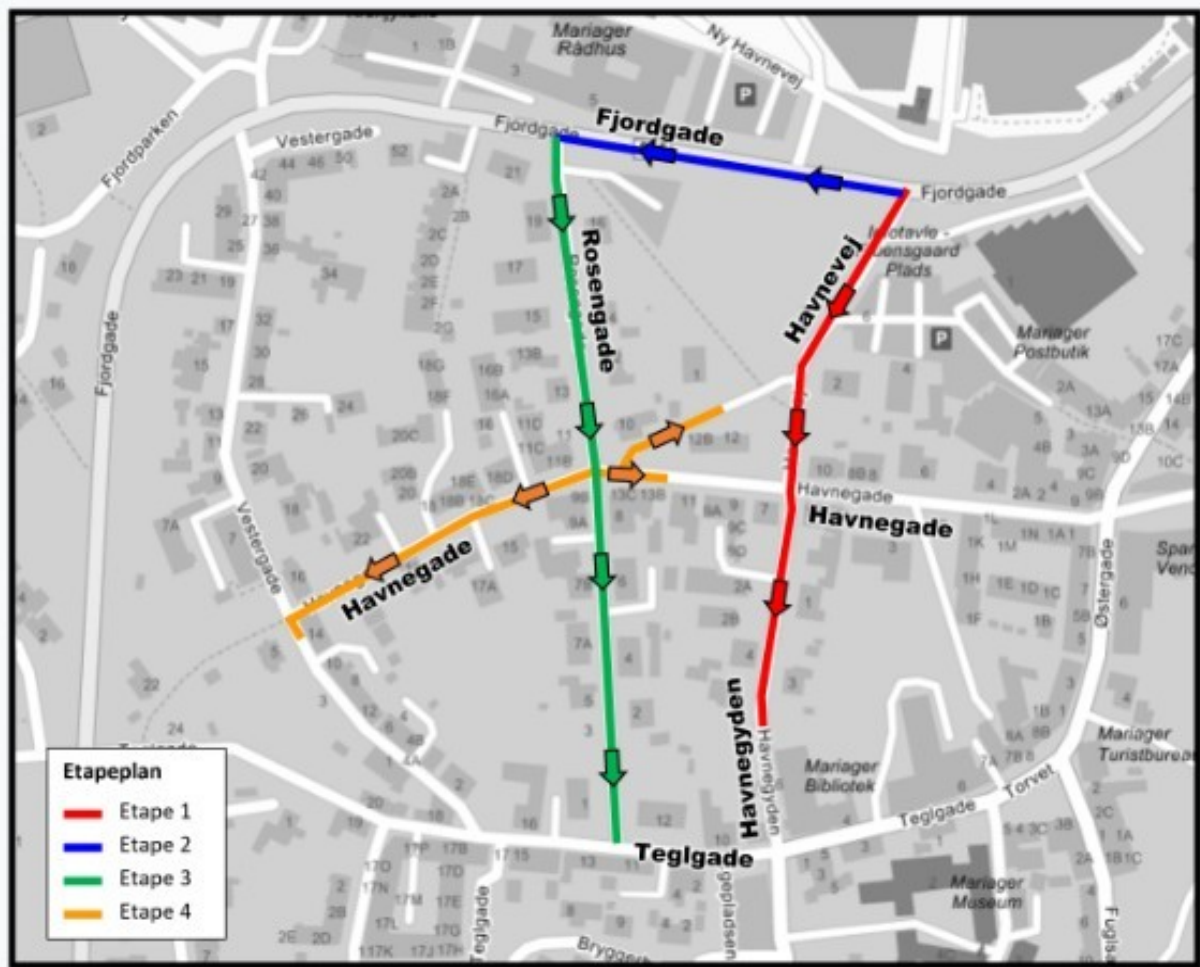

Næste etape er separering i Teglade, Egepladsen, Kirkegyden m.fl., hvor projektering og udbud vil pågå resten af året, med forventet udførelse fra primo 2027.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.


Separatkloakering – øvrige opland

Dagsordenspunktet ”separatkloakering i det øvrige opland” omfatter projekter **udenfor** Hobro, Mariager og Hadsund.

Holmgaard – separatkloakering

I 2026 forventes gennemført separatkloakering af Holmgaard by. Holmgaard er det sidste fælleskloakerede opland syd for Hobro og er desuden knudepunkt for spildevandet fra Handest og Glenstrup. Vandet fra Holmgaard samles med spildevandet fra Onsild byerne ved rundkørslen ved Karlby og via midtbysumpen på Gasværksvej, videre til Hobro nord og HLR. Udover separatkloakeringen skal pumpestationen fornyes.

Ud over den miljømæssige gevinst ved sløjfning af overløbsbygværk, vil separering af Holmgaard også have positiv effekt på den vandmængde, der pumpes til den sydlige del af Hobro.

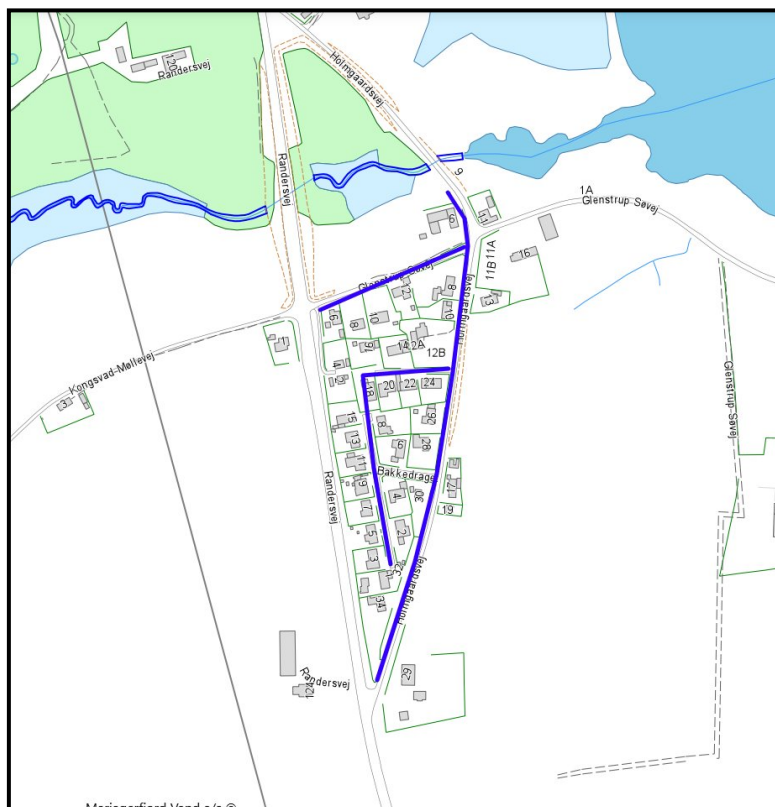

Renovering af pumpestationer Andrupvej og Randersvej

Som følge af en forventet mindre indpumpning fra Holmgaard og Sdr. Onsild gennemføres renovering af pumpestationer på Andrupvej og Randersvej syd for Hobro.

Da trykledningen dels er for stor til den fremtidige belastning (snart den aktuelle belastning) og da der på trykledningen har været flere ledningsbrud gennem de seneste år – vil renoveringerne også omfatte en vurdering af om trykledningen skal fornyes og neddimensioneres. Eksempelvis ved at trække en mindre ledning gennem den nuværende trykledning.

Hele projektet vil blive set som en helhed, hvor udbygning af Andrup og reduktion af Randersvej vurderes.


Pumpestation Gasværksvej, Hobro

På den store pumpestation Gasværksvej i Hobro forventes etableret en trykforøger ved Neder Strandvej/lystbådehavnen, så der kan etableres mindre pumper på Gasværksvej – pumper, som er billigere at holde vedlige, og samlet vil give en betydeligt billigere og sikker drift af hele systemet.

Assens – Spurvevej, afskærende ledning

I 2026 etableres afskærende ledning (vist med blå nedenfor) med henblik på at kunne sløjfe en pumpestation, der er udtjent, med dårlig driftsmæssig placering, ringe arbejdsmiljø og som stod overfor en større renovering. Området vist med gult står til separering i 2028-30.

Skitseprojekt for separering af området vist med gult nedenfor er sat i gang for dels at få fastlagt koter og ledningsdimensioner samt for at vurdere, om der med fordel også kan etableres regnvandssystem i cykelstien i indeværende projekt – så man ikke kommer til at grave 2 gange samme sted. Skitseprojektet indeholder også mulighed for at tage vejene Vibevej og Lærkevej med i separeringen, da det naturlige fald dels er mod nord og mod vest for disse 2 veje. Det vurderes også, om bassinet kan etableres som et nedsivningsbassin.

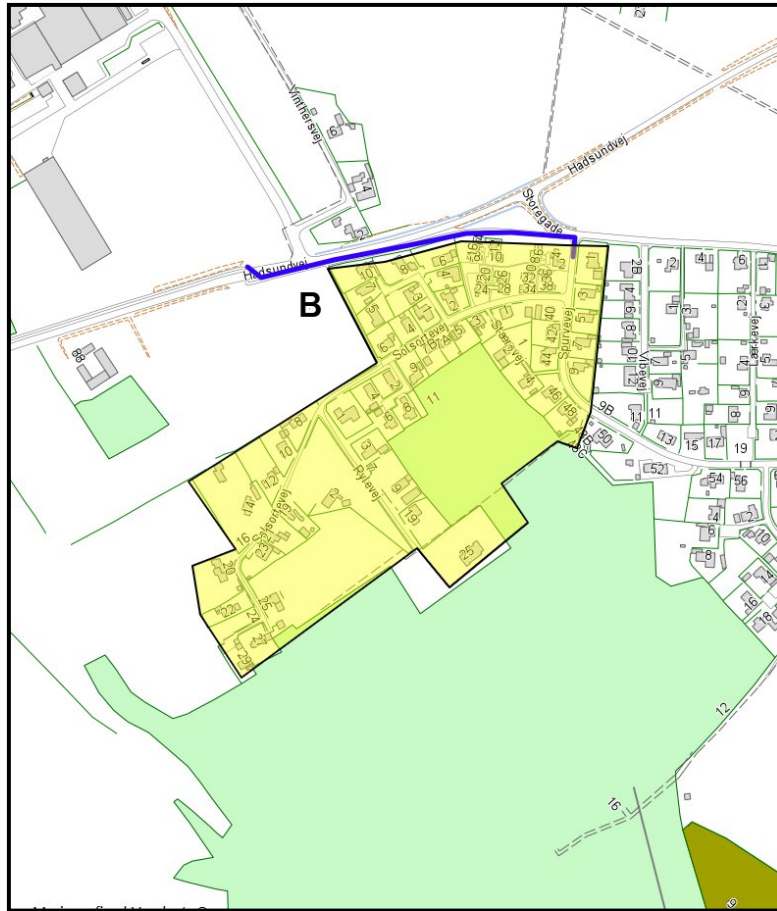

Mælkevejen, Oue, regnvandsbassin

I Oue gennemfører Mariagerfjord Kommune i 2026 et vandløbsrestaureringsprojekt i Oue Bæk. Forud for dette projekt etablerer RenForM et regnvandsbassin / nedsivningsbassin – så regnvandet både forsinkes og renses inden udledning. I dag er der direkte regnvandsudløb fra byen til bækken. Bassintegninger og udformning er pt under udarbejdelse, ligesom der er god dialog med den lodsejer, som ejer det areal, som nedsivningsbassinet skal ligge på.

Trykledning Norup - Assens

Trykledningen mellem Norup og Assens har været udsat for en del ledningsbrud de seneste år. Derfor arbejdes der i øjeblikket på et projekt, hvor ledningen fornyes, evt. placeres i et nyt tracé langs vejrabatten. I dag løber ledninger tværs over markarealer og jordstykker med juletræer. Vurdering af tracé samt anlægsøkonomi sker pt.

Arden Skole – regnvandsledninger

For et par år siden blev der etableret tidssvarende regnvandsledninger til håndtering af regnvandet i oplandet ved og omkring skolen. En del af planen var at udlede regnvandet til skov / moseområdet nord for skolen. Ejerforholdene er nu på plads for arealet og lodsejeraftale er indgået. Vi kan nu formelt ansøge om at udlede regnvandet til mosen, som jf. oplysninger fra kommunens naturafdeling – vil have godt af at få tilført vand. Der er afsat et mindre beløb til de sidste ledningsstrækninger i 2026.

Skitseprojekter

I 2026 forventes der udarbejdet skitseprojekter for separering af den sidste del af Skjellerup, for Norup samt for separering af Ø. Doense. For oplandet omkring Ø. Doense (Vebbestrup og Bettebyen)) kigges der også på strukturen for det afskærende ledningssystem. Alle skitseprojekter gennemføres med henblik på at have systemløsninger klar til udførelse 2027 og frem.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**


Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:
Indstillingen godkendt.

Sommerhuskloakering syd for Als

Frem til og med 2030 gennemføres spildevandskloakering af sommerhusområdet syd for Als. I alt kloakeres ca. 1400 sommerhuse. Kloakeringen gennemføres med et såkaldt vakuumsystem, som også er etableret i Øster Hurup området.

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 er afsluttet. Systemet er i drift og sommerhusejerne har fået brev om at de kan slutte sig til det nye spildevandssystem, ligesom der er udsendt opkrævning på tilslutningsafgift.

Det er entreprenørfirmaet Karl Jensen A/S fra Hobro, der har udført gravearbejdet. Tilbage står enkelte retableringsarbejder i forbindelse med aflevering af veje og rabatter til de enkelte grundejerforeninger.

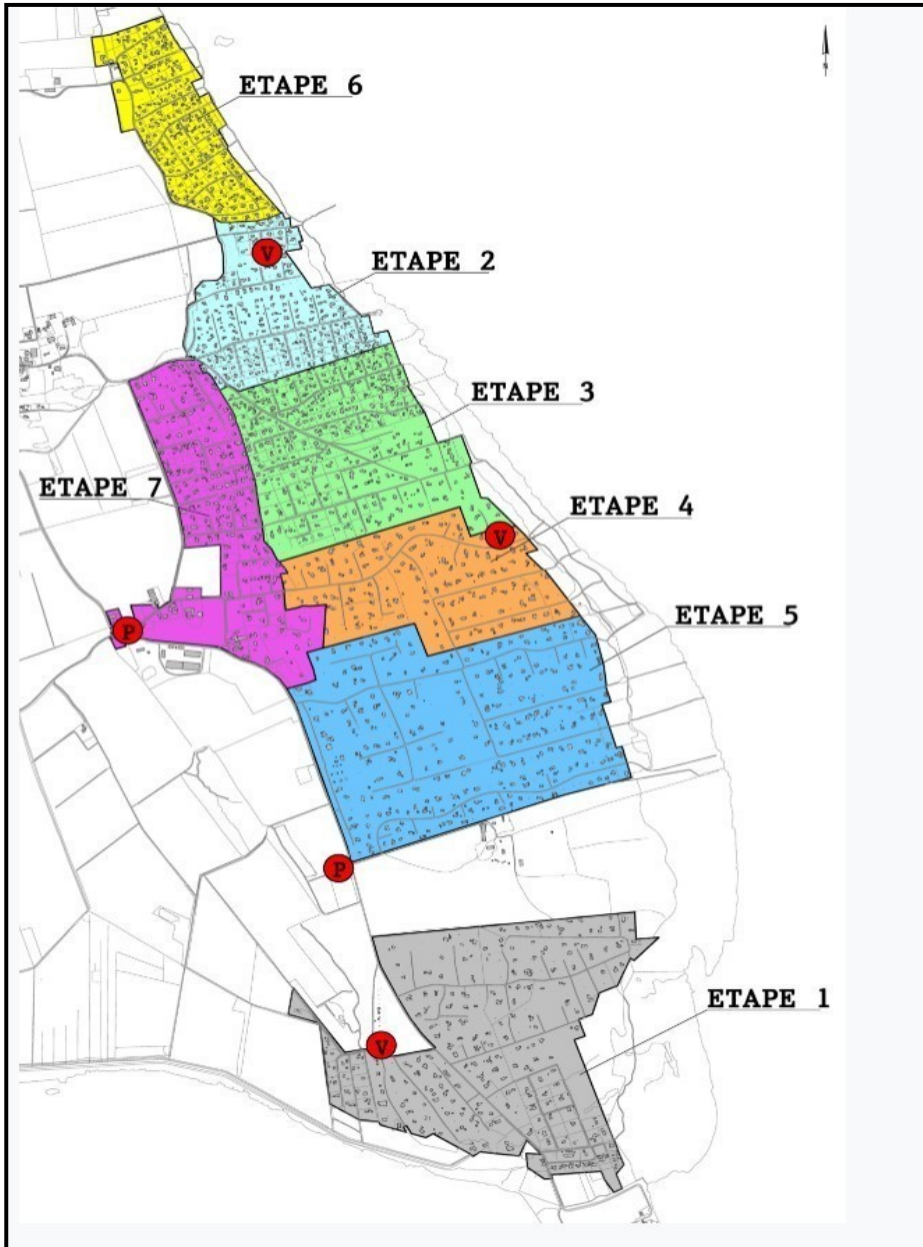

Etape 2 har været i licitation. Firmaet A/S Mortensen og Nymark var lavestbydende på projektet.

Arbejdet er netop startet op og ventes at tage et års tid med afslutning til april 2027. Der arbejdes ikke i juli og august måned.

Etape 2 omfatter spildevandskloakering til ca. 190 sommerhuse i området øst for Helberskov. I projektet etableres også en vakuumstation, se skitsen nedenfor.



Etape 3, som er den sidste etape med etablering af en vakuumstation, forventes udført i 2027. Sommerhuskloakeringen fortsætter til og med 2030.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Der er åbenthus ved ny vakuumstation den 13. maj kl. 14 - 16, Fjordparken 40, Als Odde.

Indstillingen iøvrigt godkendt.

Status på udvidelse af kildeplads Skjellerup

I første kvartal 2026 har der været arbejdet for at etablere adgangsveje og et frit areal omkring placeringen af boring 2 på den nye/kommende kildeplads tilknyttet Skjellerup Vandværk. Boring 1 blev udført i 2024 og resultatet af denne gjorde, at det blev valgt at flytte boring 2 ca. 200 meter mod syd i forhold til først planlagt. Det har krævet nye myndighedsgodkendelse og revideret aftale med lodsejeren, derfor den sene opstart. Frosten i Q1 2026 har forsinket udførelsen yderligere et par måneder.

Det forventes at boring 2 og efterfølgende prøvepumpning vil foregå fra maj - september. Herefter skal boringerne godkendes af myndighederne til indvinding, som forventes inden udgangen af 2026.

Primo 2027 forventes der anlæg af råvandsledning fra de nye boringer samt sideløbende udbygning af Skjellerup Vandværk.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Indstillingen godkendt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Intet at bemærke

Mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RenForM og MFV.

Mandag den 27. april 2026 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2025)

Torsdag den 28. maj 2026 (Ordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 22. juni 2026 (Bestyrelsesmøde – besigtigelse af anlæg og projekter)

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:

Taget til efterretning.

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

- V 28 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer
- V 29 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
- V 30 - Budgetopfølgning pr. 28.02.2026
- V 31 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2026
- V 32 - Årsregnskab 2025 for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 33 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 34 - Ud- og overløbsregistrering af overløbssystemet
- V 35 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund
- V 36 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro
- V 37 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager
- V 38 - Separatkloakering og klimatilpasning øvrige opland
- V 39 - Sommerhuskloakering
- V 40 - Status - udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads
- V 41 - Dagsorden til generalforsamlingen den 28.05.2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 42 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- V 43 - Eventuelt
- V 44 - Næste møde
- V 45 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- V 46 – Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne V 32, V 33, V 41, V 42 og V 46 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S mandag, den 27. april 2026:
Indstillingen godkendt.
